



# 施工計画図(その1) S=1:150


## 渡り橋撤去

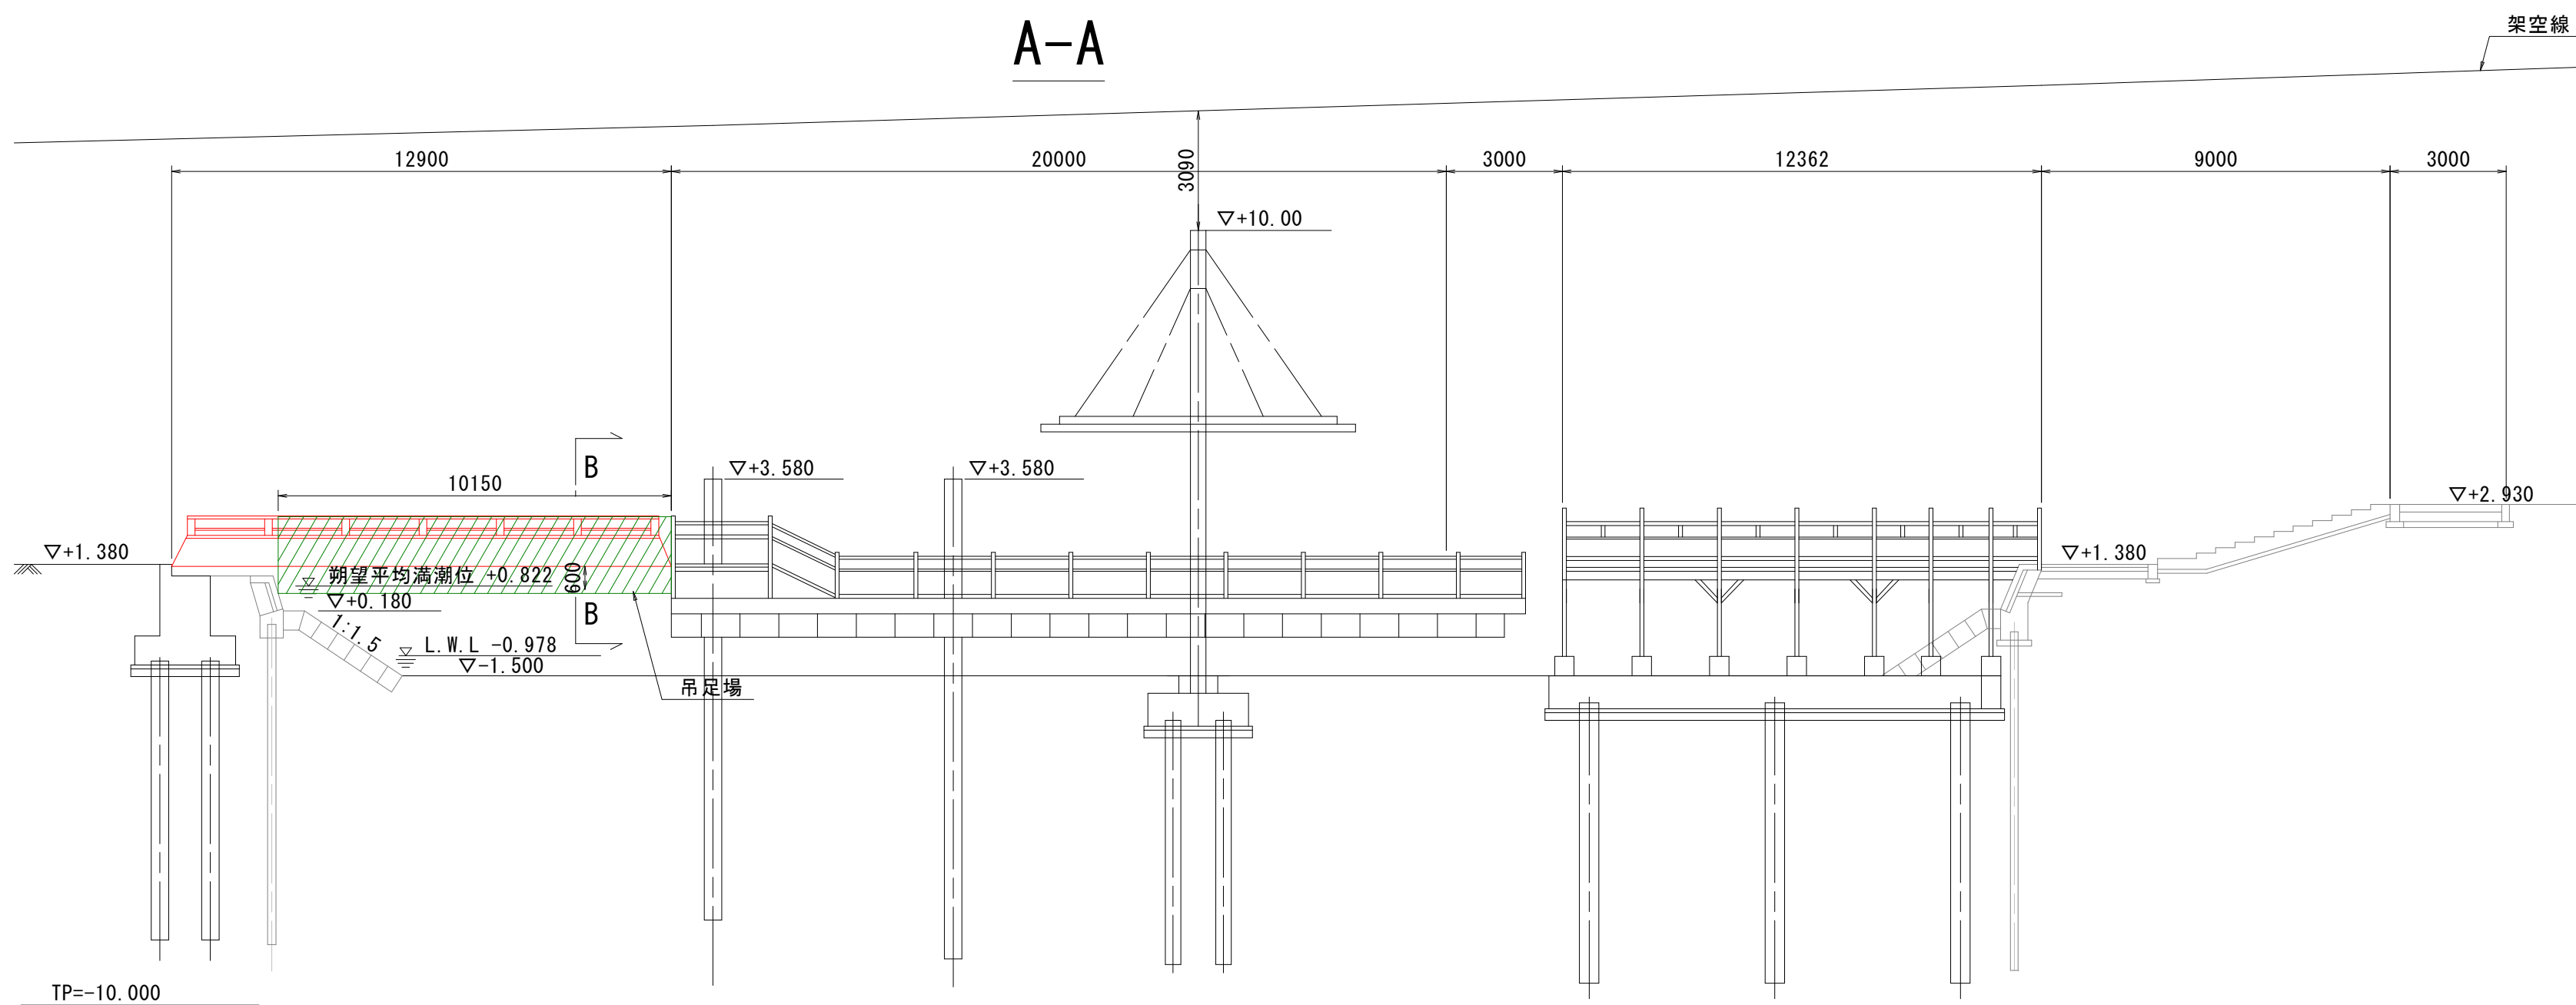


### 【撤去フロー】

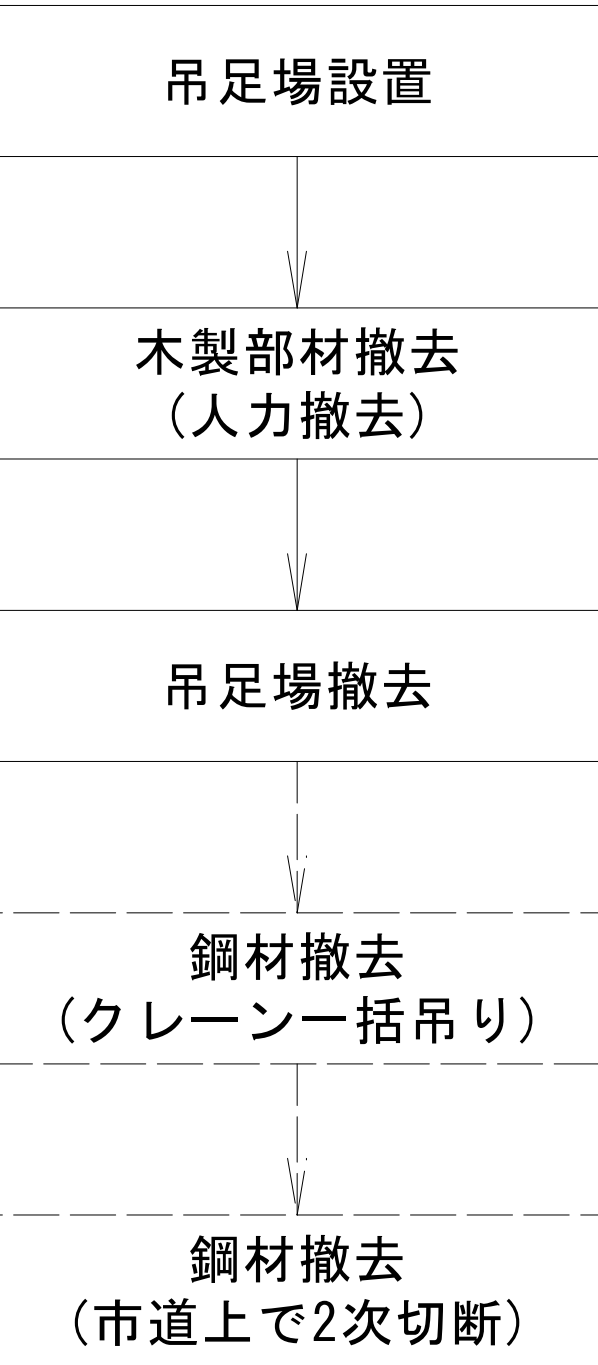

## 平面図

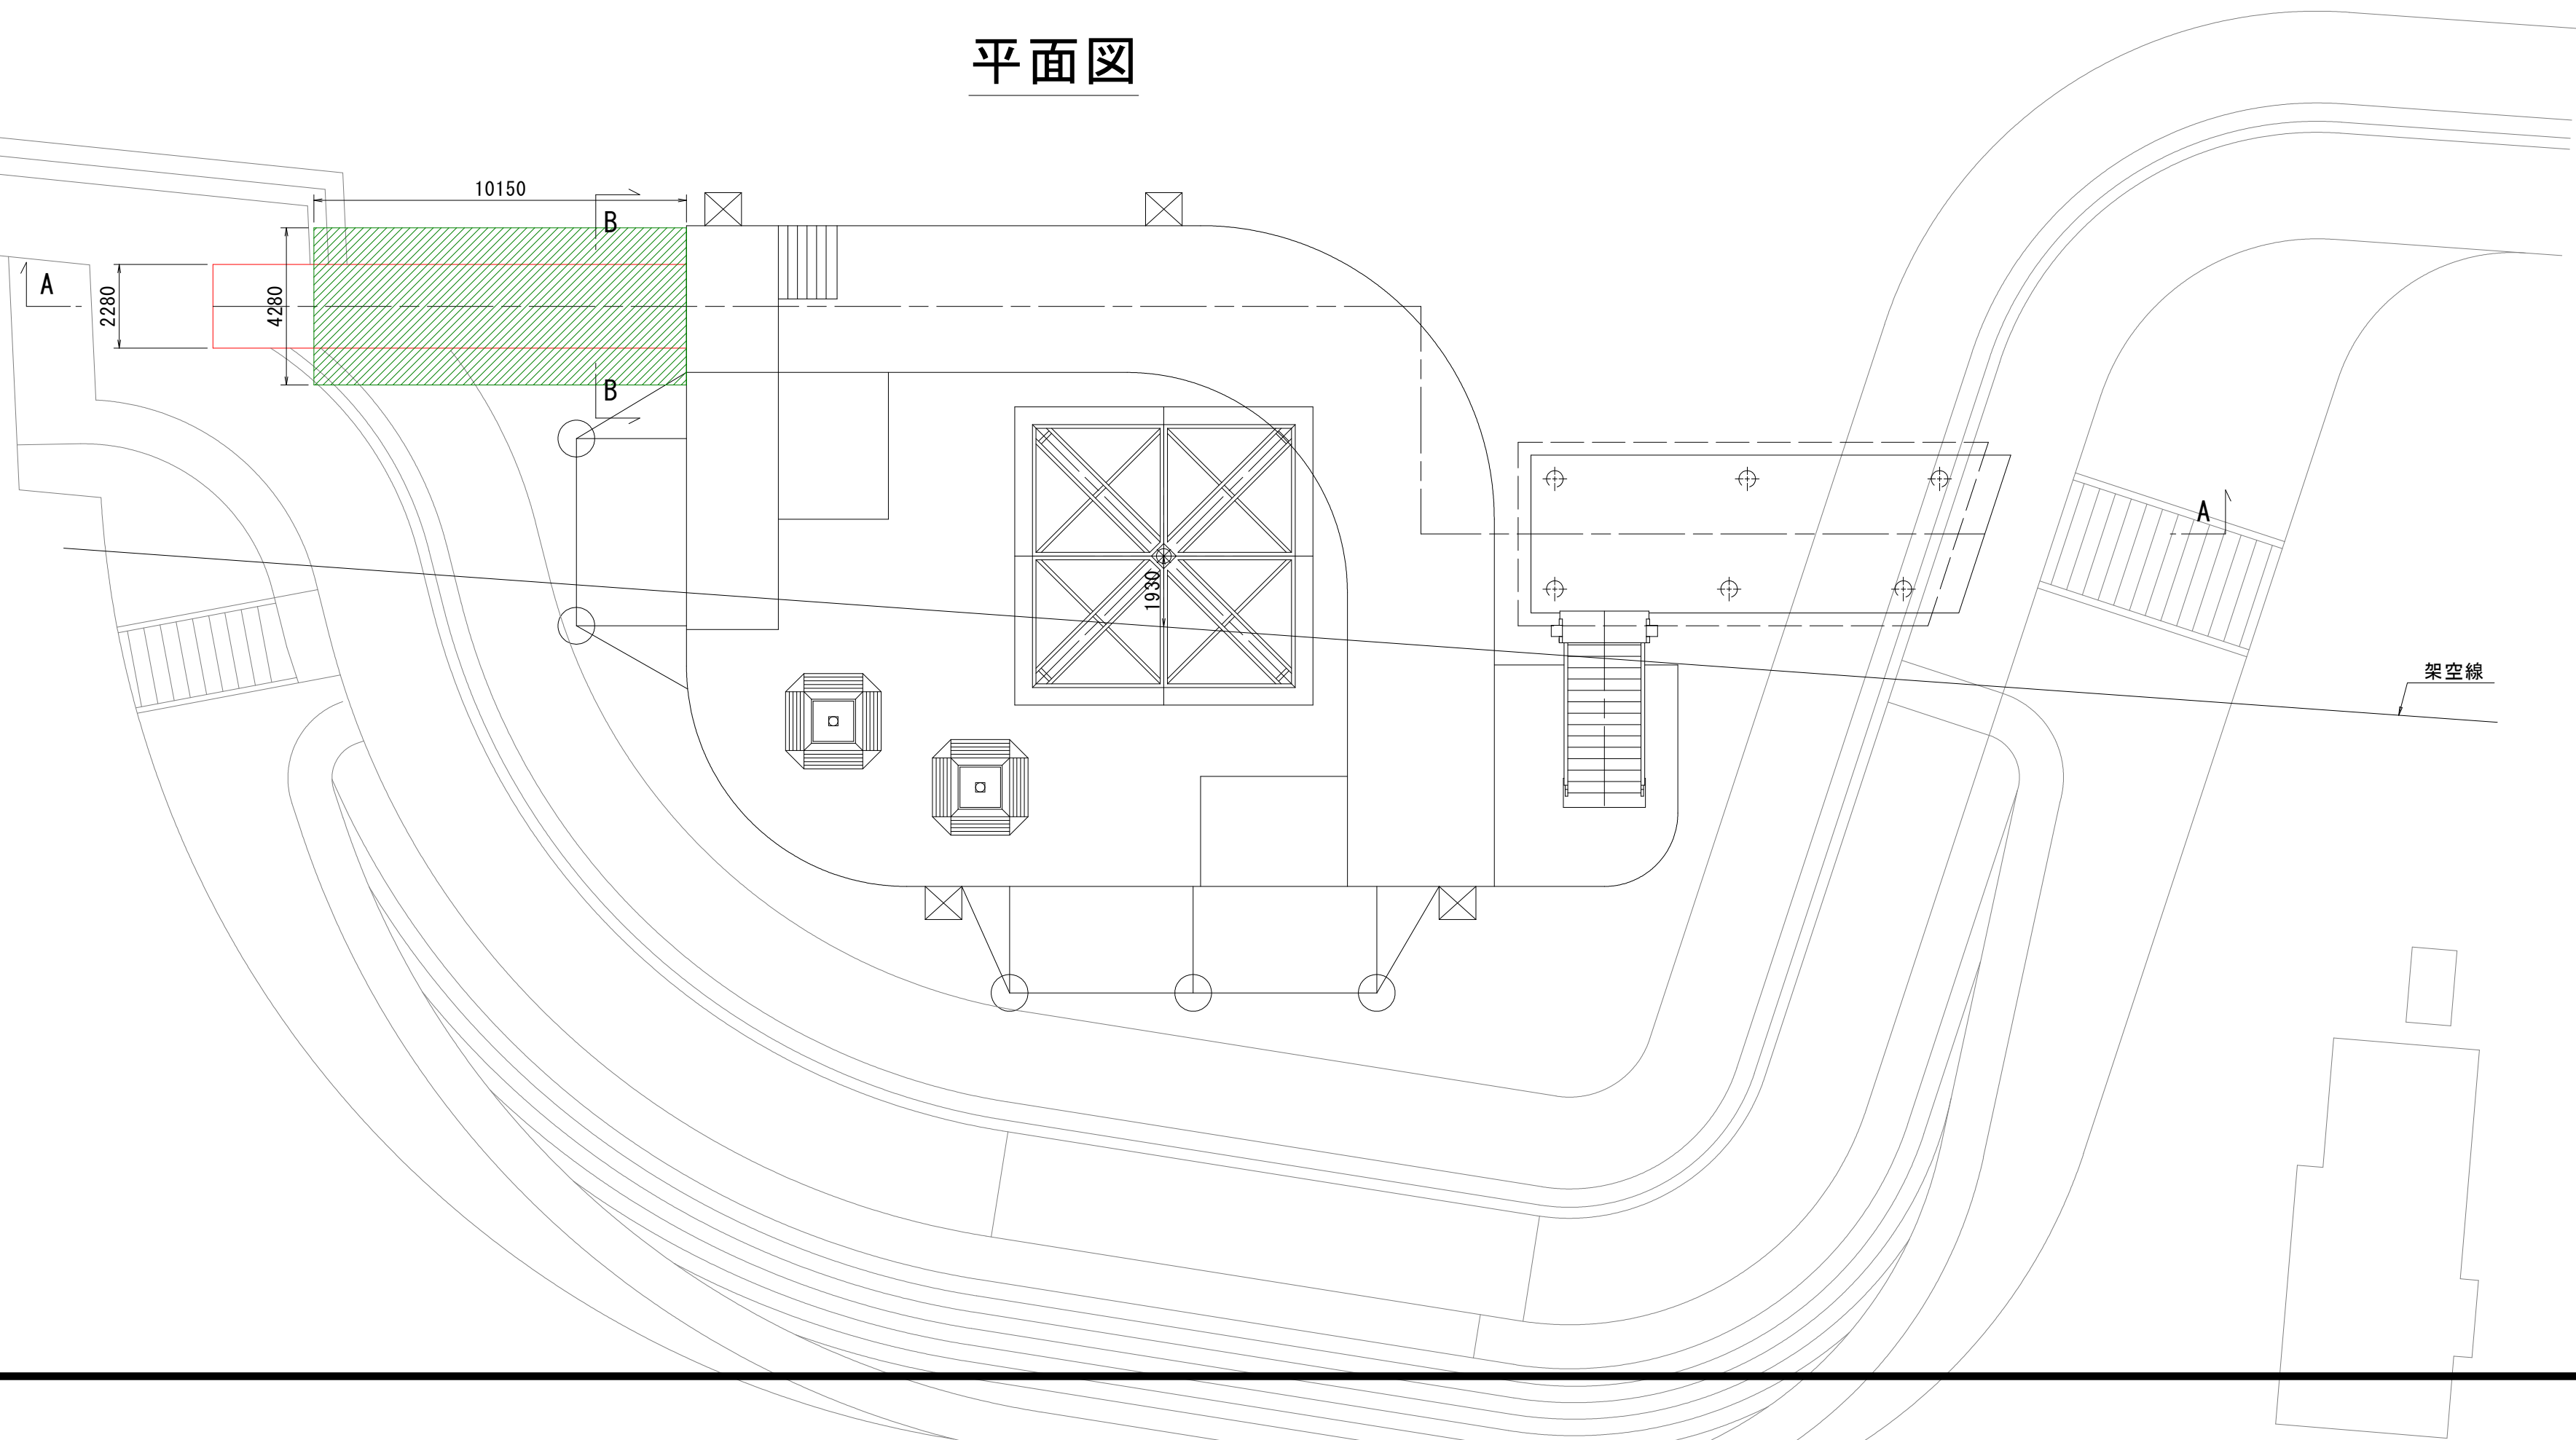

## 上部工断面図(B-B) S=1:30

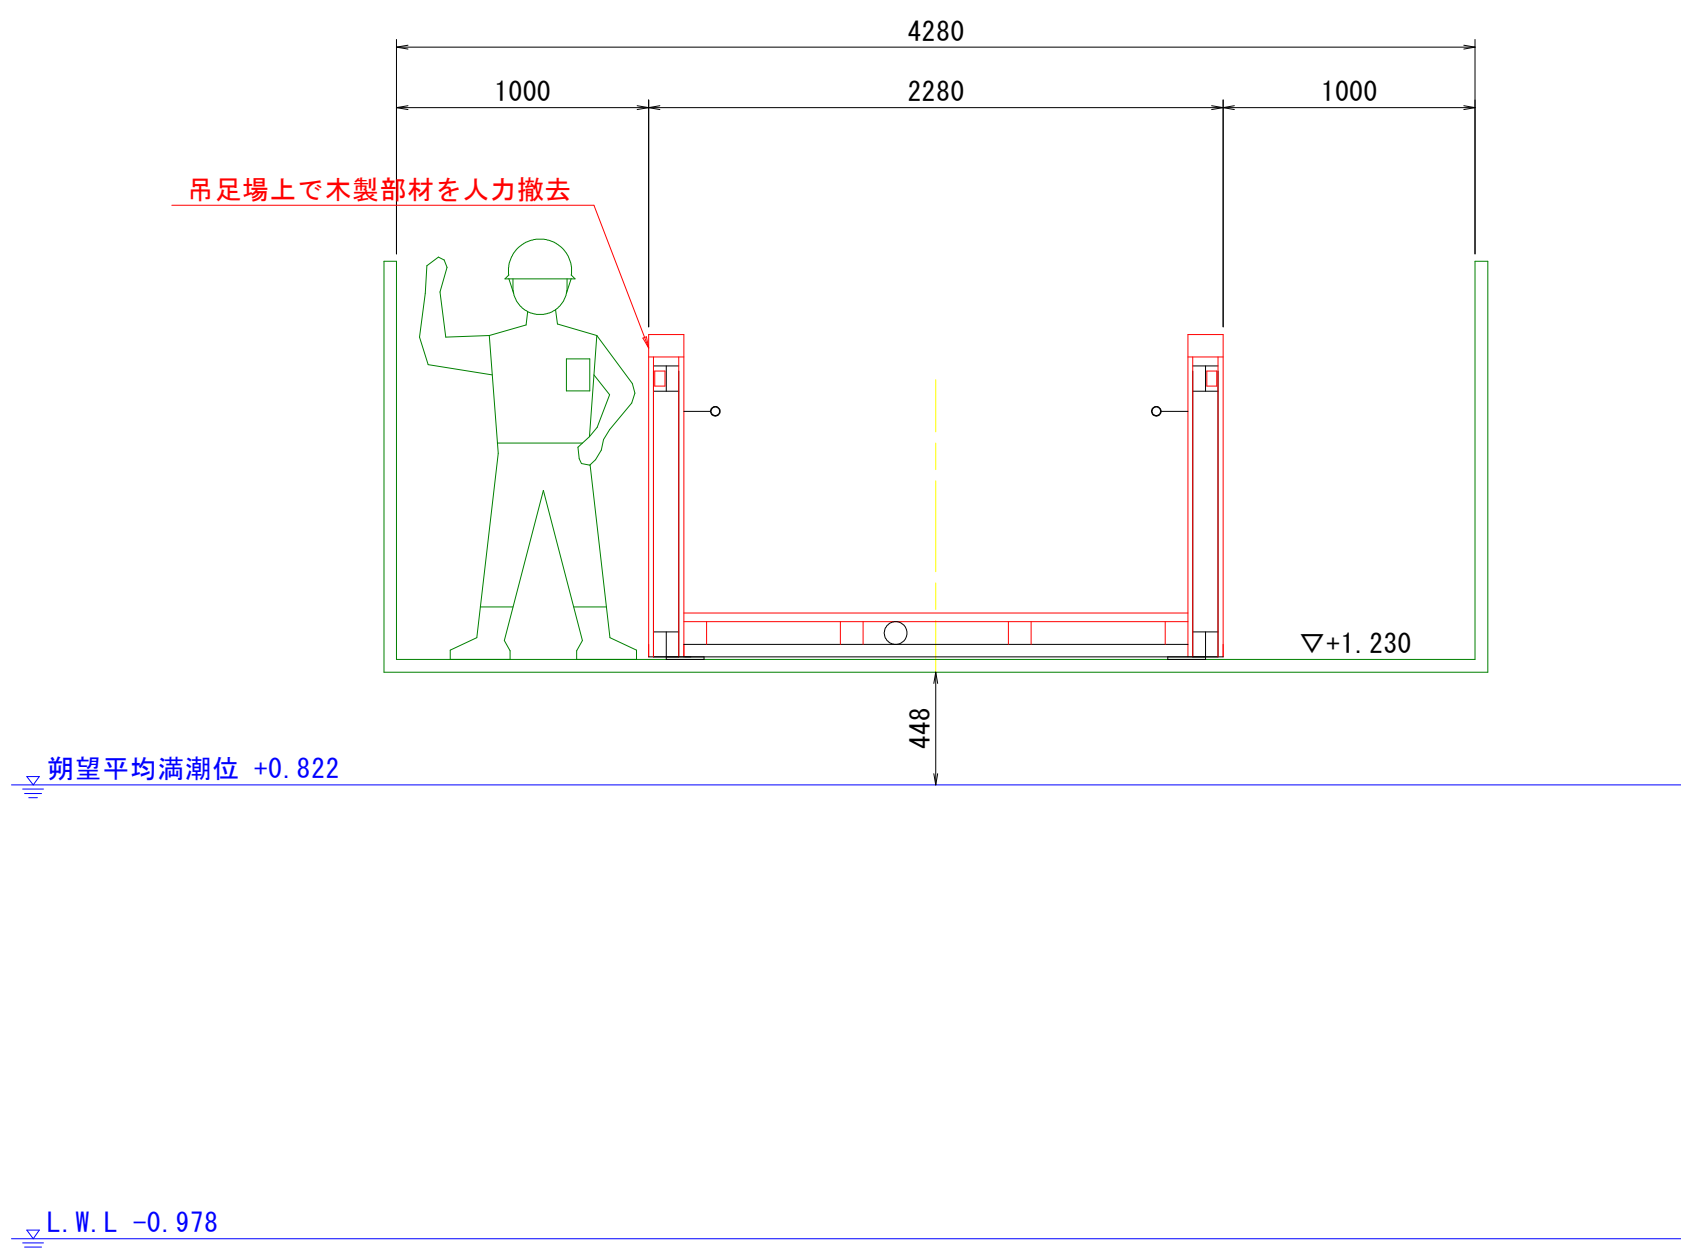

※足場部材は鋼材に緊結し、満潮時に流出しない構造とすること。

注) 撤去対象部材を赤線で示している。

参考図			
工事名	R7徳土 撫養川 鳴・撫養南浜 付帯施設撤去工事		
路線名等	撫養川		
工事箇所	鳴門市撫養町南浜		
図面名	施工計画図(その1)		
縮尺	1:150	図面番号	1/4
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		



施工計画図(その2) S=1:200

渡り橋撤去

断面図 S=1:250

【撤去フロー】

吊足場設置

木製部材撤去  
(人力撤去)

吊足場撤去

鋼材撤去  
(クレーン一括吊り)

鋼材撤去  
(市道上で2次切断)

70tラフタークレーン  
作業半径R=26.0m  
定格総荷重:3.90t(前方特別性能)  
撤去重量:1.97t  
フック重量:0.34t  
吊り重量照査  
1.97+0.34=2.31t<3.90t【OK】

渡り橋(吊り上げ撤去)  
鋼材重量:1.97t

吊り上げ時に隣接構造との縁切(ガス切断)

撫養川

第一城見橋

・交通誘導員  
停止・誘導  
停止位置看板

トラックに積込み可能な長さに2次切断

4t積トラック  
積載寸法:2100x6000x2500

6000  
積載長さ

2100  
積載幅

吊り上げた桁を市道に仮置き

渡り橋  
鋼材重量:1.97t

70tラフタークレーン  
作業半径R=26.0m  
定格総荷重:3.90t(前方特別性能)  
撤去重量:1.97t  
フック重量:0.34t  
吊り重量照査  
1.97+0.34=2.31t<3.90t【OK】

5380  
リヤアウトリガ

R=13000

電柱

フロントアウトリガ

R=24000

7800

5700

6600

架空線

立入禁止看板

荷姿概要図 S=1:50

4t積トラック  
積載寸法:2100x6000x2500

・交通誘導員  
停止・誘導  
停止位置看板

立入禁止看板

立入禁止看板

都市公園


参考図

工事名	R7徳土 撫養川 鳴・撫養南浜 付帯施設撤去工事		
路線名等	撫養川		
工事箇所	鳴門市撫養町南浜		
図面名	施工計画図(その2)		
縮尺	1:200	図面番号	2/4
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		




# 施工計画図（その3） S=1:150

## 固定棧橋 可変角階段撤去

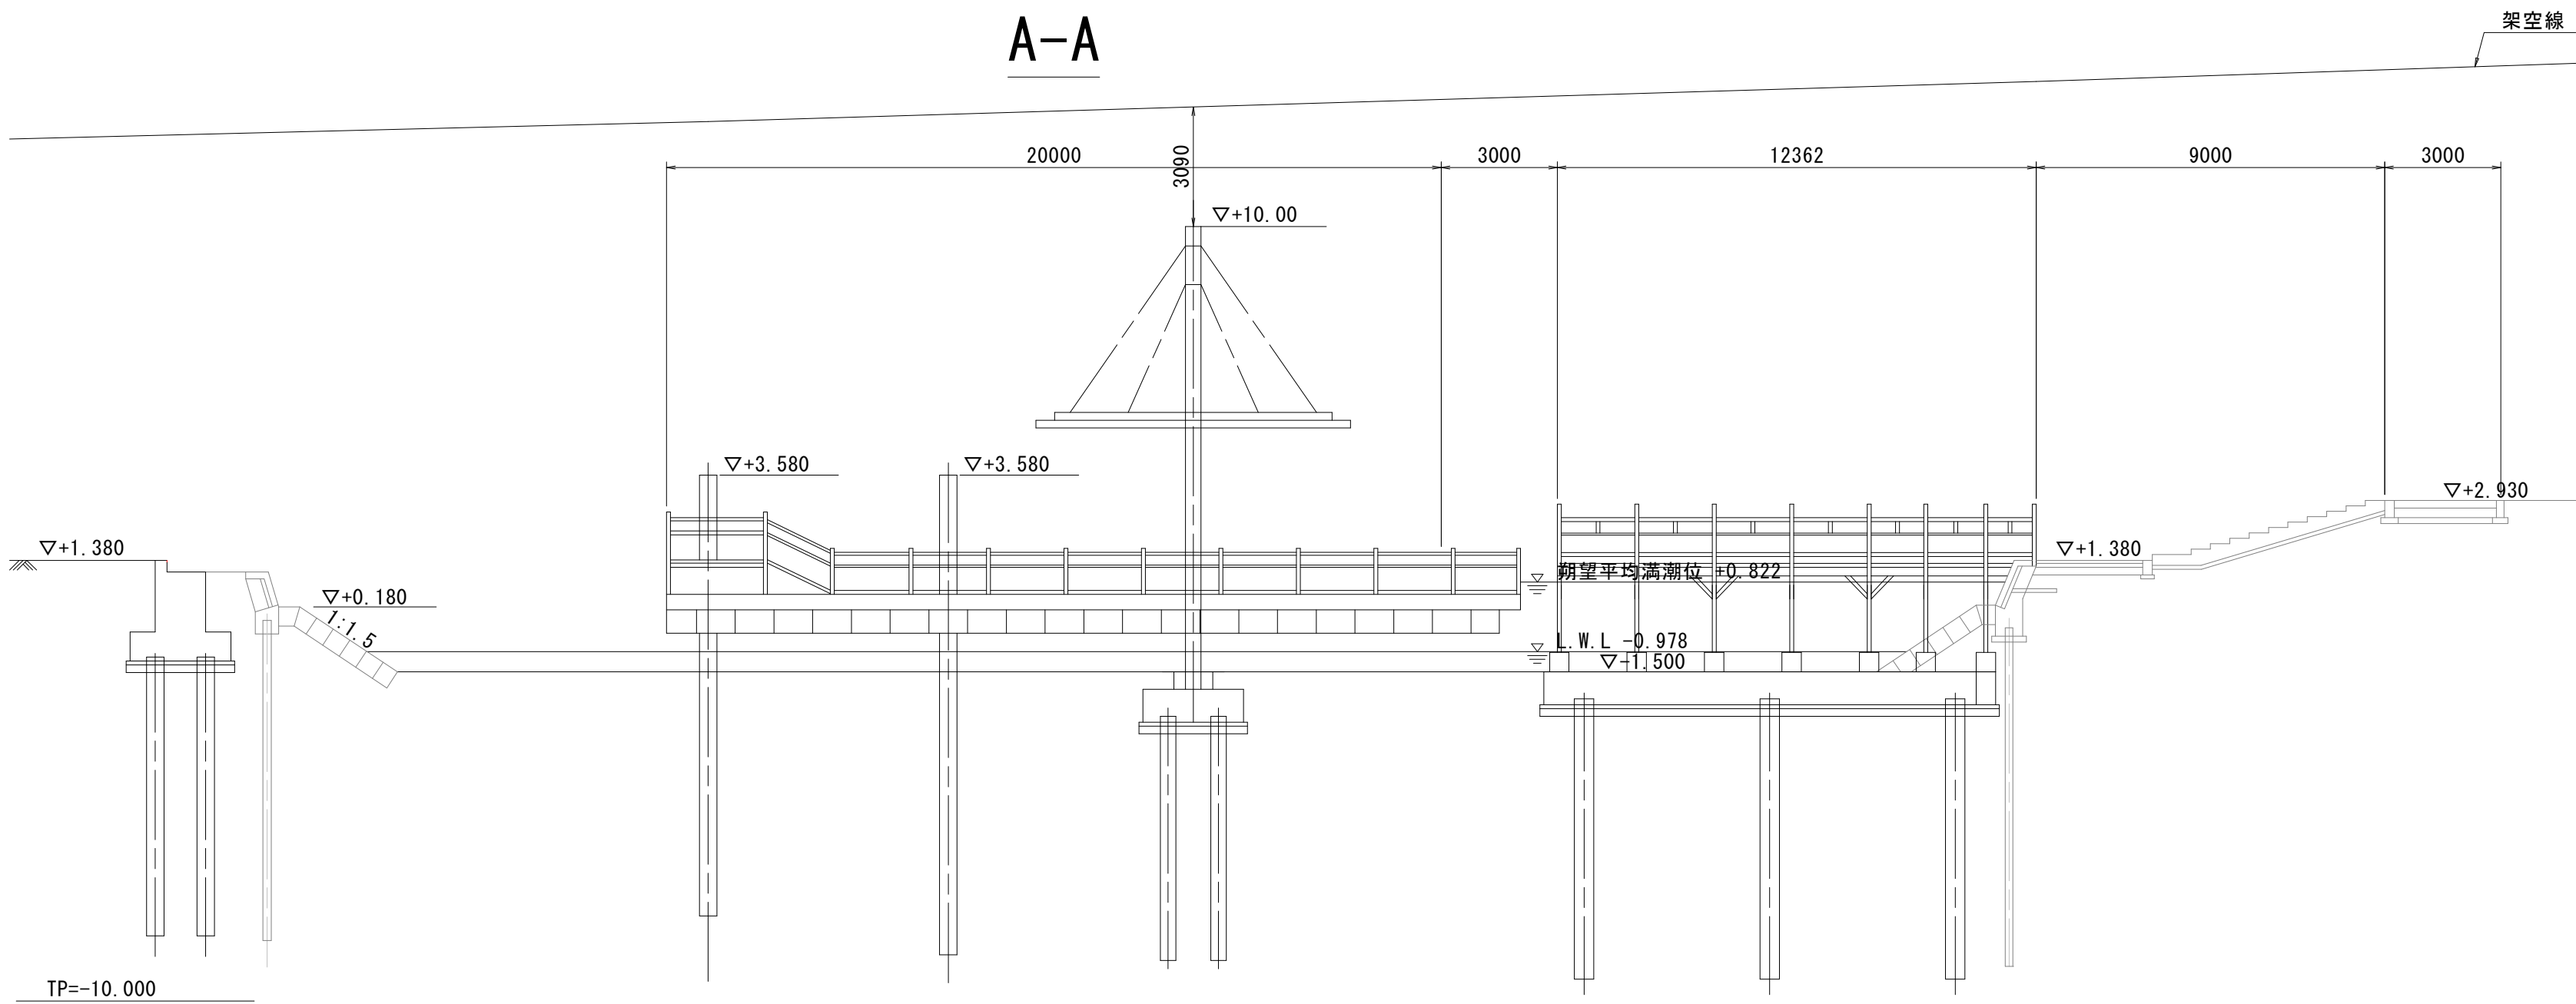

## 平面図

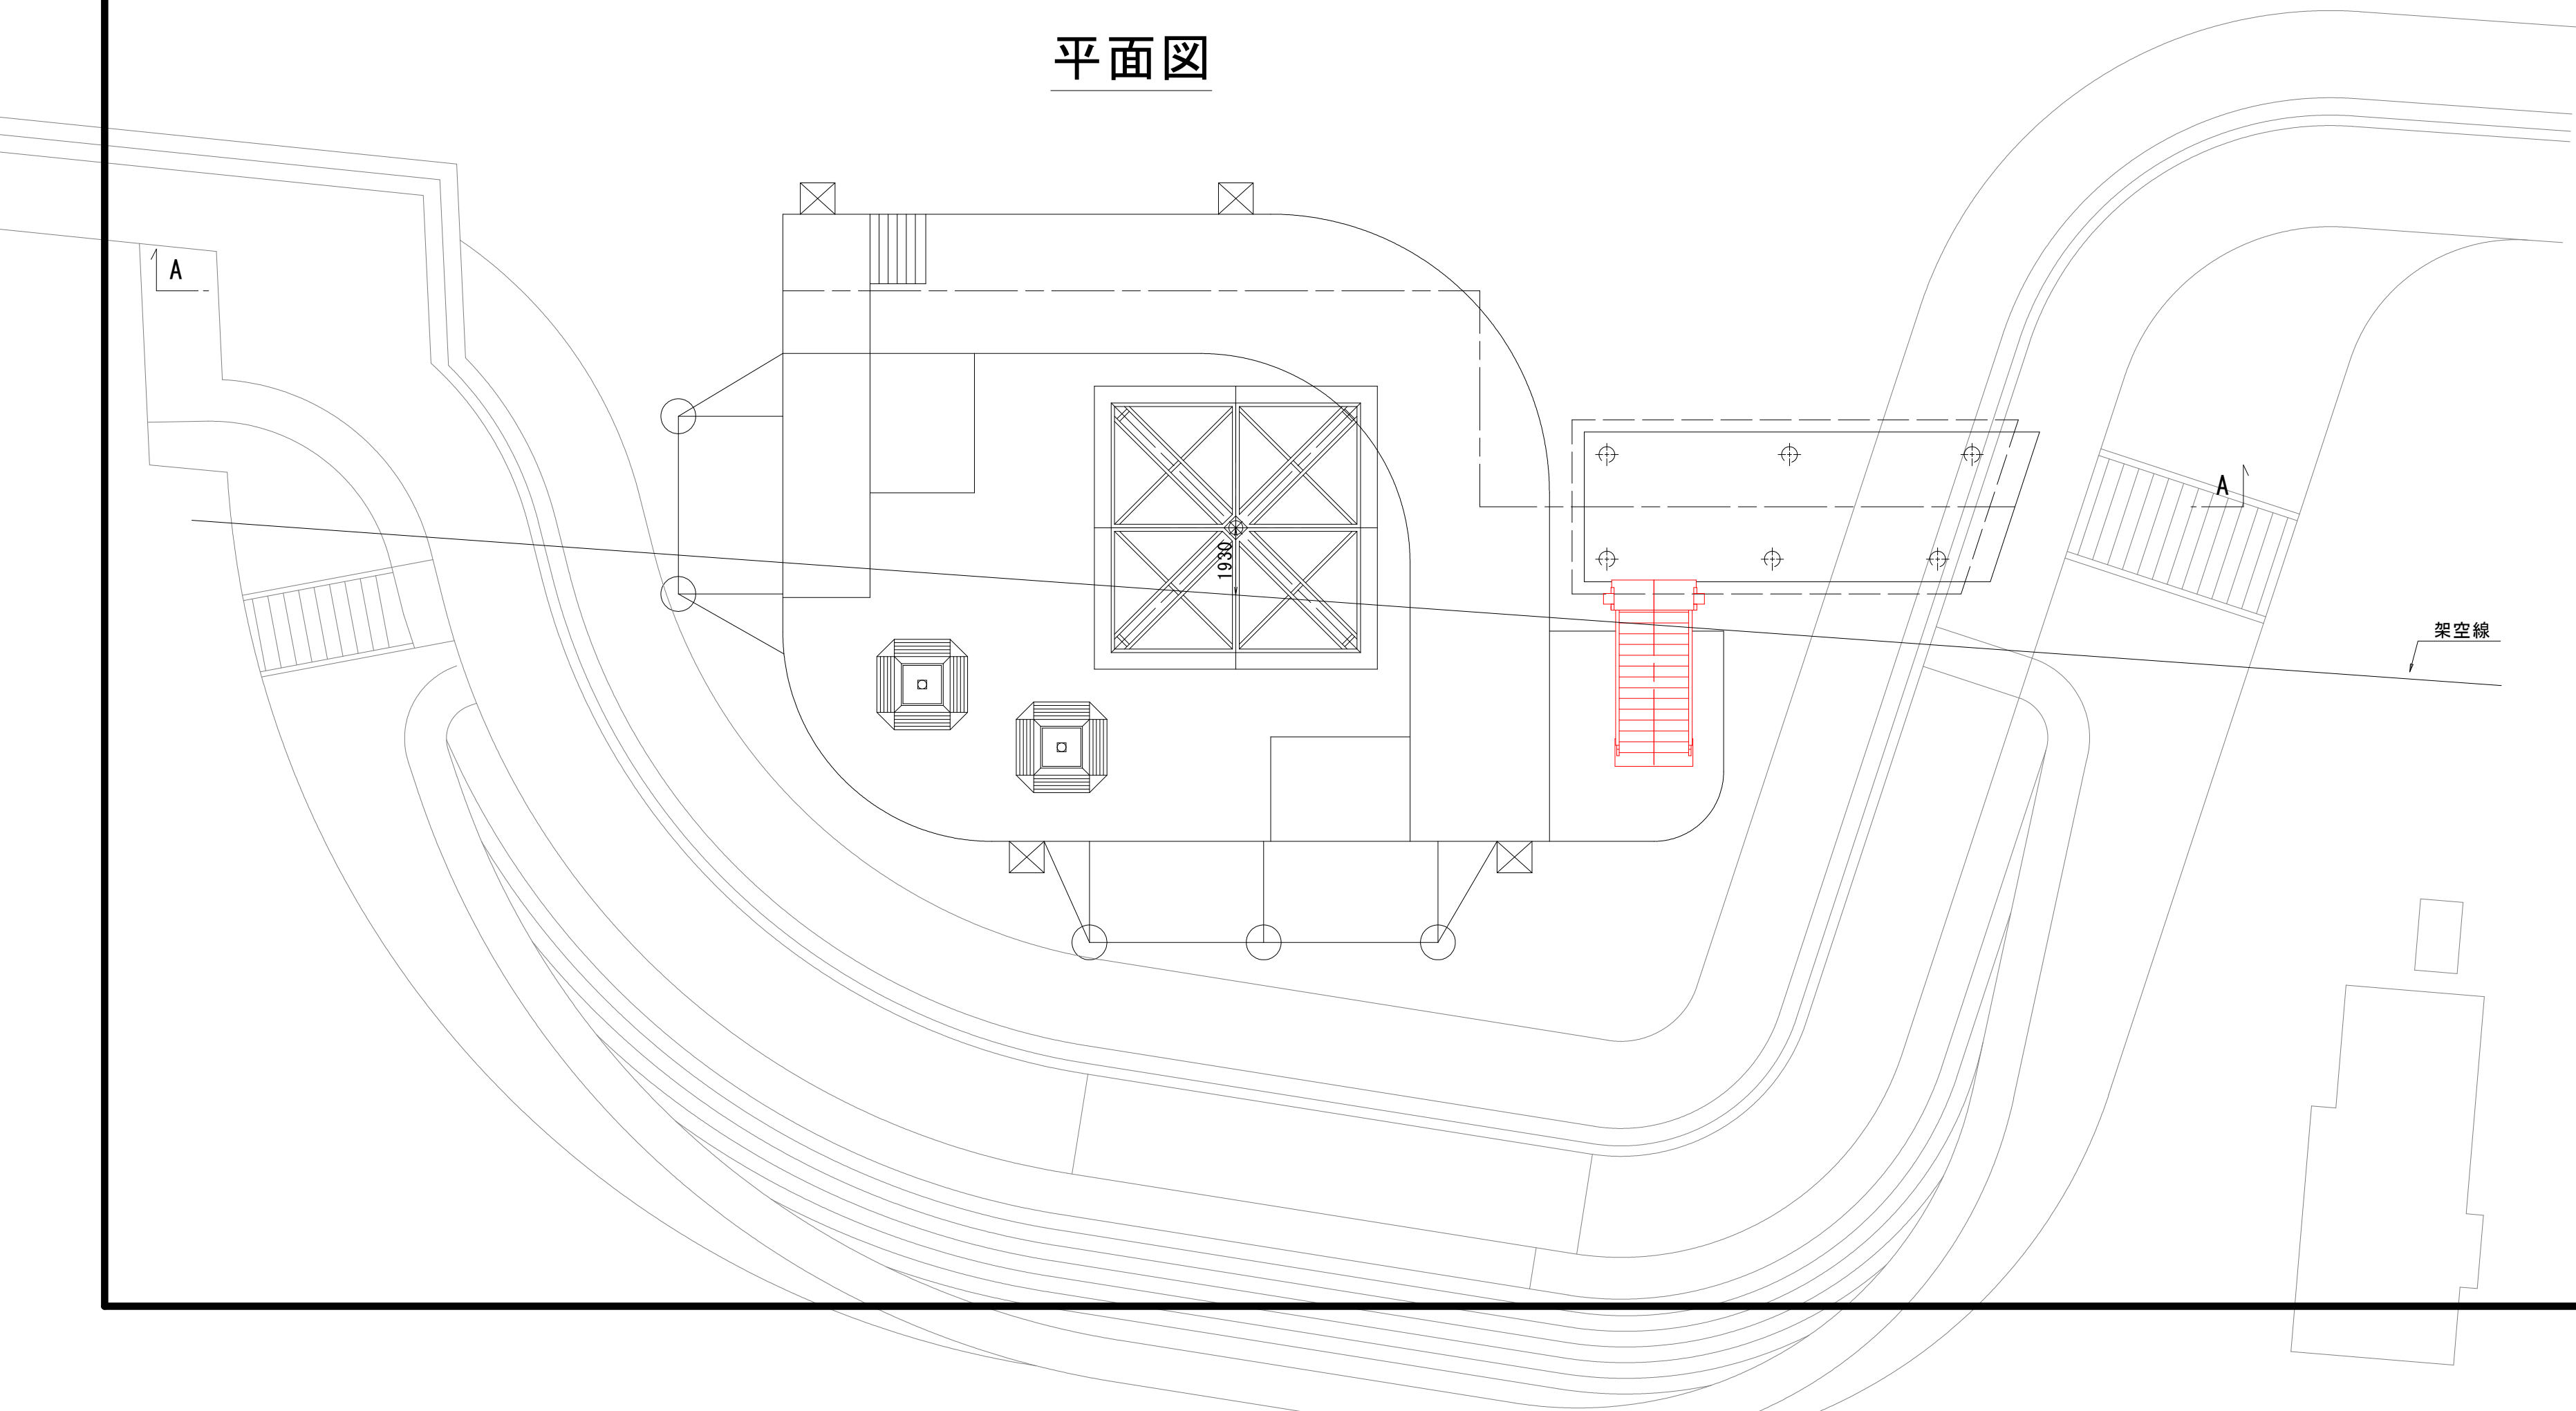

### 【撤去フロー】


木製部材撤去  
（人力撤去）

浮棧橋及び固定棧橋本体を  
施工ヤードとして活用


鋼材撤去  
（人力撤去）

浮棧橋上で運搬可能な重量（<50kg）までガス切断  
※火花等の飛散防止のためシート養生を設置

## 可変角階段詳細図 S=1:50

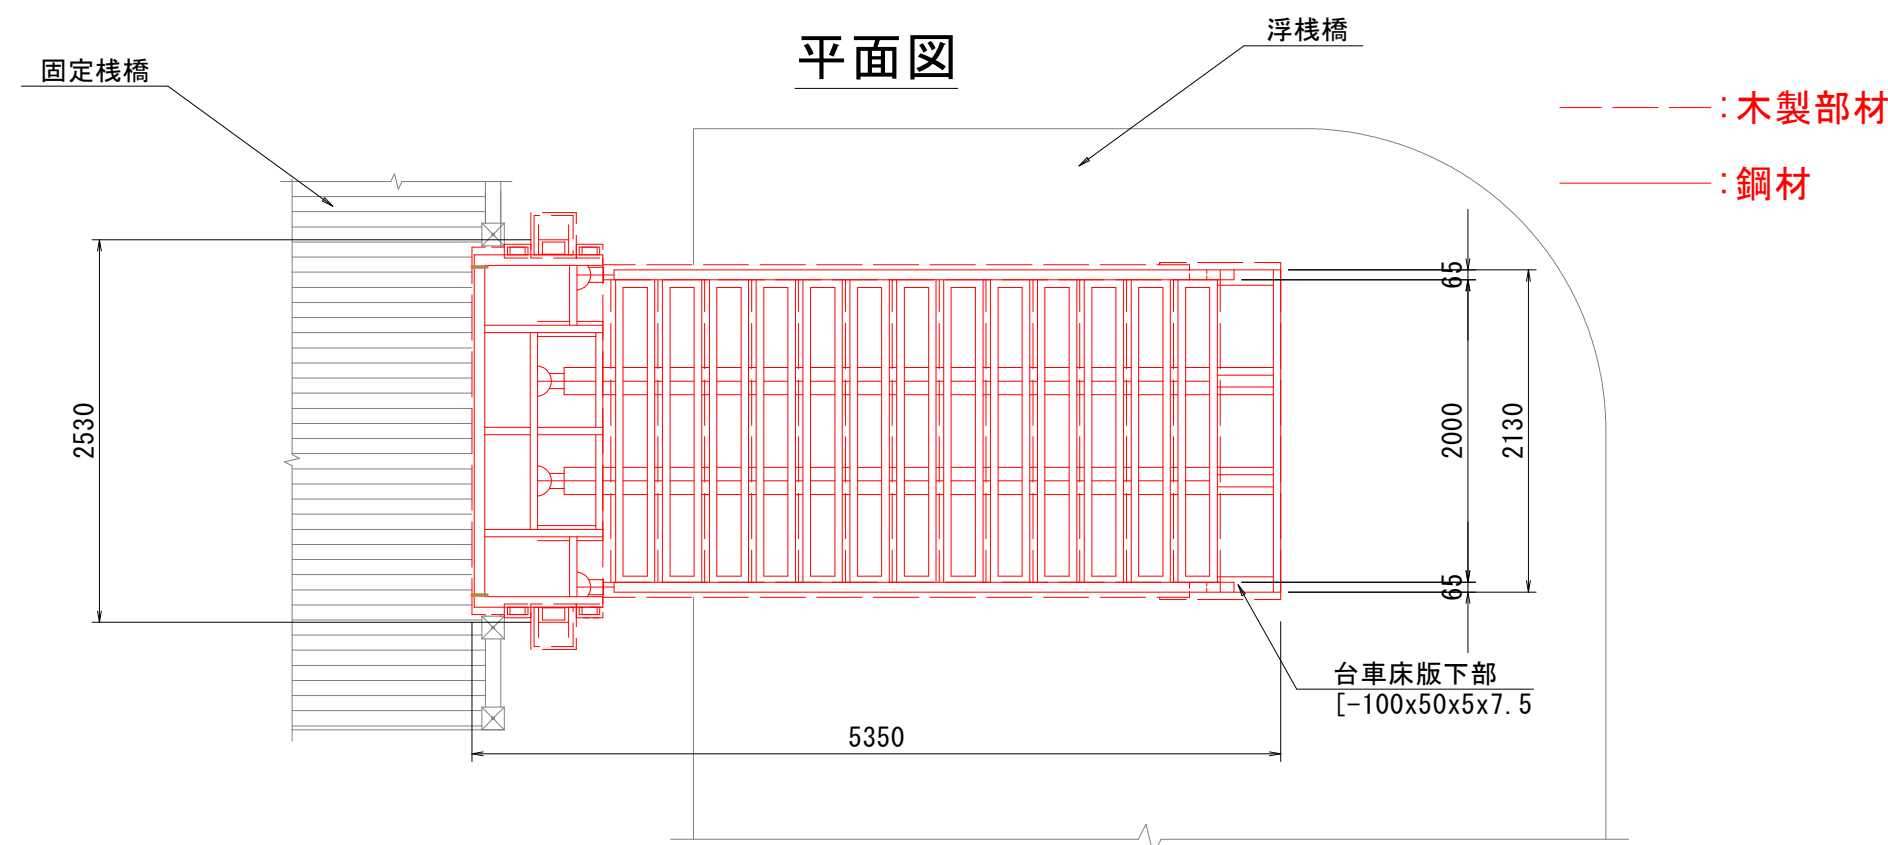

### 側面図

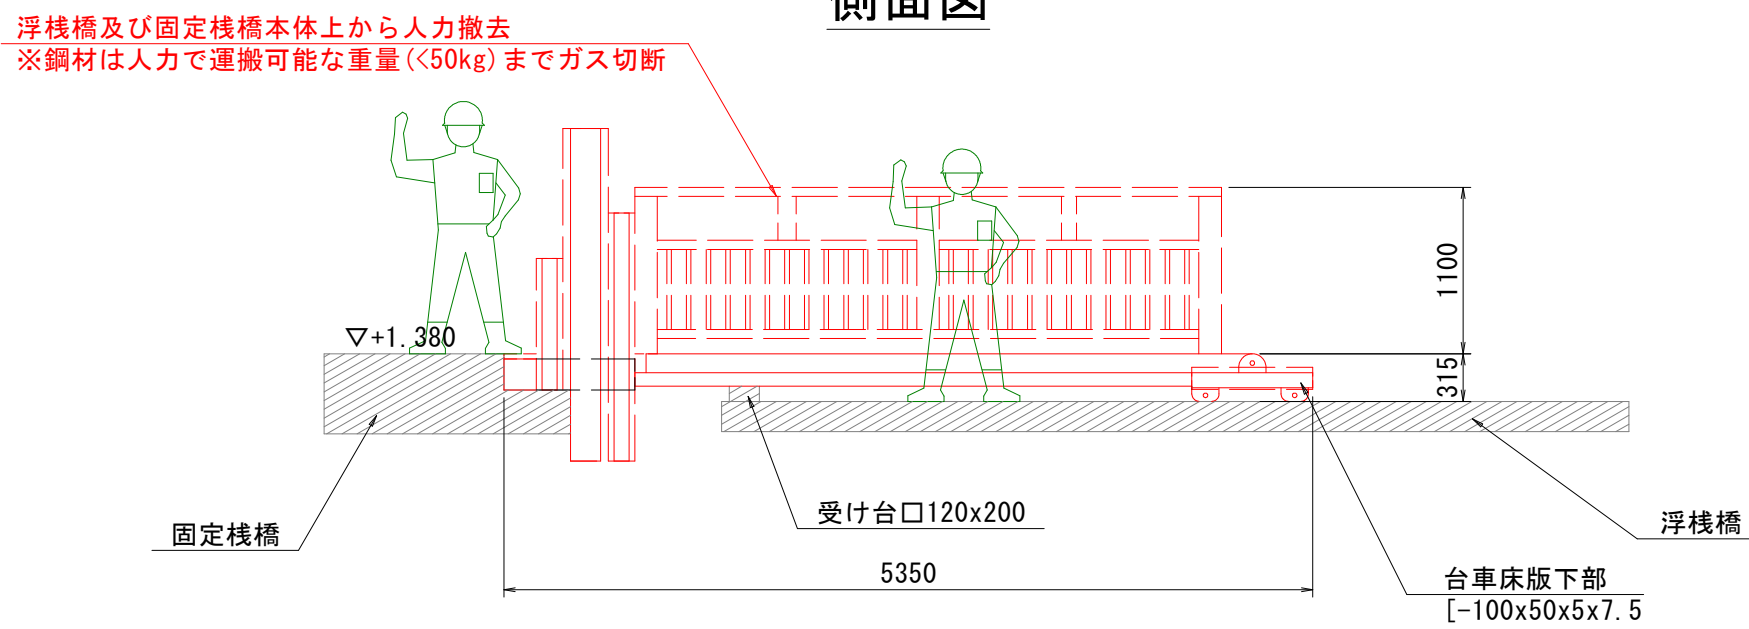


※階段継手切断時において、桁材が受け台に支持されている  
満潮時に作業を行うこと。

注）撤去対象部材を赤線で示している。


参考図			
工 事 名	R7徳土 撫養川 鳴・撫養南浜 付帯施設撤去工事		
路線名等	撫養川		
工事箇所	鳴門市撫養町南浜		
図 面 名	施工計画図（その3）		
縮 尺	1:150	図面番号	3 / 4
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

# 施工計画図（その4） S=1:150

## 固定栈橋撤去

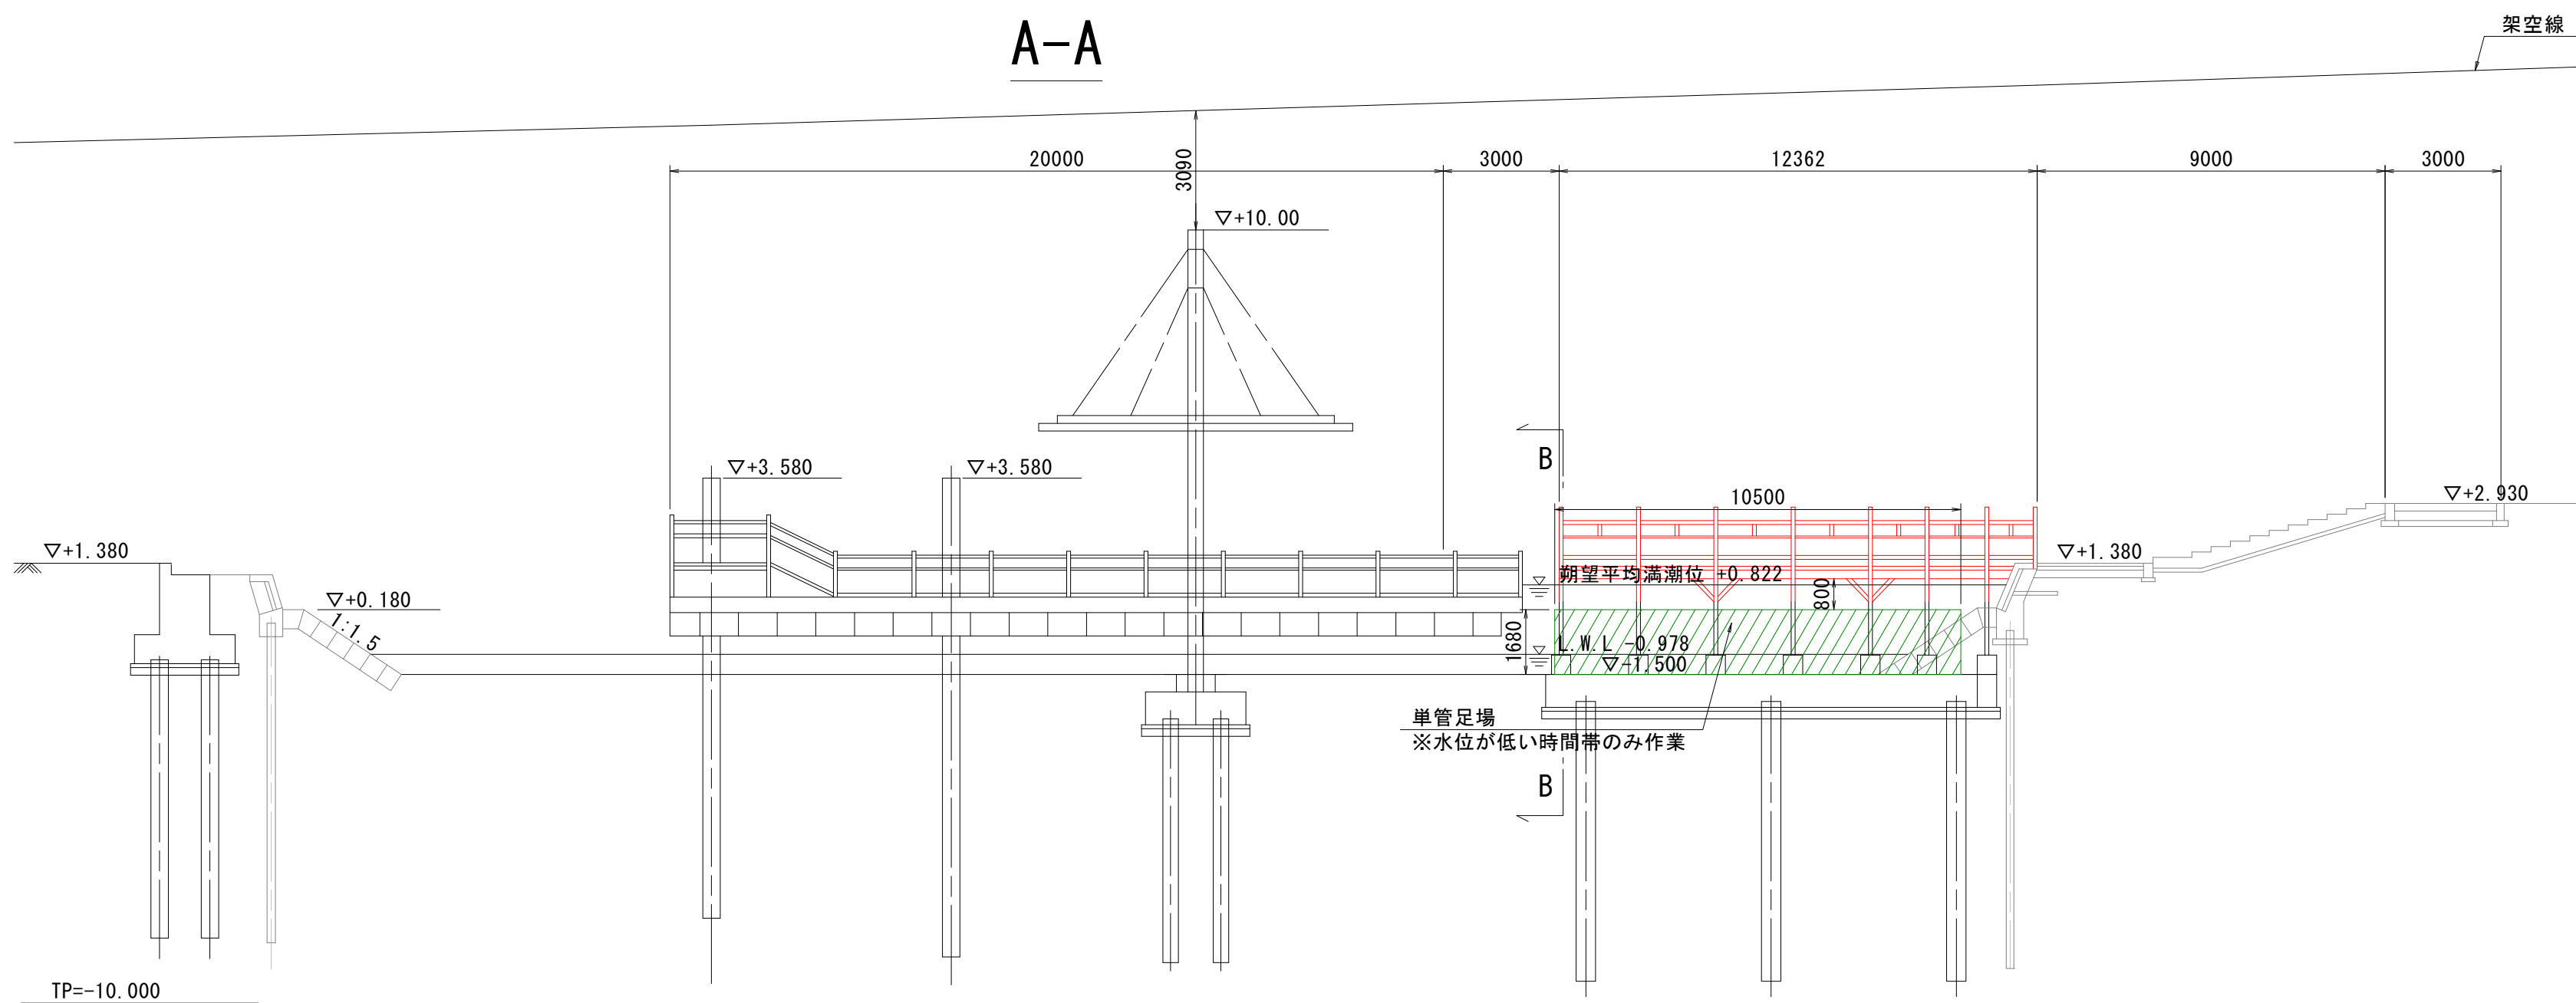

## 平面図

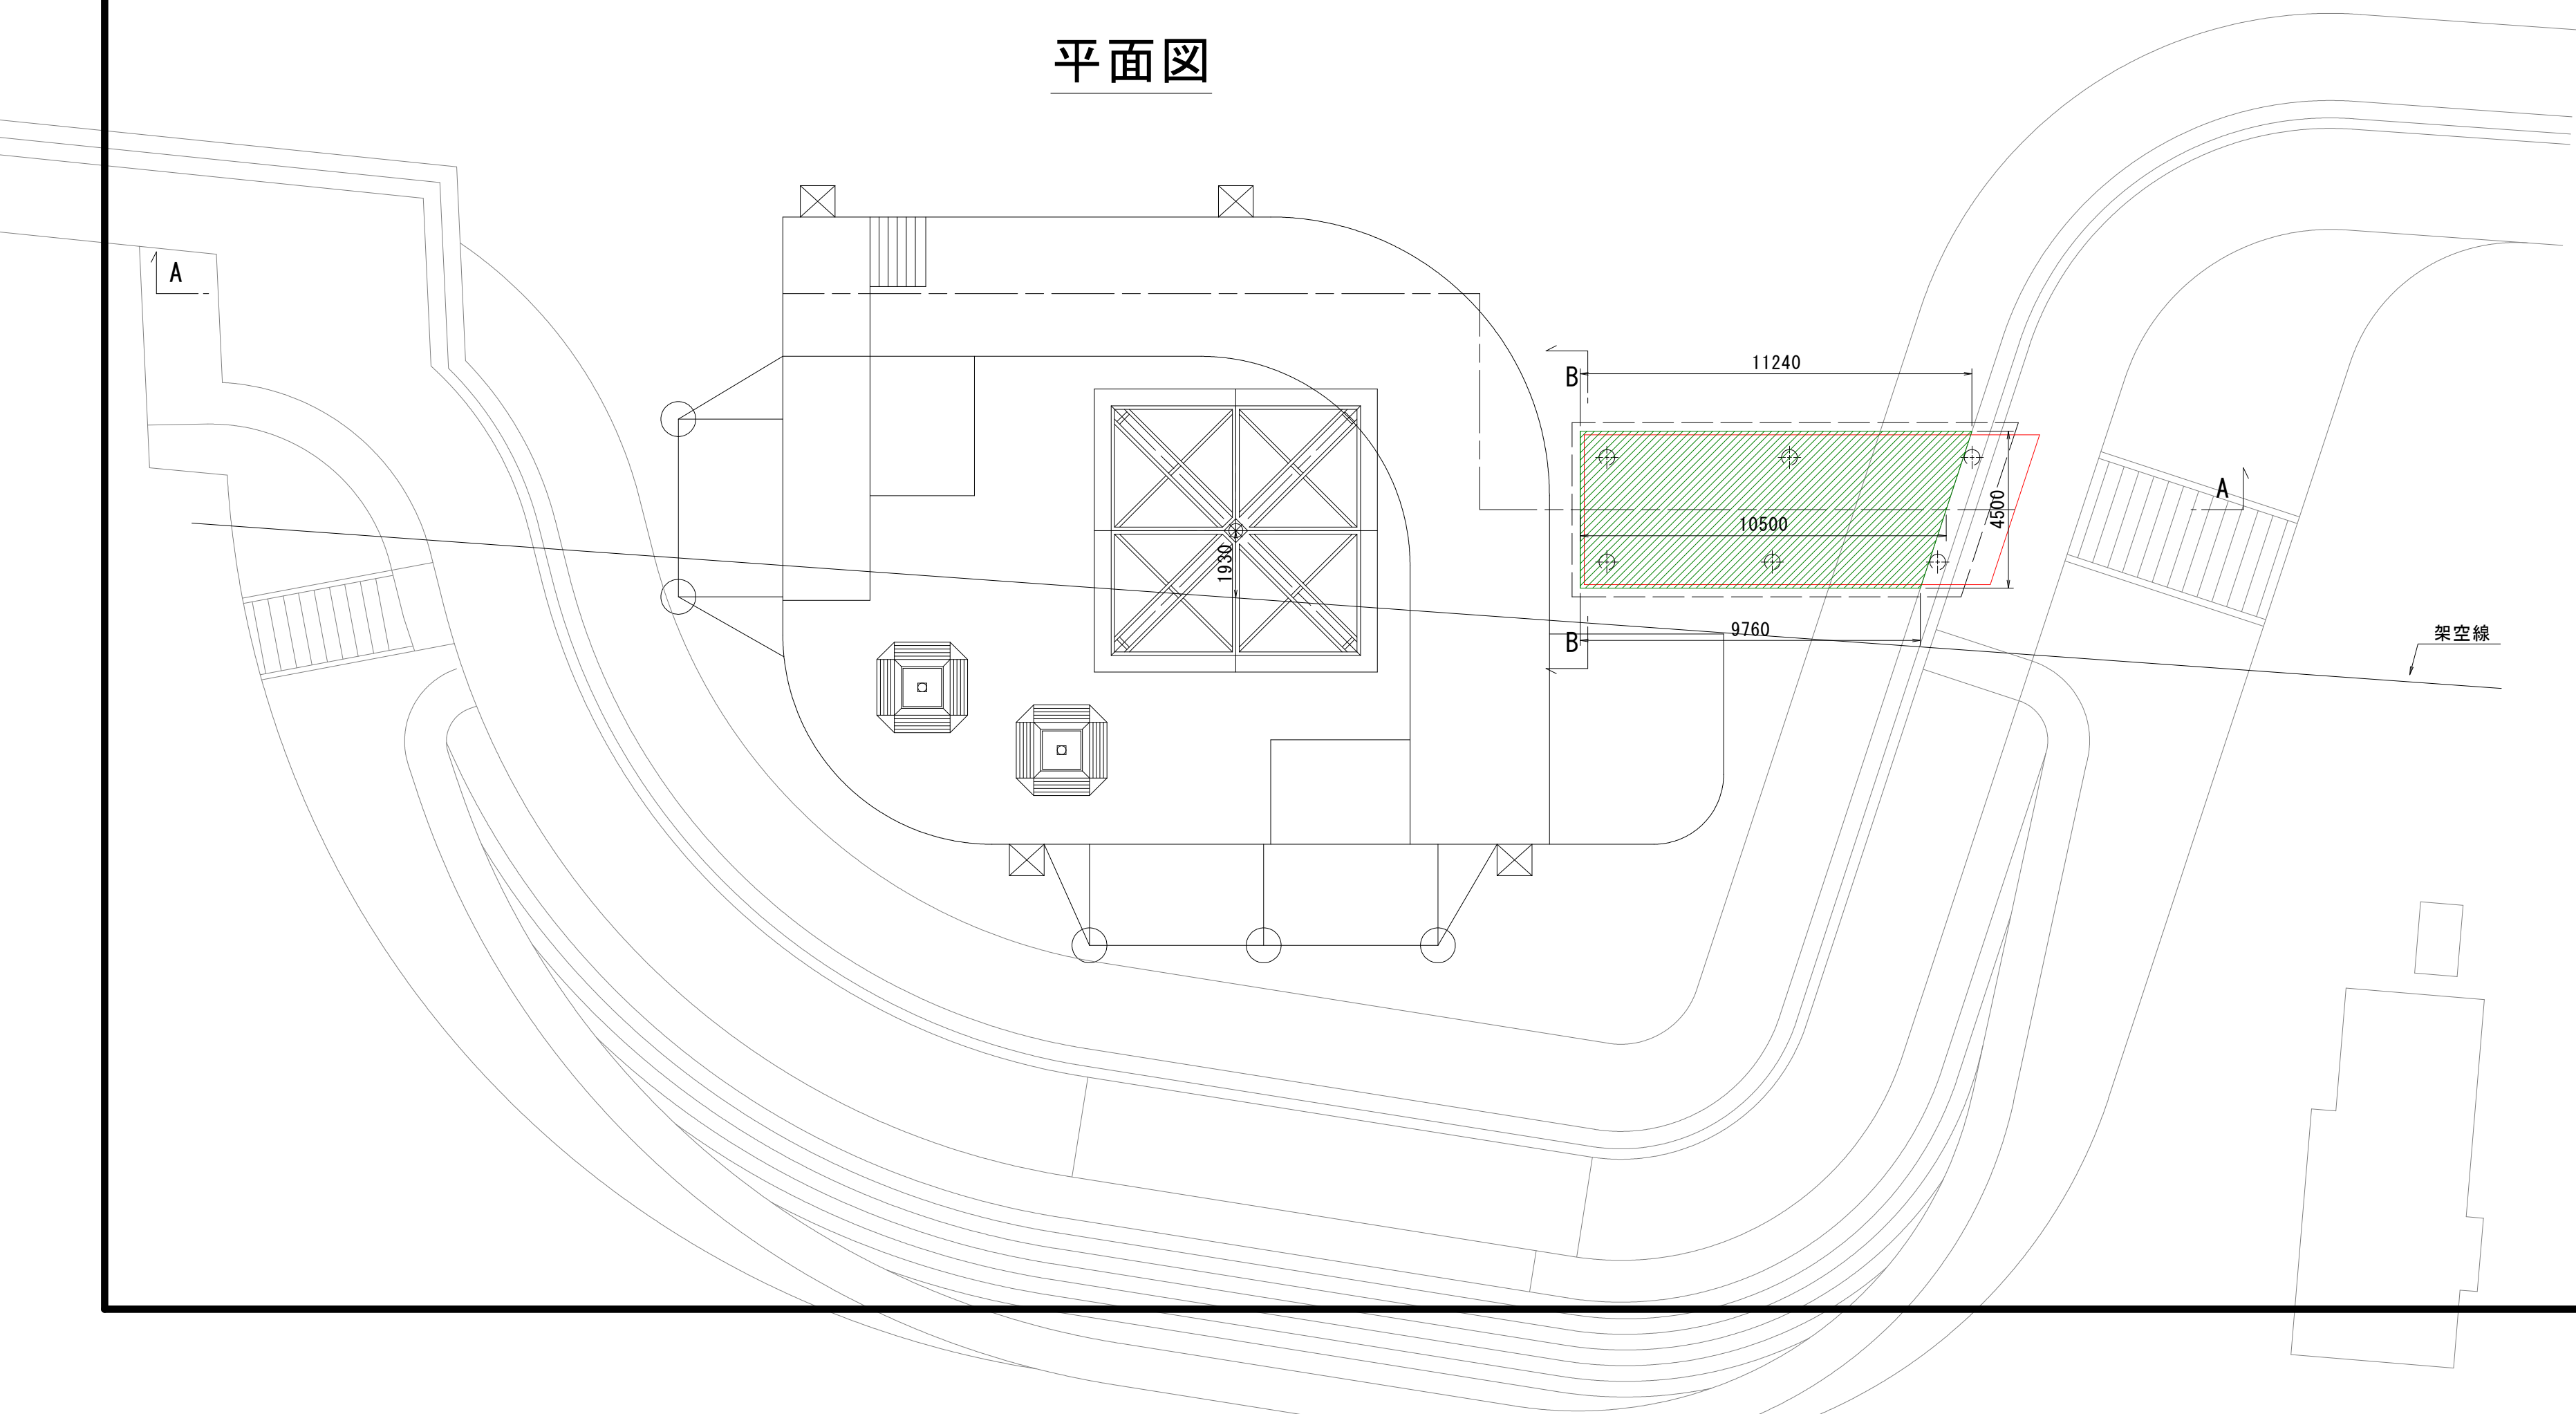

### 【干潮時撤去フロー】

単管足場設置  
(浮力対応足場板)


路面以下部材撤去  
(人力撤去)

単管足場撤去

### 【満潮時撤去フロー】

手すり部材撤去  
(人力撤去)

## 上部工断面図 (B-B) S=1:30

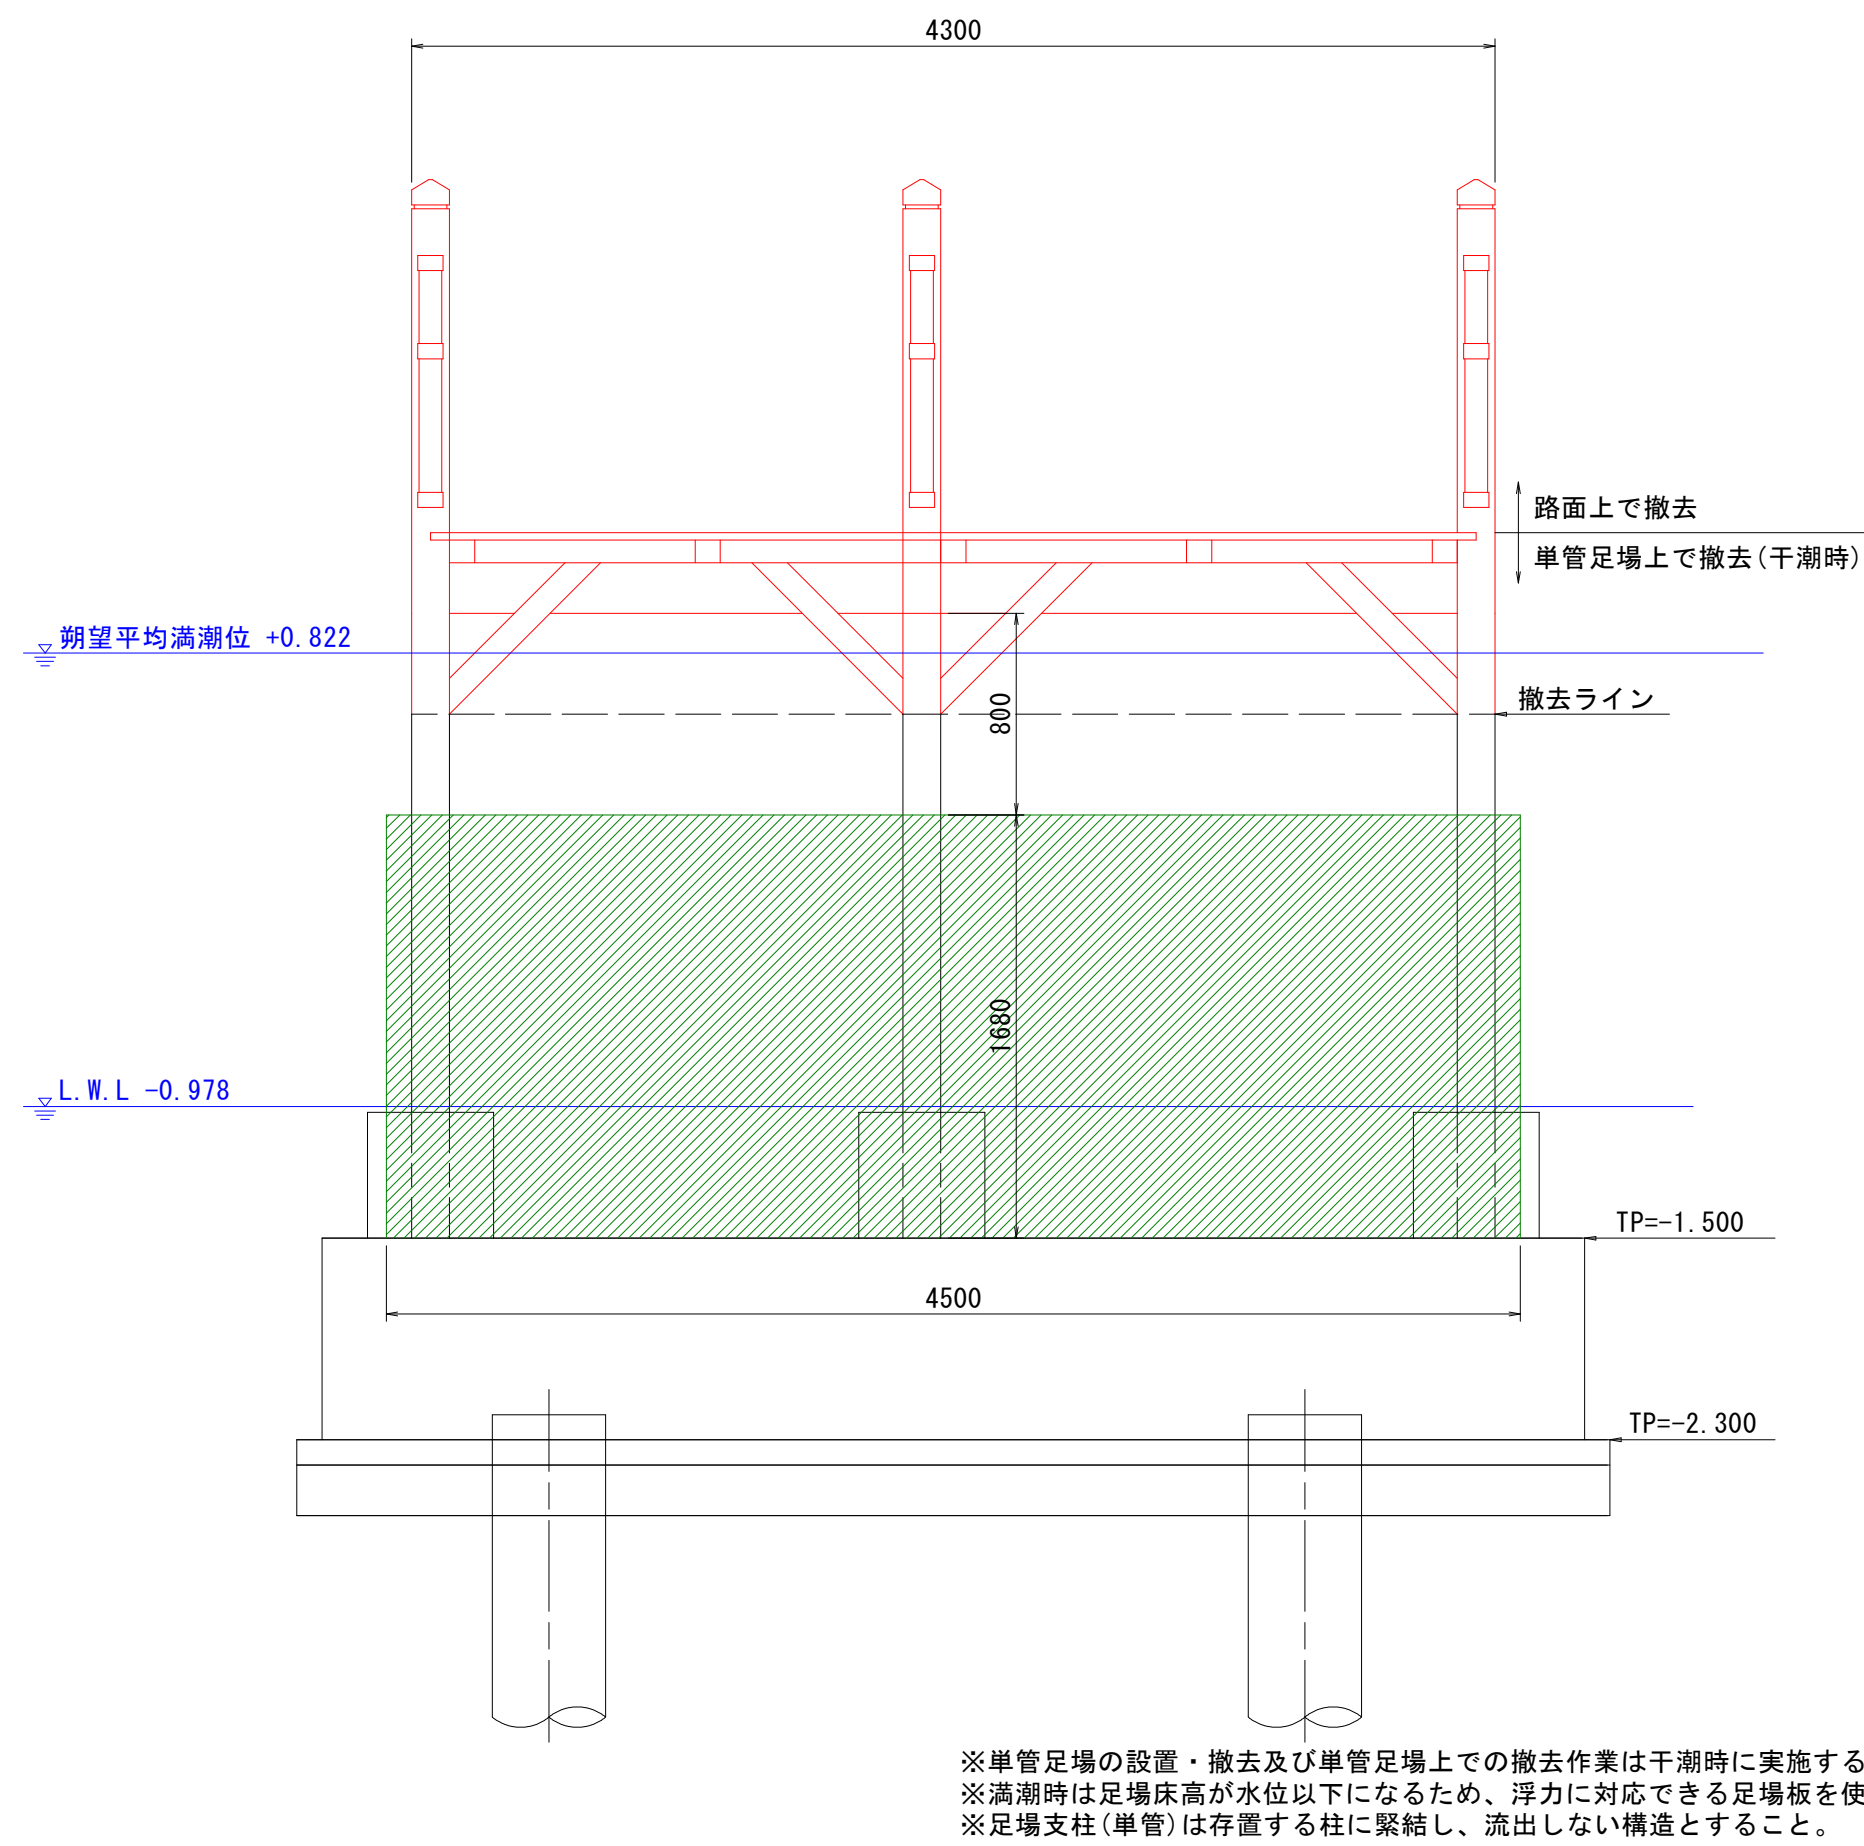

注) 撤去対象部材を赤線で示している。

参考図			
工 事 名	R7徳土 撫養川 鳴・撫養南浜 付帯施設撤去工事		
路線名等	撫養川		
工事箇所	鳴門市撫養町南浜		
図 面 名	施工計画図(その4)		
縮 尺	1:150	図面番号	4 / 4
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		
