

# 施工計画図(案) S=1:250 【1期施工】

※当施工計画は、案であり協議の上、変更可能である。


## 【施工順序】

- ①歩道、植樹帯、路側排水管
- ②車道舗装(本舗装)

※現在ほ交通形態のまま、可能な範囲で施工。

点	X座標	Y座標
NO.0	118120.899	43489.223
NO.1	118120.724	43479.289
NO.2	118117.243	43465.371
NO.3	118115.370	43465.400
NO.4	118113.784	43474.255
NO.5	118112.423	43489.460
NO.6	118110.248	43519.492
NO.7	118108.433	43558.764
NO.8	118106.806	43616.844
NO.9	118105.523	43697.322
NO.10	118103.147	43809.352

点	X座標	Y座標
NO.0	118120.722	43464.414
NO.1	118120.274	43479.289
NO.2	118121.524	43515.977
NO.3	118125.175	43577.238
NO.4	118128.251	43656.322
NO.5	118129.477	43767.788
NO.6	118134.701	43943.868
NO.7	118143.744	44242.177

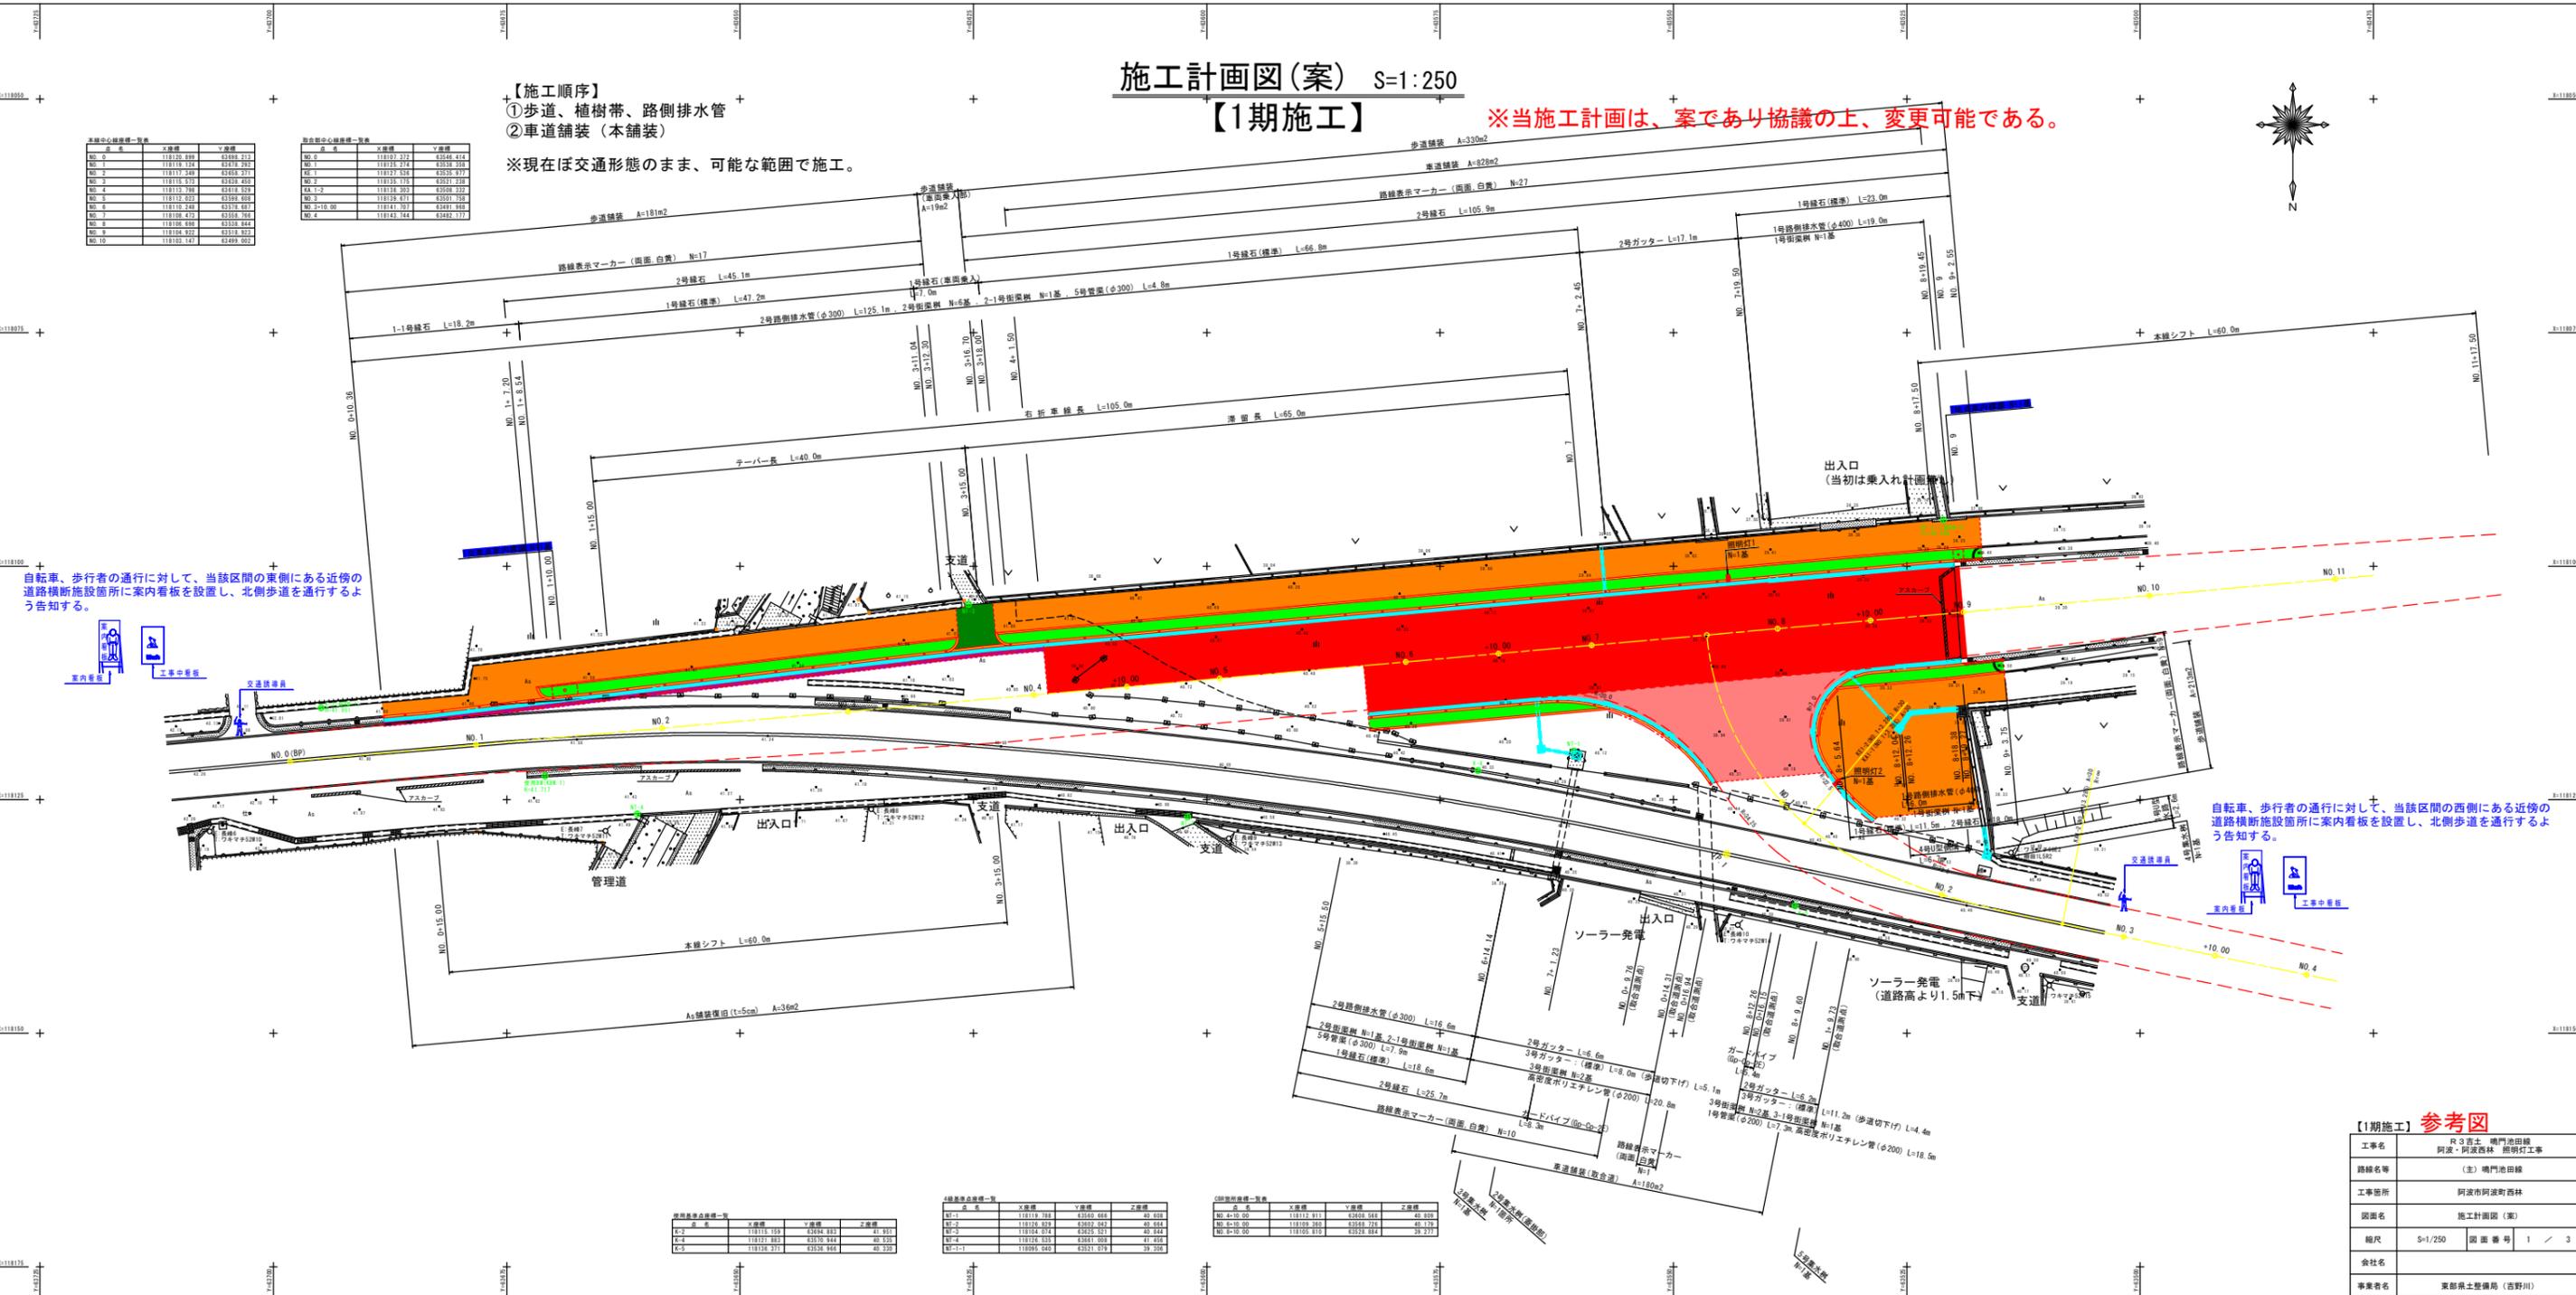

自転車、歩行者の通行に対して、当該区間の東側にある近隣の道路横断施設箇所に案内看板を設置し、北側歩道を通行するよう告知する。



自転車、歩行者の通行に対して、当該区間の西側にある近隣の道路横断施設箇所に案内看板を設置し、北側歩道を通行するよう告知する。



点	X座標	Y座標
NO.0	118119.109	43504.932
NO.1	118121.492	43576.344
NO.2	118124.371	43636.344
NO.3	118126.319	43721.919

点	X座標	Y座標
NO.0	118119.112	43505.884
NO.1	118119.319	43522.257
NO.2	118124.374	43625.321
NO.3	118126.319	43681.904
NO.4	118129.485	43751.919

点	X座標	Y座標
NO.0	118117.811	43505.884
NO.1	118119.319	43522.257
NO.2	118124.374	43625.321
NO.3	118126.319	43681.904
NO.4	118129.482	43752.882

工事名	R3富士 磯門池田線 阿波・阿波西線 照明灯工事
路線名等	(主) 磯門池田線
工事箇所	阿波市阿波町西林
図面名	施工計画図(案)
縮尺	S=1/250 図面番号 1 / 3
会社名	
事業者名	東部県土整備局(吉野川)

# 施工計画図(案) S=1:250

## 【2期施工】 夜間施工

※当施工計画は、案であり協議の上、変更可能である。



- 【施工順序】  
①路側排水管施工（昼間施工）  
②車道舗装（本舗装）

	日進量 (m <sup>3</sup> /日)	作業日数
表層	1353	0.4
基層以深全て	84	5.6
全層	80	6.0

1. 基層まで片側車線ずつ7日で施工  
2. 表層を片側車線ずつ1日で施工

左側中心線位置一覧

点名	X座標	Y座標
NO.0	118120.899	43488.213
NO.1	118120.724	43479.282
NO.2	118117.243	43468.371
NO.3	118115.573	43459.460
NO.4	118113.784	43450.550
NO.5	118112.023	43441.640
NO.6	118110.248	43432.730
NO.7	118108.473	43423.820
NO.8	118106.698	43414.910
NO.9	118104.923	43406.000
NO.10	118103.147	43397.090

右側中心線位置一覧


点名	X座標	Y座標
NO.0	118127.372	43548.414
NO.1	118126.274	43539.503
NO.2	118123.524	43528.592
NO.3	118121.175	43517.681
NO.4	118118.725	43506.770
NO.5	118116.175	43495.860
NO.6	118113.525	43484.950
NO.7	118110.775	43474.040
NO.8	118108.025	43463.130
NO.9	118105.275	43452.220
NO.10	118102.525	43441.310

	日進量 (m <sup>3</sup> /日)	作業日数
表層	1353	0.3
基層以深全て	237	1.6
全層	200	1.9

1. 基層まで片側車線ずつ2日で施工  
2. 表層を片側車線ずつ1日で施工

自転車、歩行者の通行に対して、当該区間の東側にある近傍の道路横断施設箇所に案内看板を設置し、北側歩道を通行するよう告知する。

自転車、歩行者の通行に対して、当該区間の西側にある近傍の道路横断施設箇所に案内看板を設置し、北側歩道を通行するよう告知する。

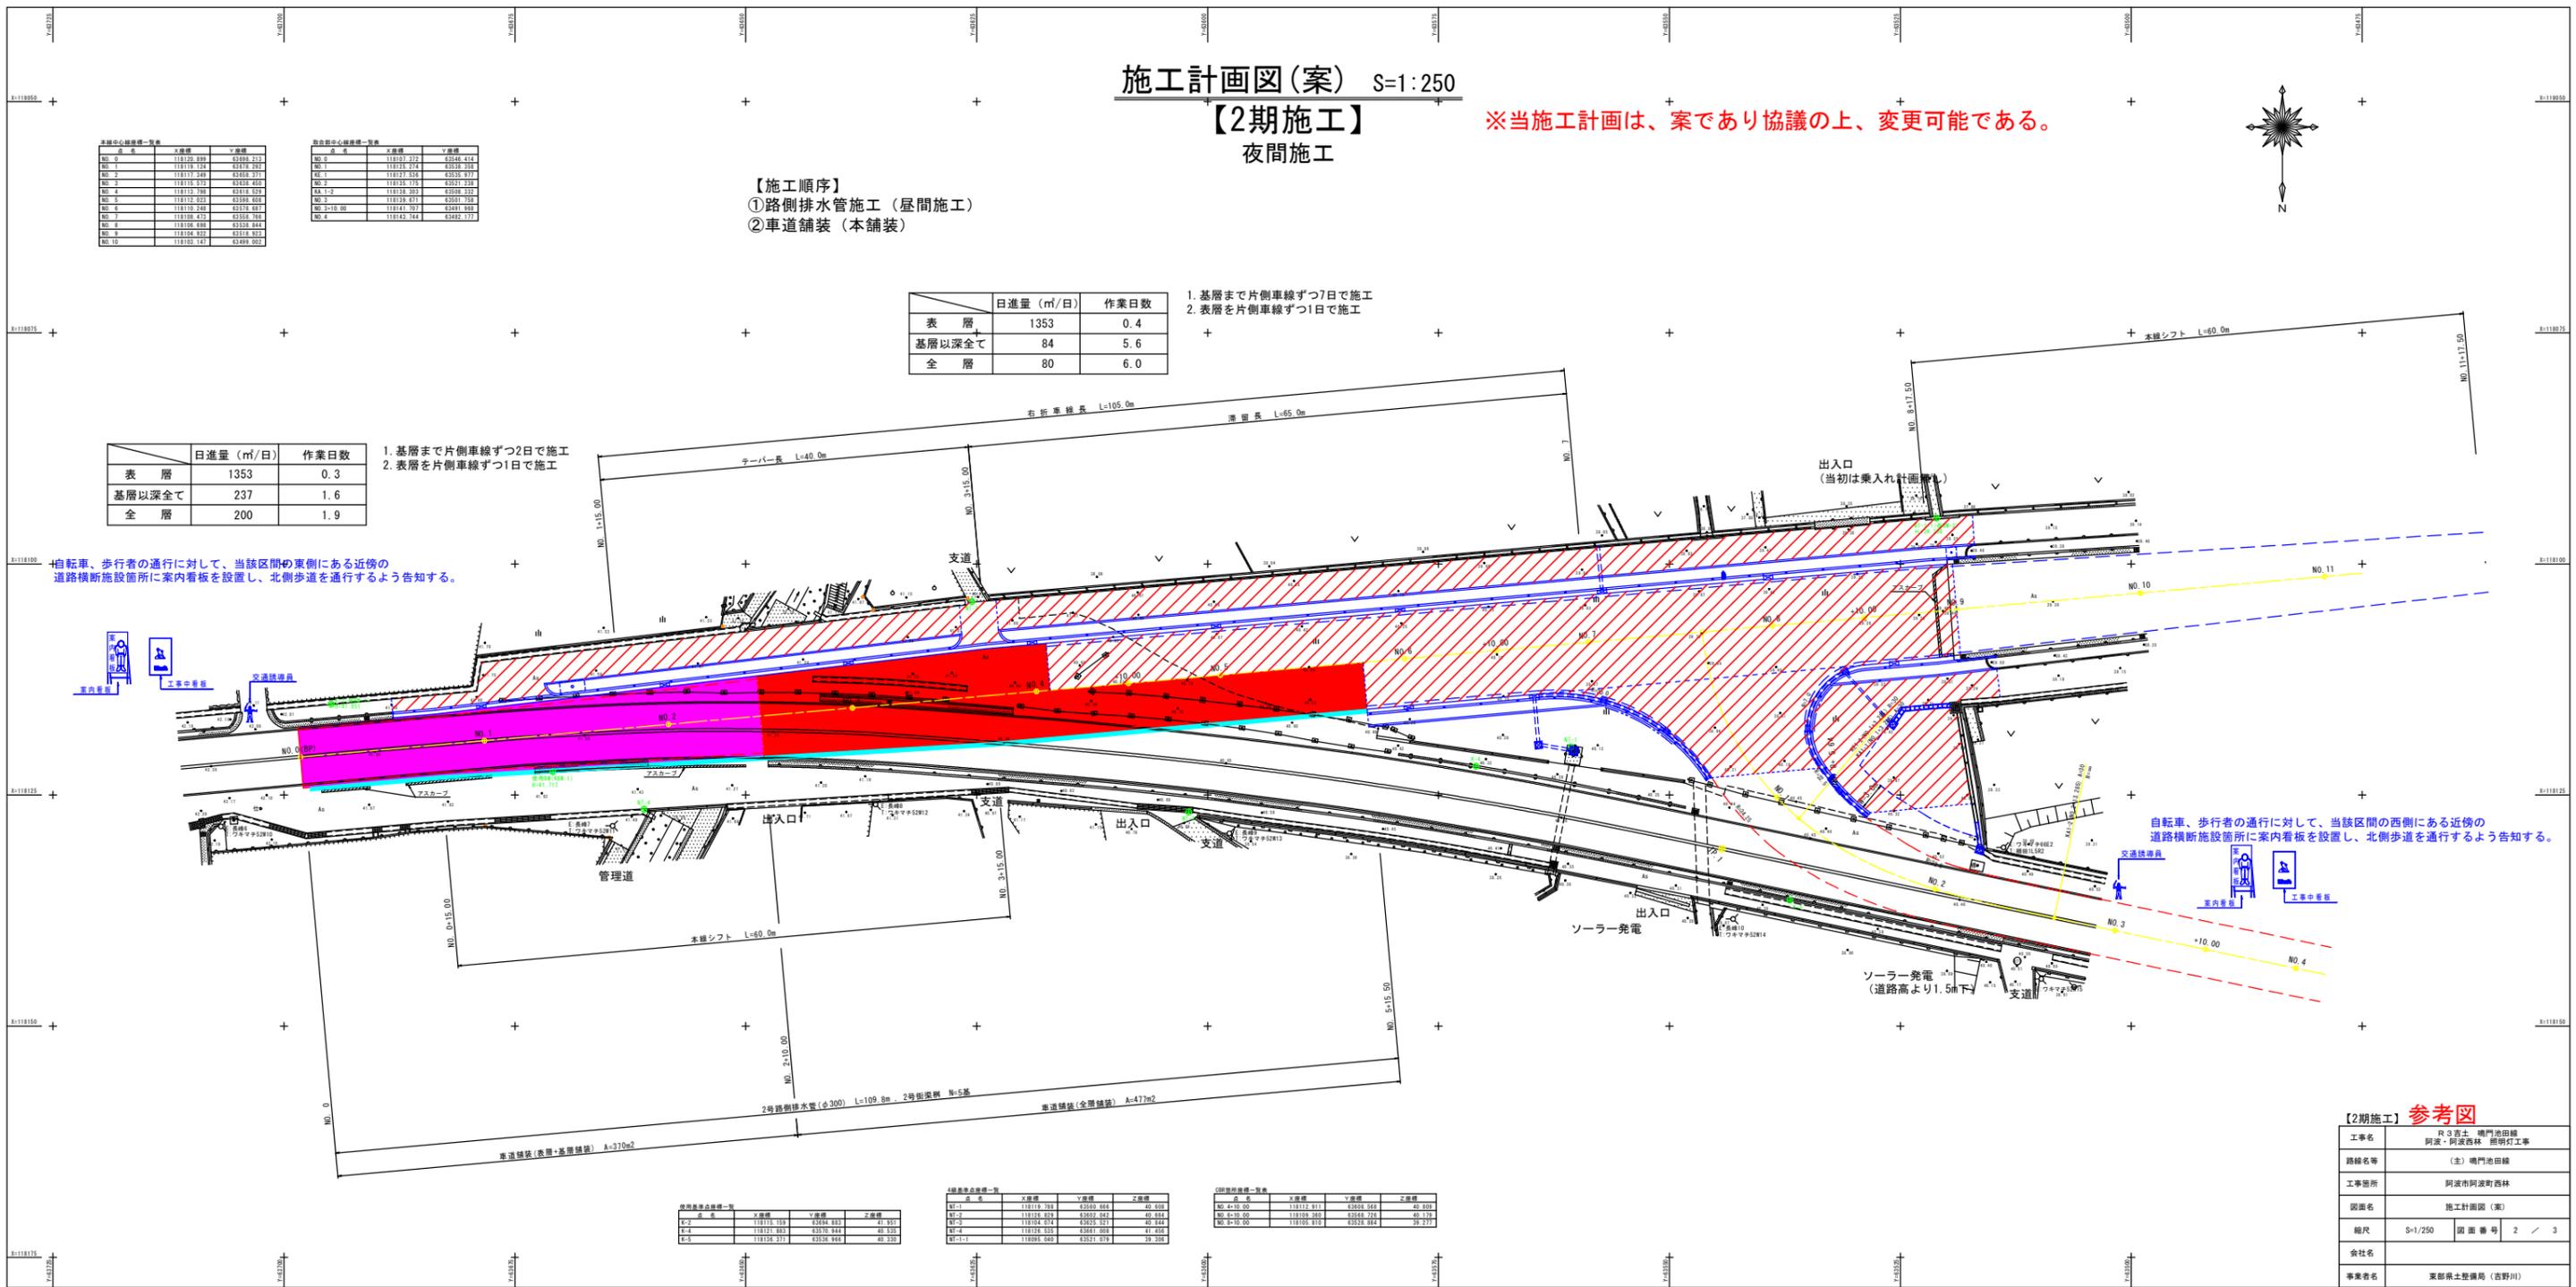

左側中心線位置一覧

点名	X座標	Y座標
NO.0	118115.109	43394.932
NO.1	118113.439	43386.021
NO.2	118111.664	43371.110
NO.3	118109.889	43362.200

右側中心線位置一覧

点名	X座標	Y座標
NO.0	118119.112	43454.884
NO.1	118117.442	43445.973
NO.2	118115.667	43431.062
NO.3	118113.892	43416.151
NO.4	118112.117	43401.240

2期中心線位置一覧

点名	X座標	Y座標
NO.0	118127.372	43548.414
NO.1	118126.274	43539.503
NO.2	118123.524	43528.592
NO.3	118121.175	43517.681
NO.4	118118.725	43506.770

【2期施工】 参考図

工事名	R3富士 境門池田線 阿波・阿波西線 照明灯工事		
路線名等	(主) 境門池田線		
工事箇所	阿波市阿波町西線		
図面名	施工計画図(案)		
縮尺	S=1/250	図番	2 / 3
会社名			
事業者名	東都県土整備局(吉野川)		

# 施工計画図(案) S=1:250 【3期施工】

※当施工計画は、案であり協議の上、変更可能である。

- 【施工順序】
- ①歩道、植樹帯、ガッター、擁壁
  - ②歩道舗装、旧鳴池線取合部舗装
  - ③区画線工

※迂回路として西側美馬市道に交通流を変えて施工。




区画番号	X座標	Y座標
NO.0	118120.000	43480.000
NO.1	118120.000	43480.000
NO.2	118120.000	43480.000
NO.3	118120.000	43480.000
NO.4	118120.000	43480.000
NO.5	118120.000	43480.000
NO.6	118120.000	43480.000
NO.7	118120.000	43480.000
NO.8	118120.000	43480.000
NO.9	118120.000	43480.000
NO.10	118120.000	43480.000

区画番号	X座標	Y座標
NO.0	118120.000	43480.000
NO.1	118120.000	43480.000
NO.2	118120.000	43480.000
NO.3	118120.000	43480.000
NO.4	118120.000	43480.000
NO.5	118120.000	43480.000
NO.6	118120.000	43480.000
NO.7	118120.000	43480.000
NO.8	118120.000	43480.000
NO.9	118120.000	43480.000
NO.10	118120.000	43480.000

自転車、歩行者の通行に対して、当該区間の東側にある近傍の道路横断施設箇所に案内看板を設置し、南側歩道を通行するよう告知する。



自転車、歩行者の通行に対して、当該区間の西側にある近傍の道路横断施設箇所に案内看板を設置し、南側歩道を通行するよう告知する。

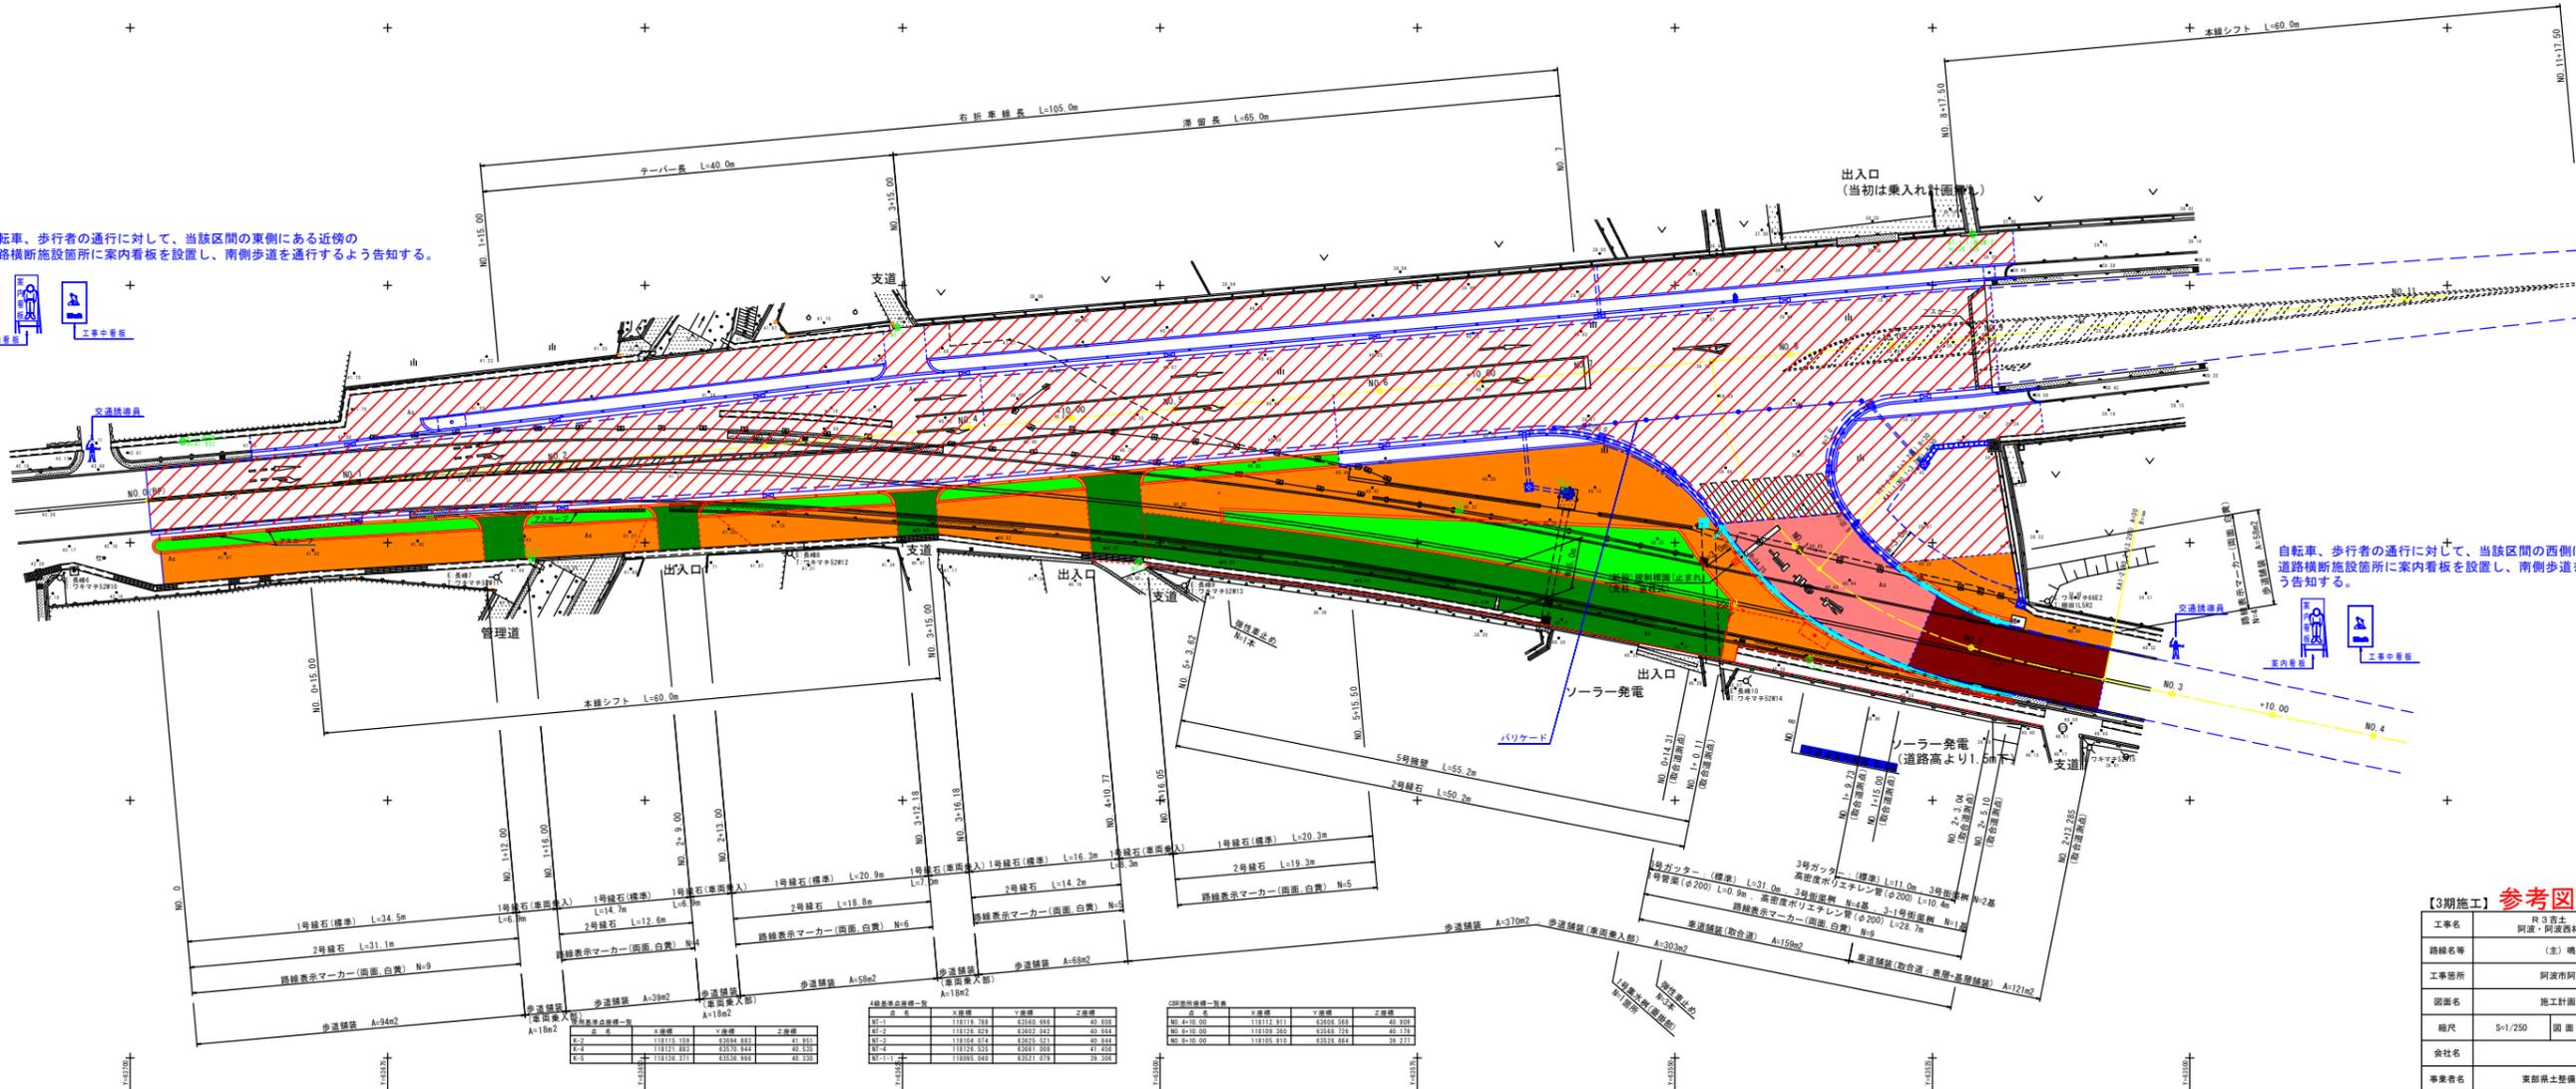

【3期施工】 参考図	
工事名	R3宮土 鳴門池田線 阿波・阿波西線 照明灯工事
路線名	(主) 鳴門池田線
工事箇所	阿波市阿波町西林
図面名	施工計画図(案)
縮尺	S=1/250 図番番号 3 / 3
会社名	
事業者名	東部県土整備局(吉野川)
