

見積参考資料

工事名 R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2 期 水路1工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	排水路工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局 (吉野川) 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)
施工場所	阿波市吉野町五条
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路２期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路２期 水路１工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	排水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1. 000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1. 000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1. 000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 準備費	1. 000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区	工事別課	37	37
工事名	R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事（担い手確保型）			

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 柵渠工	1.000	式		
・ ・ 柵渠水路工	1.000	式		
・ 水路付帯工	1.000	式		
・ ・ 排水路復旧工	1.000	式		
・ ・ 用水路復旧工	1.000	式		
・ ・ 碎石舗装工	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路２期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路２期 水路１工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
床掘り	351.000	m3			単A B単 1号
埋戻	309.000	m3			単A B単 2号
基面整正	400.000	m ²			単A B単 3号
掘削	48.000	m3			単A B単 4号
土砂等運搬 現場～仮置き場	742.000	m3			単A B単 5号
残土処理 運搬・処分	280.000	m3			単A B単 6号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し なし	59	m3			単A B単 7号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	59	m3			単A B単 8号
合 計					
・ 柵渠工	1.000	式			

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 柵渠水路工	1.000	式			
U型H鋼支柱工 B4.30～2.702×H1.45 100×100メッキ仕上	1.000	式			単A B単 9号
柵渠据付工	94.000	m			単A B単 10号
柵板 SB4	474.000	枚			単A B単 11号
柵板 UB20	145.000	枚			単A B単 12号
柵板 UB15	97.000	枚			単A B単 13号
柵板 CB20	27.000	枚			単A B単 14号
柵板 CB15	27.000	枚			単A B単 15号
吸い出し防止シート 合繊不織布, 厚10mm	290.000	m ²			単A B単 16号
コンクリート 18-8-40	36.000	m ³			単A B単 17号
基礎碎石	400.000	m ²			単A B単 18号
太鼓落とし	187.000	m			単A B単 19号
木杭打設工	128.000	本			単A B単 20号
合 計					
・ 水路付帯工	1.000	式			
・ 排水路復旧工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	3.700	m ³			単A B単 21号

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	22.000	m ²			単 A B 単 22 号
基礎碎石	6.000	m ²			単 A B 単 23 号
木杭打設工 松杭丸太, 長 1.5m, 末口 12cm	8.000	本			単 A B 単 24 号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ 200	12.800	m			単 A B 単 25 号
合 計					
・ ・ 用水路復旧工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	0.800	m ³			単 A B 単 26 号
型枠	4.100	m ²			単 A B 単 27 号
合 計					
・ ・ 碎石舗装工	1.000	式			
碎石舗装工	303.000	m ²			単 A B 単 28 号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工	1.000	式			
安定シート	717.000	m ²			単A B単 29号
敷鉄板 設置～賃料～撤去	373.000	m ²			単A B単 30号
合 計					
・ ・ 仮設排水工	1.000	式			
大型土のう 耐候性、製作・設置・撤去	7.000	袋			単A B単 31号
排水ポンプ 釜場設置・撤去	2.000	箇所			単A B単 32号
排水ポンプ 据付・撤去	2.000	箇所			単A B単 33号
排水ポンプ 運転、常時	2.000	箇所			単A B単 34号
仮設排水管設置・撤去 VU φ200	95.000	m			単A B単 35号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 古耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 73号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 78号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -	1.000	m3			S単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	土砂等運搬 現場～仮置き場		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	1.000	m3			S単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	残土処理 運搬・処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 73号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km	1.000	m3			S単 76号

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	以下					
	処分費 残土	1.000	m3			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費 無筋コンクリート殻	1.000	m3			S単 57号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下	1.000	m3			S単 79号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 9号 ***					
	U型H鋼支柱工 B4. 30～2. 702×H1. 45 100×100 ¹ / ₂ 仕上げ		式		1. 000 式	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 30×H1. 45 H100×H100,,	30. 000	本			S単 11号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 252×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 12号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 204×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 13号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 156×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 14号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 108×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 15号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 060×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 16号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 012×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 17号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 964×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 18号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 916×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 19号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 868×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 20号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 820×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 21号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 772×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 22号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 724×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 23号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 676×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 24号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 628×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 25号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 580×H1. 45 H100×H100,,	1. 000	本			S単 26号

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 532×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 27号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 484×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 28号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 436×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 29号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 388×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 30号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 340×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 31号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 292×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 32号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 244×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 33号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 196×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 34号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 148×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 35号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 100×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 36号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 052×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 37号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 004×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 38号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 956×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 39号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 908×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 40号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 860×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 41号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 812×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 42号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 764×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 43号
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 733×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 44号

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 702×H1. 45 H100×H100,,	1.000	本			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	柵渠据付工		m		1.000 m	当たり算出
	柵渠据付工	1.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	柵板 SB4		枚		1.000 枚	当たり算出
	高強度軽量柵渠 柵板 SB4 長1.5m,,	1.000	枚			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	柵板 UB20		枚		1.000 枚	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高強度軽量柵渠 柵板 UB20 長1.5m,,	1.000	枚			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	柵板 UB15		枚		1.000 枚	当たり算出
	高強度軽量柵渠 柵板 UB15 長1.5m,,	1.000	枚			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	柵板 CB20		枚		1.000 枚	当たり算出
	高強度軽量柵渠 柵板 CB20 長1.5m,,	1.000	枚			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	柵板 CB15		枚		1.000 枚	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高強度軽量柵渠 柵板 CB15 長1.5m,,	1.000	枚			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	吸い出し防止シート 合繊不織布, 厚10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²			S 単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40 (高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 81号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 19号 ***					
	太鼓落とし		m		4.000 m	当たり算出
	太鼓落とし 松 長4m 厚12cm,,	1.000	本			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 20号 ***					
	木杭打設工		本		1.000 本	当たり算出
	木杭打設工 松杭丸太, 長1.0m, 末口12cm	1.000	本			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 21号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C60%	1.000	m ³			S 単 84号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 82号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 81号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 24号 ***					
	木杭打設工 松杭丸太, 長1.5m, 末口12cm		本		1.000 本	当たり算出
	木杭打設工 松杭丸太, 長1.5m, 末口12cm	1.000	本			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 84号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 27号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 82号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	碎石舗装工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, なし, なし	1.000	m ²			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 70号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 30号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 126, 1, あり	1.000	m ²			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	大型土のう 耐候性・製作・設置・撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バック材, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, なし	1.000	袋			S単 63号
	大型土のう工 撤去, バック材, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), あり, なし	1.000	袋			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	排水ポンプ 釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 65号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所			S単 66号

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	排水ポンプ 据付・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり	1.000	箇所			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					
	排水ポンプ 運転、常時		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) , 常時排水, 6以上～30未満, 商用電源, あり	1.000	箇所			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	仮設排水管設置・撤去 VU φ200		m		1.000 m	当たり算出
	仮設排水路設置 VU φ200	1.000	m			T単 4号

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設排水路設置 VUφ200	0.500	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), ,	1.000	ton			S単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					
	混合廃棄物処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.000	m3			S単 77号
	処分費 混合廃棄物	1.000	m3			S単 58号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 2号 ***					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		1.000	日		<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単－ 3 号 ***					
	油圧ブレーカ		日		1.000 各単位	当たり算出
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	バケット容量0.4m3対応 アタッチメ・・・		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	油圧ブレーカ	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 4 号 ***					
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平・・・		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単－ 5号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 6号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 7号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 8号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 9号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 10 号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 11 号 ***					
	高強度軽量柵渠 U 型支柱 【暫定単価】		本		1.000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U 型支柱 【暫定単価】 B4.30×H1.45 H100×H100,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 30×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 252×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 252×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 204×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 204×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 14号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 156×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 156×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 15号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 108×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 108×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 16号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 060×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 060×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 17号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 012×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B4. 012×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 18号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 964×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 964×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 19号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 916×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 916×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 20号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 868×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 868×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 21号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 820×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 820×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 22号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 772×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 772×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 23号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 724×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱 【暫定単価】 B3. 724×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24 号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱 【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱 【暫定単価】 B3. 676×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱 【暫定単価】 B3. 676×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 25 号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱 【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱 【暫定単価】 B3. 628×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 628×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 26号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 580×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 580×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 27号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 532×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 532×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 28号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 484×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 484×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 29号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 436×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 436×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 30号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 388×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 388×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 31号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 340×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 340×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 32号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 292×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 292×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 33号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 244×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 244×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 34号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 196×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 196×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 35号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 148×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 148×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 36号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 100×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 100×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 37号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 052×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 052×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 38号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 004×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B3. 004×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 39号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 956×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 956×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 40号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 908×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 908×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 41号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 860×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 860×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 42号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 812×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 812×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 43号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 764×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 764×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 44号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 733×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 733×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 45号 ***					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】		本		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 702×H1. 45 H100×H100, ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 U型支柱【暫定単価】 B2. 702×H1. 45 H100×H100	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 46号 ***					
	軽油		L		1. 000 各単位	当たり算出
	軽油 ハートル給油,,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽油 ハートル給油	1. 000	L			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 47号 ***					
	高強度軽量柵渠 柵板		枚		1. 000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 柵板 SB4 長1. 5m,,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 柵板 SB4 長1.5m	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 48号 ***					
	高強度軽量柵渠 柵板		枚		1.000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 柵板 UB20 長1.5m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 柵板 UB20 長1.5m	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 49号 ***					
	高強度軽量柵渠 柵板		枚		1.000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 柵板 UB15 長1.5m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 柵板 UB15 長1.5m	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 50号 ***					
	高強度軽量柵渠 柵板		枚		1.000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 柵板 CB20 長1.5m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 柵板 CB20 長1.5m	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 51号 ***					
	高強度軽量柵渠 柵板		枚		1.000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 柵板 CB15 長1.5m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 柵板 CB15 長1.5m	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 52号 ***					
	太鼓落し		本		1.000 各単位	当たり算出
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 53号 ***					
	木杭		本		1.000 各単位	当たり算出
	木杭 松杭丸太,長1.0m,末口12cm,先端加工費含む,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	木杭 松杭丸太, 長1. 0m, 末口12cm, 先端加工費含む	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 54号 ***					
	木杭		本		1. 000 各単位	当たり算出
	木杭 松杭丸太, 長1. 5m, 末口12cm, 先端加工費含む,,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	木杭 松杭丸太, 長1. 5m, 末口12cm, 先端加工費含む	1. 000	本			
	合 計					算出数量 1. 000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 55号 ***					
	土壌分析試験費		式		1. 000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 29項目, 銅含む), ,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 29項目, 銅含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 56号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 残土			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	残土		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力					
	処分費 残土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 57号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 無筋コンクリート殻			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	無筋コンクリート殻		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力					
	処分費 無筋コンクリート殻	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 58 号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 混合廃棄物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	混合廃棄物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力					
	処分費 混合廃棄物	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 59 号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価		人			
	*** S 単 - 60号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 作業区分	無筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 施工区分 I	機械				
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 61号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 管種区分	VP		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 管径区分 (mm)	200mm		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 62号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	なし					
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン				
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価 0 円区分(舗設材)	なし				

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.600	m3			
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.960	人			
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]	3.800	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	22.000	L			
	運転手 (特殊)	0.650	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 63号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.040				
	耐候性大型土のう袋	36.000	枚			
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	1.390	日			<賃料>
	軽油					
	ハトロール給油	104.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 36.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 64号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), あり, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	撤去 バックホウ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり) 5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分 7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋 (1年対応) あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	1.260	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	78.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 144.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単一 65号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.130				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	0.570	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.100	人			
	軽油 ハートル給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** S 単－ 66号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	釜場埋戻・撤去			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.050	人			
	普通作業員	0.190	人			
	諸雑費	0.030				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	0.370	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.060	人			
	軽油					
	ハートル給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単－ 67号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転 (小口径) 、常時排水, 6以上～30未満, 商用電源, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 運転日数 2) 排水方法	常時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	6以上～30未満 商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	2,650.000	kWh			
	特殊作業員	6.500	人			
	諸雑費	0.170				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単 - 68号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	1.000	人			
	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	0.500	日			<賃料>
	運転手 (特殊)	0.340	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区					
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	21.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 69号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 126, 1, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 126		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 70号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材 (マット・シート類)		104.000 m ²			
	普通作業員		0.480 人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 71号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸)				

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10) 深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 72号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準以外, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外 (小規模)				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	- -				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	標準以外 -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 73号 ***					
	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区				
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 74号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単ー 75号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バック山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 0.2km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 76号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 77号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 78号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	基面整正			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 79号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	5.7km以下				

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ³			
	*** S 単－ 80号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 吸出し防止材設置 全面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 81号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0 40～0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 82号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 83号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40 (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 84号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単－ 1 号 ***					
	木杭打設工		本		32.000 本	当たり算出
	松杭丸太, 長1.0m, 末口12cm					
	木杭 松杭丸太, 長1.0m, 末口12cm, 先端加工費含む,,	32.000	本			[1] S 単 53号
	土木一般世話役	1.000	人			[2] S 単 5号
	普通作業員	2.000	人			[3] S 単 7号
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.100	日			[4] S 単 3号
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.100	日			[5] S 単 4号
	軽油 ハートル給油,,	37.000	L			[6] S 単 46号
	運転手 (特殊)	1.000	人			[7] S 単 59号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7])	0.030				
	合 計					算出数量 32.000 本
	単 価		本			
	*** T 単－ 2 号 ***					
	木杭打設工		本		32.000 本	当たり算出
	松杭丸太, 長1.5m, 末口12cm					
	木杭 松杭丸太, 長1.5m, 末口12cm, 先端加工費含む,,	32.000	本			[1] S 単 54号

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路 2 期地区
工事名	R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	1.000	人			[2] S 単 5号
	普通作業員	2.000	人			[3] S 単 7号
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.100	日			[4] S 単 3号
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.100	日			[5] S 単 4号
	軽油 ハートル給油,,	37.000	L			[6] S 単 46号
	運転手 (特殊)	1.000	人			[7] S 単 59号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7])	0.030				
	合 計					算出数量 32.000 本
	単 価		本			
	*** T 単 - 3号 ***					
	柵渠据付工		m		23.400 m	当たり算出
	土木一般世話役	1.000	人			S 単 5号
	特殊作業員	1.000	人			S 単 6号
	普通作業員	2.000	人			S 単 7号
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.600	日			S 単 2号
	運転手 (特殊)	1.000	人			S 単 59号

事業名	農業水利施設保全対策事業 古毛川排水路2期地区
工事名	R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事(担い手確保型)

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
高強度軽量柵渠	U型支柱 B4.30×H1.45 H100×100	本	87,500	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B4.252×H1.45 H100×100	本	87,000	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B4.204×H1.45 H100×100	本	86,400	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B4.156×H1.45 H100×100	本	85,800	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B4.108×H1.45 H100×100	本	85,300	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B4.060×H1.45 H100×100	本	84,700	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B4.012×H1.45 H100×100	本	84,100	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.964×H1.45 H100×100	本	83,600	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.916×H1.45 H100×100	本	83,000	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.868×H1.45 H100×100	本	82,400	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.820×H1.45 H100×100	本	81,900	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.772×H1.45 H100×100	本	81,300	【暫定単価】

見積単価一覧表

工事名	R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.724×H1.45 H100×100	本	80,700	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.676×H1.45 H100×100	本	80,200	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.628×H1.45 H100×100	本	79,600	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.580×H1.45 H100×100	本	79,000	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.532×H1.45 H100×100	本	78,500	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.484×H1.45 H100×100	本	77,900	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.436×H1.45 H100×100	本	77,300	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.388×H1.45 H100×100	本	76,800	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.340×H1.45 H100×100	本	76,200	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.292×H1.45 H100×100	本	75,600	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.244×H1.45 H100×100	本	75,100	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.196×H1.45 H100×100	本	74,500	【暫定単価】

見積単価一覧表

工事名	R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.148×H1.45 H100×100	本	73,900	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.100×H1.45 H100×100	本	73,300	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.052×H1.45 H100×100	本	72,800	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B3.004×H1.45 H100×100	本	72,200	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B2.956×H1.45 H100×100	本	71,600	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B2.908×H1.45 H100×100	本	71,100	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B2.860×H1.45 H100×100	本	70,500	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B2.812×H1.45 H100×100	本	69,900	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B2.764×H1.45 H100×100	本	69,400	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B2.733×H1.45 H100×100	本	69,000	【暫定単価】
高強度軽量柵渠	U型支柱 B2.702×H1.45 H100×100	本	68,600	【暫定単価】
処分費	残土	m3	990	運搬距離 L=32.6km

見積単価一覧表

工事名	R7吉耕 長寿命化 古毛川排水路2期 水路1工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,100	運搬距離 L=5.5km
処分費	混合廃棄物	m3	12,000	運搬距離 L=5.0km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	106,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	

古毛川排水路		数 量 総 括 表－１				
工 種	名 称	規 格	単位	算 式	数 量	備 考
土 工	【1.0式当たり】					
(水路)	床堀(機械)	土砂	m3	土工集計表参照	351	
	埋戻(機械)	良質土(現場発生土)	m3	"	309	
	基面整正		m2	"	400	柵渠数量表参照
	掘削(機械)	土砂	m3	"	48	
	土砂運搬	現場～仮置き場(往・復)	m3	"	742	
	残土処分	土砂	m3	"	280	
	混合廃棄物処分		m3	"	13.5	
	コンクリート構造物取壊工	無筋構造物	m3	土工集計表参照	58.8	
	産業廃棄物処理工	無筋コンクリート殻	m3	"	58.8	
柵渠水路工						
	柵渠据付		m	柵渠数量表参照	93.7	
	U型H鋼支柱	B4. 30×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	30.0	
	"	B4. 252×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B4. 204×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B4. 156×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B4. 108×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B4. 060×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B4. 012×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 964×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 916×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 868×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 820×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 772×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 724×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 676×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 628×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 580×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	

古毛川排水路		数 量 総 括 表-2				
工 種	名 称	規 格	単位	算 式	数 量	備 考
柵渠水路工						
	U型H鋼支柱	B3. 532×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	柵渠数量表参照	1.0	
	"	B3. 484×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 436×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 388×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 340×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 292×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 244×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 196×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 148×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 100×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 052×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B3. 004×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B2. 956×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B2. 908×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B2. 860×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B2. 812×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B2. 764×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B2. 733×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	
	"	B2. 702×H1. 45 (100×100メッキ仕上)	本	"	1.0	

古毛川排水路		数 量 総 括 表－3				
工 種	名 称	規 格	単位	算 式	数 量	備 考
柵渠水路工						
	柵板 SB-4	(1480×298×100)	枚		474.0	
	柵板 UB-20	(1480×198×60)	枚		89.0	
	〃	(950×198×60)	枚		28.0	
	〃	(830×198×60)	枚		28.0	
	柵板 UB-15	(1480×140×60)	枚		89.0	
	〃	(950×140×60)	枚		4.0	
	〃	(830×140×60)	枚		4.0	
	柵板 CB-20	(1480×198×100)	枚		27.0	
	柵板 CB-15	(1480×140×100)	枚		27.0	
	底張コンクリート	幅4.3m×高さ0.1m	m3		18.8	延長43.700m
	底張コンクリート	平均 幅3.5m×高さ0.1m	m3		17.5	延長50.000m
	基礎碎石 t=150mm	幅4.70m	m2		205.4	延長43.700m
	基礎碎石 t=150mm	平均 幅3.90m	m2		195.0	延長50.000m
	吸出防止シート		m2		290.0	
	太鼓落とし	松 厚12cm	m		187.4	
	松杭	松丸太 長1m、末口12cm	本		128.0	

古毛川排水路		数 量 総 括 表－4				
工 種	名 称	規 格	単位	算 式	数 量	備 考
排水路復旧工	コンクリート	18-8-40、無筋構造物	m3		3.7	
	型枠	無筋構造物	m2		22.3	
	基礎材	RC-40、t=15cm	m2		6.0	
	松杭	φ120 L=1.5m	本		8.0	
	塩ビ管	VP200	m		12.8	
	碎石舗装工	RC-40、t=10cm	m2		302.7	
用水路復旧工	コンクリート	18-8-40、無筋構造物	m3		0.8	
	型枠	無筋構造物	m2		4.1	
仮設工	【1.0式当たり】					
	土木安定シート		m2		717.0	
	敷鉄板	t=22	m2		372.9	
	大型土のう		袋		7.0	
	水替え工	水中ポンプ10m以下	式		1.0	
	仮設排水管	VU φ200	m		95.0	

土工集計表

[illegible]

【左岸側土工】土積計算書-2-1

（左岸側土工）		コンクリート取壊			床 掘			埋 戻								
測 点	L	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積						
No. 43+6.30		0.34			1.7			1.6								
No. 44	43.7	0.33	0.335	14.6	1.8	1.75	76.5	1.6	1.60	69.9						
No. 45	50.0	0.24	0.285	14.3	1.7	1.75	87.5	1.6	1.60	80.0						
				(m3)			(m3)			(m3)						
合 計	93.7			28.90			164.0			149.9						

【右岸側土工】土積計算書-2-2

(右岸側土工)		コンクリート取壊			床 掘			埋 戻			掘 削					
測 点	L	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積			
No. 43+6.30		0.32			2.1			1.7			0.3					
No. 44	43.7	0.35	0.335	14.6	2.0	2.050	89.6	1.7	1.700	74.3	0.5	0.400	17.5			
No. 45	50.0	0.23	0.290	14.5	1.9	1.950	97.5	1.7	1.700	85.0	0.7	0.600	30.0			
				(m3)			(m3)			(m3)			(m3)			
合 計	93.7			29.10			187.10			159.30			47.50			

柵渠数量表

U型 H鋼製支柱(100×100)

※本数は軽量柵渠割付図(2)を参照

右岸高(m)	左岸高(m)	加工幅(m)	本数	重量(kg)	番号	摘 要
1.45	1.45	4.300	30	3751.800	236～265	
1.45	1.45	4.252	1	124.249	266	
1.45	1.45	4.204	1	123.438	267	
1.45	1.45	4.156	1	122.626	268	
1.45	1.45	4.108	1	121.815	269	
1.45	1.45	4.060	1	121.004	270	
1.45	1.45	4.012	1	120.193	271	
1.45	1.45	3.964	1	119.382	272	
1.45	1.45	3.916	1	118.570	273	
1.45	1.45	3.868	1	117.759	274	
1.45	1.45	3.820	1	116.948	275	
1.45	1.45	3.772	1	116.137	276	
1.45	1.45	3.724	1	115.326	277	
1.45	1.45	3.676	1	114.514	278	
1.45	1.45	3.628	1	113.703	279	
1.45	1.45	3.580	1	112.892	280	
1.45	1.45	3.532	1	112.081	281	
1.45	1.45	3.484	1	111.270	282	
1.45	1.45	3.436	1	110.458	283	
1.45	1.45	3.388	1	109.647	284	
1.45	1.45	3.340	1	108.836	285	
1.45	1.45	3.292	1	108.025	286	
1.45	1.45	3.244	1	107.214	287	
1.45	1.45	3.196	1	106.402	288	
1.45	1.45	3.148	1	105.591	289	
1.45	1.45	3.100	1	104.780	290	
1.45	1.45	3.052	1	103.969	291	
1.45	1.45	3.004	1	103.158	292	
1.45	1.45	2.956	1	102.346	293	
1.45	1.45	2.908	1	101.535	294	
1.45	1.45	2.860	1	100.724	295	
1.45	1.45	2.812	1	99.913	296	
1.45	1.45	2.764	1	99.102	297	
1.45	1.45	2.733	1	98.578	298	
1.45	1.45	2.702	1	98.054	299	
合計			64	7522.039		

底張コンクリート

※延長(m)は中心距離より算出

幅(m)	高さ(m)	延長(m)	数量(m ³)	摘 要
4.300	0.100	43.700	18.8	18-8-40 (No.43+6.30～No.44 L=43.70)
3.500	0.100	50.000	17.5	18-8-40 (No.44～No.45 L=50.00)
合 計			36.3	

基礎砕石

※延長(m)は中心距離より算出

幅(m)	延長(m)	数量(m ²)	摘 要
4.70	43.700	205.4	(No.43+6.30～No.44 L=43.70)
3.90	50.000	195.0	(No.44～No.45 L=50.00)
合 計		400.4	

太鼓落とし

※H鋼支柱(本)は軽量柵渠割付図より算出

	延長(m)	数量(m)	摘 要
左岸側	93.7	93.7	
右岸側	93.7	93.7	
合 計		187.4	

松杭

※H鋼支柱(本)は軽量柵渠割付図より算出

	本	数量(本)	摘 要
左岸側	64.0	64.0	
右岸側	64.0	64.0	
合 計		128.0	

吸出防止シート

柵板面積 (m ²)	規格	数量(m ²)	摘 要
左岸側		145.0	
右岸側		145.0	
合 計		290.0	

柵板数量集計表
左岸柵板数量計算書

[illegible]

右岸側数量集計表

[illegible]

柵板数量集計表
右岸柵板数量計算書

[illegible]


コンクリート擁壁・付帯工数量総括表

名 称	規格	算 式	数 量	備 考
【排水路復旧工】 コンクリート	18-8-40			
2号擁壁			1.20 m3	2箇所
3号擁壁			1.90 m3	2箇所
耕地排水桝			0.60 m3	2箇所
		計	3.70 m3	
型枠				
2号擁壁			5.90 m2	
3号擁壁			8.50 m2	
耕地排水桝			7.90 m2	
		計	22.30 m2	
基礎材	t=15cm			
2号擁壁			2.10 m2	
3号擁壁			2.60 m2	
耕地排水桝			1.30 m2	
		計	6.00 m2	
松杭				
2号擁壁			4.00 本	
3号擁壁			4.00 本	
		計	8.00 本	
【耕地排水管】		※耕地排水管・柵渠接続標準図参照		
塩ビ管	VP φ200	2.0+4.3+1.6+4.9=	12.8 m	
碎石舗装工	RC-40 t=10cm		302.7 m2	
【用水路復旧工】 コンクリート	18-8-40		0.79 m3	
型枠			4.05 m2	

【右岸側表土・仮設道路盛土】土積計算書

(右岸側表土・仮設道路盛土)		碎石舗装						
測 点	L	施工幅	平均幅	断 面				
No. 43+8.0		3.10						
No. 44	42.0	3.10	3.100	130.2				
No. 45	50.0	3.80	3.450	172.5				
小計	92.0			302.7				
				(m ²)				
合 計	92.00			302.70				

2号コンクリート擁壁

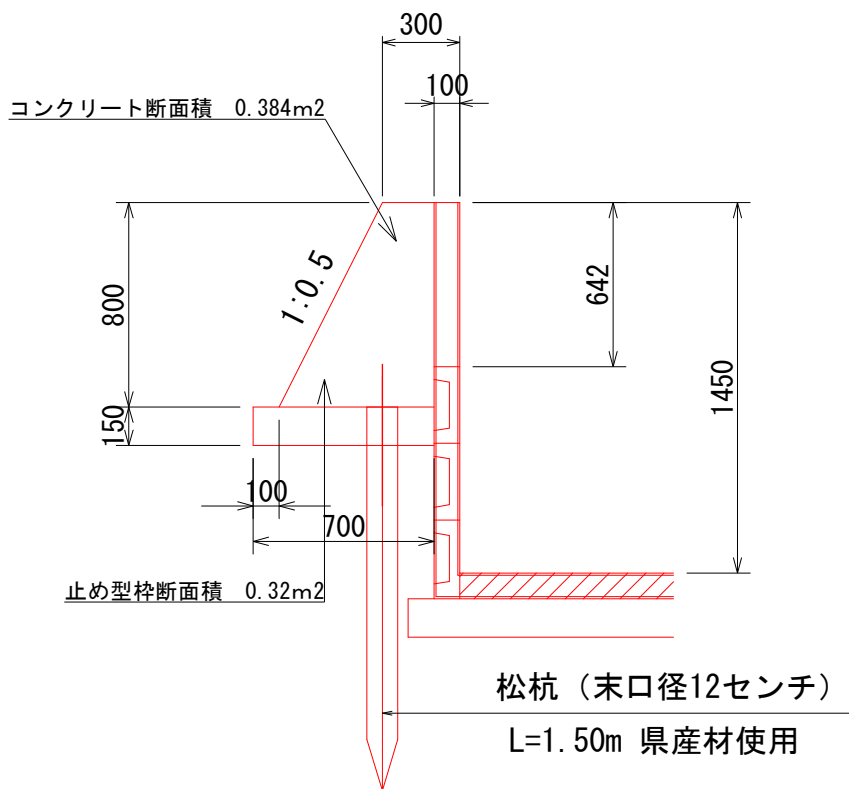

2号コンクリート擁壁


(1.0箇所当たり)

名 称	規 格	算 式	数 量	備 考
コンクリート	18-8-40	$0.384 \times 1.5 =$	0.576 m ³	キャドにて計測
型枠	(無筋)	$(0.64 + 0.8 \times 1.118) \times 1.5 + 0.32 \times 2 =$	2.94 m ²	
基礎材	t=15cm	$0.7 \times 1.5 =$	1.05 m ²	
松杭	φ120 L=1.5m		2.0 本	
		※ $\sqrt{1 + 0.5^2} = 1.118$		

2号コンクリート擁壁 N=2箇所

名 称	規 格	算 式	数 量	備 考
コンクリート	18-8-40		1.2 m ³	
型枠			5.9 m ²	
基礎材	t=15cm		2.1 m ²	
松杭	φ120 L=1.5m		4.0 本	

3号コンクリート擁壁

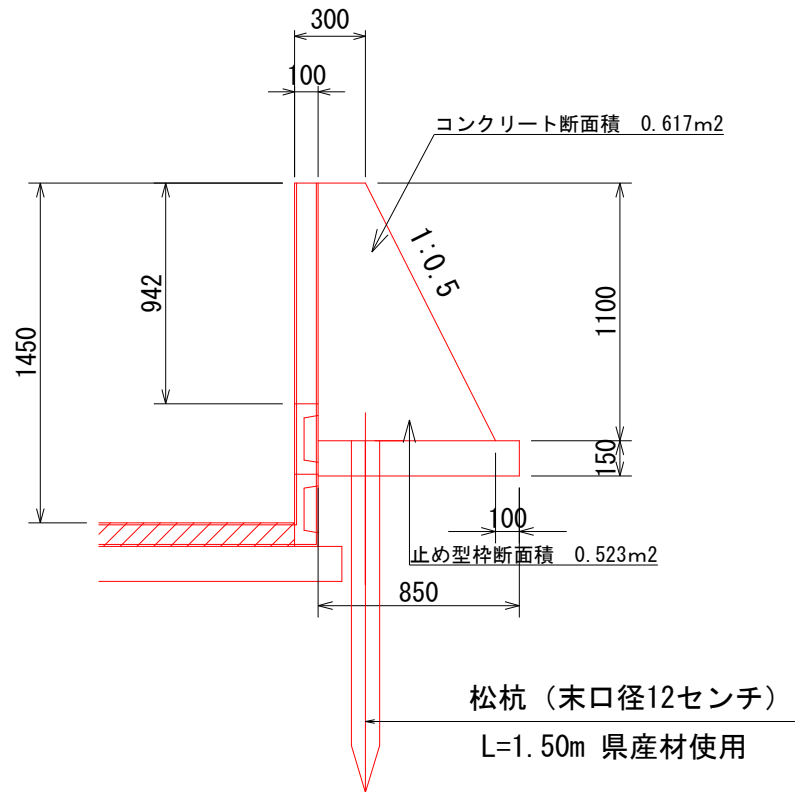

3号コンクリート擁壁



(1.0箇所当たり)

名 称	規 格	算 式	数 量	備 考
コンクリート	18-8-40	$0.617 \times 1.5 =$	0.926 m ³	キャドにて計測
型枠	(無筋)	$(0.9 + 1.1 \times 1.118) \times 1.5 + 0.523 \times 2 =$	4.24 m ²	
基礎材	t=15cm	$0.85 \times 1.5 =$	1.28 m ²	
松杭	φ120 L=1.5m		2.0 本	
		※ $\sqrt{1 + 0.5^2} = 1.118$		

3号コンクリート擁壁 N=2箇所

名 称	規 格	算 式	数 量	備 考
コンクリート	18-8-40		1.9 m ³	
型枠			8.5 m ²	
基礎材	t=15cm		2.6 m ²	
松杭	φ120 L=1.5m		4.0 本	

耕地排水柵数量計算書

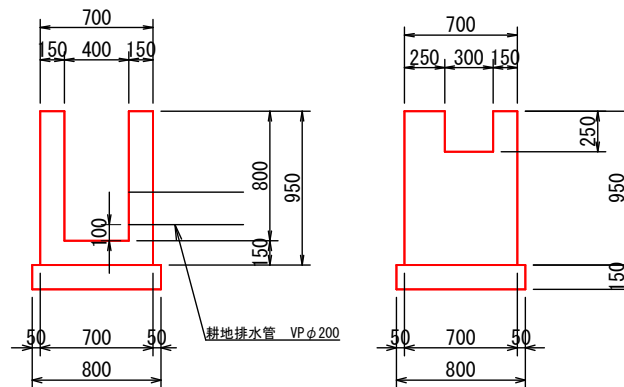

耕地排水柵数量計算書

(1.0箇所当たり)

名 称	規 格	算 式	数 量	備 考
コンクリート	18-8-40	底版: $0.7 \times 0.7 \times 0.15 =$	0.074 m ³	
	側壁	$(0.7 + 0.4) \times 0.15 \times 0.8 \times 2 =$	0.264 m ³	
	側壁控除	$-0.3 \times 0.25 \times 0.15 \times 2 =$	-0.023 m ³	
	側壁控除	$-\pi/4 \times 0.22^2 \times 0.15 =$	-0.006 m ³	
		計	0.31 m ³	
型枠	内側	$0.4 \times 0.8 \times 4 =$	1.28 m ²	
	外側	$0.7 \times 0.95 \times 4 =$	2.66 m ²	
		計	3.94 m ²	
基礎材	t=15cm	$0.8 \times 0.8 =$	0.64 m ²	

耕地排水柵数量 N=2箇所

名 称	規 格	算 式	数 量	備 考
コンクリート	18-8-40		0.6 m ³	
型枠			7.9 m ²	
基礎材	t=15cm		1.3 m ²	

Technical drawing of a river restoration project. The drawing shows a plan view of a river channel with various structures and labels. Key labels include 'H25基11-5 H=9.648', 'BC 12', 'No. 40', 'SP. 12-L', 'TB. 31', 'TP. 12', '掛樋復旧', and '用水路復旧'. Elevation points are marked along the channel. A red line indicates the '用水路復旧' (waterway restoration) area. To the right, a cross-section diagram shows a rectangular structure with dimensions: width 0.75, depth 0.40, and a top section width 0.25.

[illegible]

仮設工数量計算書(1/3)

[illegible]

仮設工数量計算書(2/3)

[illegible]

仮設工数量計算書(3/3)

[illegible]
