

見積参考資料

工事名 R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工 事(企育)

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(1)
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	吉野川農林事務所 農村整備
事業名	基幹農道整備事業
地区名	忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事（企育）
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】 R8.5.1～
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式		
7 ・間接工事費				
8 ・・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費(率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 橋梁上部工	1.000	式		
・ ・ RC床版工	1.000	式		
・ ・ 支承工	1.000	式		
・ ・ 架設支保工	1.000	式		
・ 護岸工	1.000	式		
・ ・ 護岸工	1.000	式		
・ ・ 護床工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 橋梁上部工	1.000	式			
・ ・ RC床版工	1.000	式			
床版コンクリート σ ck=24kN/mm2	84.000	m3			単A B単 1号
調整コンクリート σ ck=24kN/mm2	2.500	m3			単A B単 2号
型枠 鉄筋構造物	115.000	m ²			単A B単 3号
型枠 調整コンクリート	0.300	m ²			単A B単 4号
埋設型枠 床版	30.000	m ²			単A B単 5号
埋設型枠 調整コンクリート	2.300	m ²			単A B単 6号
鉄筋 SD345 D13	0.917	ton			単A B単 7号
鉄筋 SD345 D16	1.973	ton			単A B単 8号
鉄筋 SD345 D19	0.824	ton			単A B単 9号
鉄筋 SD345 D29	2.176	ton			単A B単 10号
鉄筋 SD345 D32	5.606	ton			単A B単 11号
ガス圧接 D29	41.000	箇所			単A B単 12号
ガス圧接 D32	81.000	箇所			単A B単 13号
水切り材設置	20.000	m			単A B単 14号
合 計					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 支承工	1.000	式			
簡易ゴム支承 150×23	20.000	m			単A B単 15号
防蝕アンカー装置 F46D×980	12.000	組			単A B単 16号
防蝕アンカー装置 M42D×900	10.000	組			単A B単 17号
沓座モルタル 無収縮性	0.400	m ³			単A B単 18号
アンカー孔モルタル 無収縮性	0.200	m ³			単A B単 19号
沓座補強鉄筋 鉄筋金網 D10×50×50(SD345)	0.124	ton			単A B単 20号
アイボルト M12	11.000	本			単A B単 21号
合 計					
・ ・ 架設支保工	1.000	式			
くさび式支保工	689.000	空m ³			単A B単 22号
合 計					
・ 護岸工	1.000	式			
・ ・ 護岸工	1.000	式			
ブロック積擁壁 練積 (裏込メなし) 、18-8-40 控え35cm	58.000	m ²			単A B単 23号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
裏込材 RC-40	21.000	m3			単A B単 24号
埋戻コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	3.000	m3			単A B単 25号
目地材 瀝青質 t=10mm	1.200	m ²			単A B単 26号
単管傾斜足場	60.000	掛m ²			単A B単 27号
天端コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	1.200	m3			単A B単 28号
張コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=100mm	0.500	m3			単A B単 29号
基礎碎石 RC-40 t=150mm	5.100	m ²			単A B単 30号
合 計					
・ ・ 護床工	1.000	式			
護床コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	11.000	m3			単A B単 31号
型枠	36.000	m ²			単A B単 32号
吸出し防止マット	31.000	m ²			単A B単 33号
合 計					
・ ・ 作業土工	1.000	式			
掘削工 土砂	33.000	m3			単A B単 34号
掘削工 軟岩	9.300	m3			単A B単 35号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
仮設盛土	162.000	m ³			単A B単 39号
仮設盛土撤去・処分	179.000	m ³			単A B単 40号
合 計					
・ ・ 敷鉄板	1.000	式			
敷鉄板	87.000	m ²			単A B単 41号
合 計					
・ ・ 大型土のう工	1.000	式			
大型土のう設置・撤去	19.000	袋			単A B単 42号
合 計					
・ ・ 仮設水路工	1.000	式			
高密度ポリエチレン管設置・撤去工 (仮設計上)	18.000	m			単A B単 43号
合 計					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	床版コンクリート σck=24kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
	調整コンクリート σck=24kN/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約25m以下、水平距離約 18m以下,なし,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単- 4号 ***					
	型枠 調整コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	埋設型枠 床版		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
	埋設型枠 調整コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 39号
	合 計					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	鉄筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,橋梁用床版,D13,SD345,なし	1.000	ton			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	鉄筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,橋梁用床版,D16,SD345,なし	1.000	ton			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	鉄筋 SD345 D19		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,橋梁用床版,D19,SD345,なし	1.000	ton			S単 47号
	合 計					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	鉄筋 SD345 D29		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工・組立 SD345 D29 橋梁用床版	1.000	ton			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	鉄筋 SD345 D32		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工・組立 SD345 D32 橋梁用床版	1.000	ton			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	ガス圧接 D29		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	鉄筋工 (ガス圧接継手・機械式継手) ガス圧接, 29～32	1.000	箇所			S単 48号
	合 計					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	ガス圧接 D32		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	鉄筋工(ガス圧接継手・機械式継手) ガス圧接,29～32	1.000	箇所			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	水切り材設置		m		1.000 m	当たり算出
	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定式 床版下面 材料含む,,	1.000	m			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	簡易ゴム支承 150×23		m		1.000 m	当たり算出
	簡易ゴム支承設置工	1.000	m			T単 3号
	橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm,,	1.000	枚			S単 11号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	防蝕アンカー装置 F46D×980		組		1.000	組 当たり算出
	防蝕アンカー装置 F46D×980,,	1.000	組			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	防蝕アンカー装置 M42D×900		組		1.000	組 当たり算出
	防蝕アンカー装置【暫定単価】 M42D×900,,	1.000	組			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	沓座モルタル 無収縮性		m3		1.000	m3 当たり算出
	無収縮モルタル ,,	1.000	m3			S単 14号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 19号 ***					
	アンカー孔モルタル 無収縮性		m3		1.000 m3	当たり算出
	無収縮モルタル ,,	1.000	m3			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 20号 ***					
	杏座補強鉄筋 鉄筋金網 D10×50×50(SD345)		ton		1.000 ton	当たり算出
	杏座補強鉄筋 鉄筋金網 D10×50×50mm,,	1.000	ton			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 21号 ***					
	アイボルト M12		本		1.000 本	当たり算出
	アイボルト M12,,	1.000	本			S単 16号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	くさび式支保工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/m ² 以下,あり	1.000	空m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	ブロック積擁壁 練積(裏込コなし), 18-8-40 控え35cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コなし),無し,昼間施工,0,18-8-40 (高炉B)	1.000	m ²			S単 21号
	コンクリート積ブロック A種 控え35cm,,	8.300	個			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	裏込材 RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り	1.000	m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 25号 ***					
	埋戻コンクリート σck=18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 26号 ***					
	目地材 瀝青質 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 27号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単管傾斜足場		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 28号 ***					
	天端コンクリート σ ck=18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約 17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 29号 ***					
	張コンクリート σ ck=18N/mm ² t=100mm		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約 17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 43号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 30号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 31号 ***					
	護床コンクリート σ ck=18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 32号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	吸出し防止マット		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					
	掘削工 土砂		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	掘削工 軟岩		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オフソカット,-,無し,1,000m ³ 未満,-,有り(50,000m ³ 未満),無し	1.000	m ³			S単 30号
	合 計					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					
	盛土工 1.0≦W<2.5		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 33号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｬﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5 km以下	1.000	m3			S単 32号
	残土処分費 残土処分費	1.000	m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 39号 ***					
	仮設盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 31号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 40号 ***					
	仮設盛土撤去・処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 31号
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｬﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5 km以下	1.000	m3			S単 32号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	残土処分費					
	残土処分費	1.000	m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 41号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62,1,なし	1.000	m ²			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					
	大型土のう設置・撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレーン,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0 t 用) ,なし,なし	1.000	袋			S単 24号
	大型土のう工 撤去,ラフレックレーン,0m3,なし	1.000	袋			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 43号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		1.600	日			
	軽油					
	ハートロー給油	17.000	L			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード					
	2)機械器具規格	最大吊上能力25t吊				
	3)単価の入力					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)]					<賃料>
		1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
	鉄筋工		人		1.000 人	当たり算出
	鉄筋工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 鉄筋工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	橋りょう世話役		人		1.000 人	当たり算出
	橋りょう世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	橋りょう世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	橋りょう特殊工		人		1.000 人	当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	橋りょう特殊工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	橋りょう特殊工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D29,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	異形棒鋼 SD345 D29	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D32,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	異形棒鋼 SD345 D32	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 10号 ***					
	橋梁用水切り材設置工		m		1.000 各単位	当たり算出
	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定式 床版下面 材料含む,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	橋梁用水切り材設置工 接着剤固定式 床版下面 材料含む	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 11号 ***					
	橋梁用ゴム支承材		枚		1.000 各単位	当たり算出
	橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 12号 ***					
	防蝕アンカー装置		組		1.000 各単位	当たり算出
	防蝕アンカー装置 F46D×980,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	防蝕アンカー装置 F46D×980	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					
	防蝕アンカー装置【暫定単価】		組		1.000 各単位	当たり算出
	防蝕アンカー装置【暫定単価】 M42D×900,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	防蝕アンカー装置【暫定単価】 M42D×900	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 14号 ***					
	無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	当たり算出
	無収縮モルタル			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	無収縮モルタル	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 15号 ***					
	沓座補強鉄筋		ton		1.000 各単位	当たり算出
	沓座補強鉄筋 鉄筋金網 D10×50×50mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	沓座補強鉄筋					
	鉄筋金網 D10×50×50mm	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 16号 ***					
	アイボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	アイボルト			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	M12,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	アイボルト					
	M12	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 17号 ***					
	コンクリート積ブロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート積ブロック			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	A種 控35cm,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	コンクリート積ブロック					
	A種 控35cm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	φ900 ダブル構造,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	高密度ポリエチレン管					
	φ900 ダブル構造	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 19号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず),,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 20号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	残土処分費			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード	残土処分費		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	残土処分費					
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 21号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コなし),無し,昼間施工,0.18-8-40(高炉B)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	練積(裏込なし)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	無し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-40 (高炉B)				
	コンクリートブロック積工					
	制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B)					
	18-8-40 (高炉B)	0.210	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	高密度ポリエチレン管,900mm,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)管の単価(円/m)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		夜間制約作業時間:0.0		
	3)管径区分(mm)	900mm				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			計上無し
	土木一般世話役	1.310	人			
	特殊作業員	3.270	人			
	普通作業員	4.750	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	3.360	日			<賃料>

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	ハートル給油	71.000	L			
	運転手(特殊)	2.530	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 23号 ***					
	高密度ポリエチレン管撤去工		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	高密度ポリエチレン管,900mm,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)管の単価(円/m)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		夜間制約作業時間:0.0		
	3)管径区分(mm)	900mm				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			計上無し
	土木一般世話役	1.310	人			
	特殊作業員	3.270	人			
	普通作業員	4.750	人			
	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	3.360	日			<賃料>
	軽油					
	ハートル給油	71.000	L			
	運転手(特殊)	2.530	人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単- 24号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		1.000	人			
	諸雑費					
		0.020				
	大型土のう袋					
	大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚			
	バックホ[クレーン型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	1.360	日			<賃料>
	軽油					
	ハートフル給油	65.000	L			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 49.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 25号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフテレンクレーン,0m3,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ラフテレンクレーン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.004				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 106.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 26号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.500	人			
	とび工	6.100	人			
	普通作業員	2.700	人			
	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.280				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単一 27号 ***					
	支保工		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	くさび結合支保 40KN/㎡以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.400	人			

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型わく工	1.300	人			
	とび工	3.300	人			
	普通作業員	3.300	人			
	ラフテレンス[油圧伸縮ジャ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日			<賃料>
	諸雑費	0.330				
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単－ 28号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				
	2)供用日数	62				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	345.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 29号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オフソカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単一 30号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オフソカット,-,無し,1,000m3未満,-,有り(50,000m3未満),無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	軟岩				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	1,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	有り(50,000m3未満)				
	8)集積押土の有無	無し				
	単 価		m3			
	*** S単一 31号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 32号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ｸﾗﾑｼｬﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 33号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3			
	*** S単一 34号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単－ 35号 ***					
	SP 胴込・裏込材 (碎石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ブロック,再生碎石 RC-40,なし,有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無	間知・平・連節ブロック 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	なし 再生碎石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単－ 36号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²			

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 37号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	0 40~0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 38号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 39号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単一 40号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 41号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単- 42号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物、クレーン車打設、計上する、-,一般養生、-,-,高さ約25m以下、			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	水平距離約18m以下、なし、24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	クレーン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	高さ約25m以下、水平距離約18m以下				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単- 43号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下, 水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	クレーン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	高さ約17m以下、水平距離約17m以下				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単— 44号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 45号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 橋梁用床版, D13, SD345, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 橋梁用床版		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分	D13 SD345				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型 (～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.400	人			
	鉄筋工	3.200	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.140				

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R 8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフテレンクレン[油圧伸縮ヅブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.070	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 46号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 橋梁用床版, D16, SD345, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 橋梁用床版		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.100	人			
	鉄筋工	1.700	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフテレンクレン[油圧伸縮ヅブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.400	人			
	鉄筋工	2.600	人			

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.140				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.070	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 47号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,橋梁用床版,D19,SD345,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 橋梁用床版		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D19 SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.100	人			
	鉄筋工	1.700	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.400	人			
	鉄筋工	2.600	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.140				
	ラフテレンスレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.070	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 48号 ***					
	鉄筋工(ガス圧接継手・機械式継手)		箇所		100.000 箇所	当たり算出
	鉄筋工(ガス圧接継手・機械式継手) ガス圧接,29～32			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)鉄筋径(mm)	ガス圧接 29～32				
	3)鉄筋継手(円/セット、税抜) 4)グラウト材(円/個、税抜)	0円 0円				
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	1.300	人			
	溶接工	2.900	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.080				

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	鉄筋加工・組立		ton		1.000 ton	当たり算出
	SD345 D29 橋梁用床版					
	異形棒鋼 SD345 D29,,	1.030	ton			S単 8号
	土木一般世話役	0.100	人			S単 3号
	鉄筋工	1.700	人			S単 4号
	普通作業員	0.200	人			S単 5号
	雑品	0.120				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ヅグ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			S単 2号
	土木一般世話役	0.400	人			S単 3号
	鉄筋工	2.600	人			S単 4号
	普通作業員	0.200	人			S単 5号
	雑品	0.140				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ヅグ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.070	日			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** T単－ 2号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋加工・組立		ton		1.000 ton	当たり算出
	SD345 D32 橋梁用床版					
	異形棒鋼 SD345 D32,,	1.030	ton			S単 9号
	土木一般世話役	0.100	人			S単 3号
	鉄筋工	1.700	人			S単 4号
	普通作業員	0.200	人			S単 5号
	雑品	0.120				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			S単 2号
	土木一般世話役	0.400	人			S単 3号
	鉄筋工	2.600	人			S単 4号
	普通作業員	0.200	人			S単 5号
	雑品	0.140				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.070	日			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** T単－ 3号 ***					
	簡易ゴム支承設置工		m		10.000 m	当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 本部6期 地区
工事名	R8吉耕 基幹 本部6期 橋梁上部工事（企育）

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期 地区
工事名	R8 吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事（企育）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8吉耕 基幹 忌部6期 橋梁上部工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	残土	m3	2,800	運搬距離 L=6.6km
沓座補強鉄筋	鉄筋金網 D10×50×50mm(SD345)	t	890,230	
アイボルト	M12	本	440	
防蝕アンカー装置【暫定単価】	M42D×900	組	113,600	

R 8 吉耕 基幹 忌部 6 期 橋梁上部工事（企育）

数 量 計 算 書
【当初】

1. 数量総括表

上部工数量総括表



(1/2)

工種	種 別		仕 様	単 位	数 量	備 考
R C 床 版 工	コンクリート	床版	$\sigma_{ck} = 24\text{N/mm}^2$	m^3	84.42	
		調整	$\sigma_{ck} = 24\text{N/mm}^2$	"	2.47	
	型枠	床版	鉄筋構造物	m^2	114.59	
		調整	無筋構造物	"	0.27	
		床版	埋設(支承部・目地部)	"	30.12	
		調整		"	2.31	
	鉄筋	D32~D29	SD345	kg	7781.7	
		D25~D16	"	"	2797.3	
		D13	"	"	916.8	
		計		"	11495.8	
	ガス圧接	D32		箇所	81	
		D29		"	41	
		合計		"	122	
	水切り材		プラスチック面木(面長30mm)	m	19.9	
支 承 工	簡易ゴム支承		150×23	"	19.60	
	防蝕 アンカー装置	Fix側	F46D×980	組	12.0	
		Mov側	M42D×900	組	10.0	
	沓座モルタル		無収縮性	m^3	0.394	
	アンカー-孔モルタル		無収縮性	"	0.182	
	沓座補強鉄筋		D10×50×50(SD345)	kg	124.0	
	アイボルト		M12	本	11	
架 設 支 保 工	くさび式支保工		6.0m<H≤8.4m	空 m^3	688.6	
	支保耐力		19.6kN/m ² ≤P<29.4kN/m ²	kN/m ²	27.0	


2. RC床版工

(1) コンクリート $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$


$$\text{斜比} = 1/\sin 87^\circ = 1.00137$$

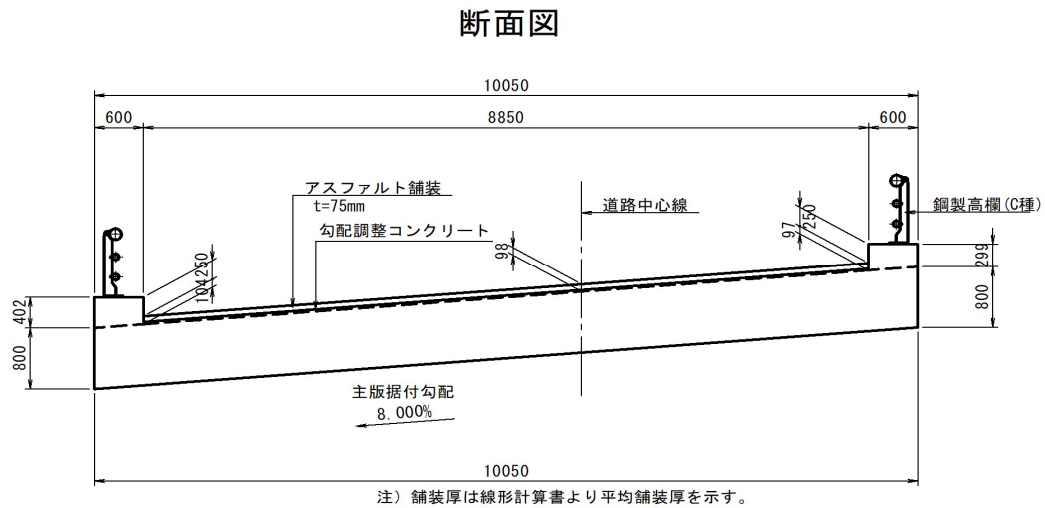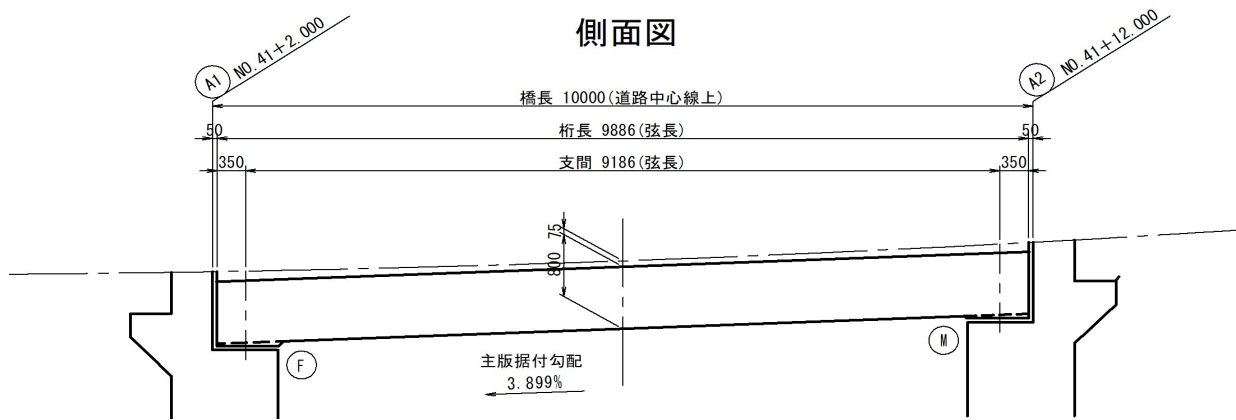

主版レアー寸法図

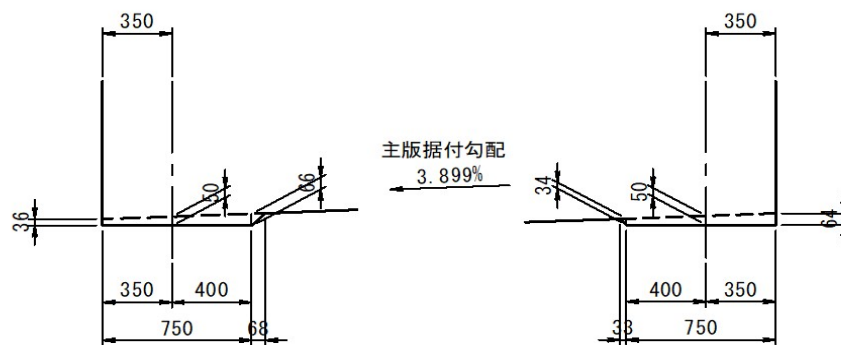

平面图

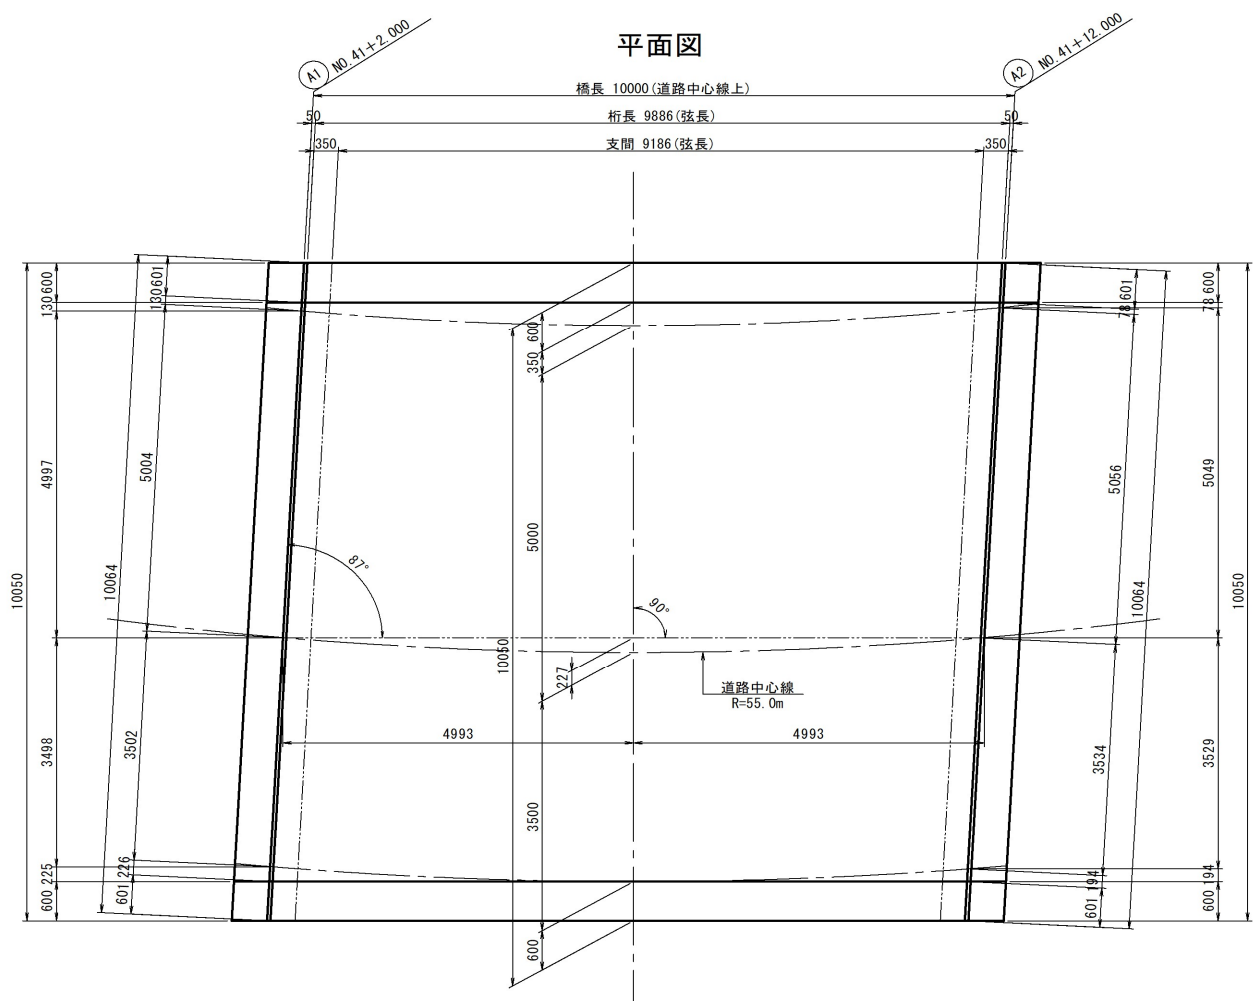

主版コンクリート

$$V1 = 10.050 \times 0.800 \times 9.886 = 79.48 \text{ m}^3$$

レアー

$$V2 = 1/2 \times (0.750 \times 2 + 0.068) \times 1/2 \times (0.036 + 0.066) \times 10.050 = 0.40 \text{ m}^3$$

$$V3 = 1/2 \times (0.750 \times 2 + 0.033) \times 1/2 \times (0.034 + 0.064) \times 10.050 = 0.38 \text{ m}^3$$

地覆

$$V4 = 1/2 \times (0.402 + 0.104 + 0.250) \times 0.600 \times 9.886 = 2.24 \text{ m}^3$$

$$V5 = 1/2 \times (0.299 + 0.097 + 0.250) \times 0.600 \times 9.886 = 1.92 \text{ m}^3$$

$$\text{床版コンクリート合計} = 84.42 \text{ m}^3$$

勾配調整コンクリート

平均厚(線形計算書より)

$$t = 1/2 \times (104 + 97) - 75 = 26 \text{ mm}$$

$$V6 = 10.050 \times 0.026 \times 9.886 = 2.58 \text{ m}^3$$

伸縮継手部切欠き

$$V7 = -0.350 \times (0.005 + 0.025) \times 1.00137 \times 10.050 = -0.11 \text{ m}^3$$

$$\text{勾配調整コンクリート合計} = 2.47 \text{ m}^3$$

(2) 型枠

$$\text{斜比} = 1/\sin 87^\circ = 1.00137$$

鉄筋構造物

底板

$$\begin{aligned} A1 &= 10.050 \times (9.886 - 0.750 - 0.068 - 0.750 - 0.033) \times (1 + 0.03899^2)^{0.5} \\ &= 83.33 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

レアー

$$\begin{aligned} A2 &= 1/2 \times (0.750 \times 2 + 0.068) \times 1/2 \times (0.036 + 0.066) \times 2 \\ &\quad + (0.068^2 + 0.066^2)^{0.5} \times 10.050 \times 1.00137 \\ &= 1.03 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A3 &= 1/2 \times (0.750 \times 2 + 0.033) \times 1/2 \times (0.034 + 0.064) \times 2 \\ &\quad + (0.033^2 + 0.034^2)^{0.5} \times 10.050 \times 1.00137 \\ &= 0.55 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

側枠

$$A4 = 9.886 \times 0.800 \times 2 = 15.82 \text{ m}^2$$

地覆

$$A5 = (0.402 + 0.104 + 0.250) \times 9.886 = 7.47 \text{ m}^2$$

$$A6 = (0.299 + 0.097 + 0.250) \times 9.886 = 6.39 \text{ m}^2$$

$$\text{床版コンクリート型枠合計} = 114.59 \text{ m}^3$$

無筋構造物

$$A = (0.005 + 0.025) \times 8.850 \times 1.00137 = 0.27 \text{ m}^2$$

埋設型枠(支承部・目地部)

底板

$$A1 = (0.750 - 0.150 \times 1.00137) \times 10.050 = 6.03 \text{ m}^2$$

$$A2 = (0.750 - 0.150 \times 1.00137) \times 10.050 = 6.03 \text{ m}^2$$

端板

$$A3 = (0.800 + 0.036) \times 10.050 \times 1.00137 = 8.41 \text{ m}^2$$

$$A4 = (0.800 + 0.064) \times 10.050 \times 1.00137 = 8.70 \text{ m}^2$$

地覆

$$\begin{aligned} A5 &= 1/2 \times (0.429 + 0.478 + 0.132 + 0.178 + 0.250 \times 2) \times 0.600 \times 1.00137 \\ &= 0.52 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A6 &= 1/2 \times (0.360 + 0.316 + 0.157 + 0.114 + 0.250 \times 2) \times 0.600 \times 1.00137 \\ &= 0.43 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{埋設型枠合計} = 30.12 \text{ m}^3$$

勾配調整コンクリート

$$A7 = 8.850 \times (1/2 \times (0.132 + 0.157) - 0.005) \times 1.00137 = 1.24 \text{ m}^2$$

$$A8 = 8.850 \times (1/2 \times (0.178 + 0.114) - 0.025) \times 1.00137 = 1.07 \text{ m}^2$$

$$\text{埋設勾配調整コンクリート型枠合計} = 2.31 \text{ m}^3$$

(3) 鉄筋

SD345

(kg)

	質量	集計
D32	5605.8	7781.7
D29	2175.9	
D25	—	2797.3
D22	—	
D19	824.3	
D16	1973.0	
D13	916.8	916.8
計	11495.8	11495.8

(箇所)

	圧接
D32	81
D29	41
計	122

(4) 水切り材

プラスチック面木(面長30mm)

$$L = (9.886 - 0.750 - 0.068 - 0.750 - 0.033) \times (1 + 0.03899^2)^{0.5} \times 2$$

$$+ 0.750 \times 4 + (0.068^2 + 0.066^2)^{0.5} \times 2 + (0.033^2 + 0.034^2)^{0.5} \times 2$$

$$= 19.9 \text{ m}$$

3. 支承工

(1) 簡易ゴム支承

$$\begin{array}{llll}
 \text{A1部} & 150 \times 23 \times 9800 & \text{N} = & 1 \text{ 枚} \\
 \text{A2部} & 150 \times 23 \times 9800 & \text{N} = & 1 \text{ 枚} \\
 \text{L} = & 9.800 + 9.800 & = & 19.60 \text{ m}
 \end{array}$$

(2) 防蝕アンカー装置 (S35CN+CR+ポリエチレン)

$$\begin{array}{llll}
 \text{A1部} & \text{Fix F46D} & \text{L} = & 980\text{mm} \quad \text{N} = 12 \text{ 組} \\
 \text{W} = & 13.0\text{Kg/m} \times 0.980\text{m} \times 12\text{本} & = & 152.9 \text{ Kg}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{llll}
 \text{A2部} & \text{Mov M42D} & \text{L} = & 900\text{mm} \quad \text{N} = 10 \text{ 組} \\
 \text{W} = & 10.9\text{Kg/m} \times 0.900\text{m} \times 10\text{本} & = & 98.1 \text{ Kg}
 \end{array}$$

(3) 沓座モルタル (無収縮モルタル)

$$\begin{array}{llll}
 \text{A1部} & \text{Fix} & & \\
 \text{V} = & (0.280 \times 9.900 \times 0.030 + 0.310 \times 9.930 \times 0.037) \times 1 & = & 0.197 \text{ m}^3 \\
 \text{A2部} & \text{Mov} & & \\
 \text{V} = & (0.280 \times 9.900 \times 0.030 + 0.310 \times 9.930 \times 0.037) \times 1 & = & 0.197 \text{ m}^3 \\
 \hline
 & \text{合計} & \Sigma \text{V} = & 0.394 \text{ m}^3
 \end{array}$$

(4) アンカー孔モルタル (無収縮モルタル)

$$\begin{array}{llll}
 \text{A1部} & \text{Fix} & & \\
 \text{V} = & (1/4 \times \pi \times 0.150^2 \times 0.530 - 1/4 \times \pi \times 0.046^2 \times 0.497) \times 12\text{箇所} & = & 0.102 \text{ m}^3 \\
 \text{A2部} & \text{Mov} & & \\
 \text{V} = & (1/4 \times \pi \times 0.150^2 \times 0.490 - 1/4 \times \pi \times 0.042^2 \times 0.457) \times 10\text{箇所} & = & 0.080 \text{ m}^3 \\
 \hline
 & \text{合計} & \Sigma \text{V} = & 0.182 \text{ m}^3
 \end{array}$$

(6) 沓座補強鉄筋 (SD345)

A1部	Fix	D10×50×50	N=	1箇所	
W= 0.56Kg/m× (0.250×199+10.150×6) ×1				=	62.0 Kg


A2部	Mov	D10×50×50	N=	1箇所	
W= 0.56Kg/m× (0.250×199+10.150×6) ×1				=	62.0 Kg
合計				ΣW=	124.0 Kg

(7) アイボルト

A1部	アンカー装置用	M12	N=	6本	
A2部	アンカー装置用	M12	N=	5本	
合計			ΣN=	11本	

4. 架設支保工（固定）

(1) くさび結合支保工

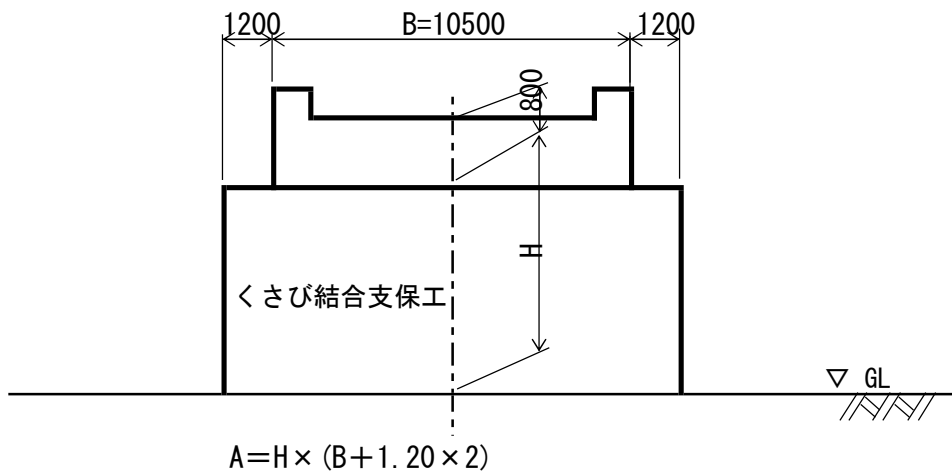

ここに、

PH: 構造中心での舗装天端高


GL: 地盤高

H: 上図に示す。

B: 上図に示す。

A: 断面積

側 面 図
(構造中心線)

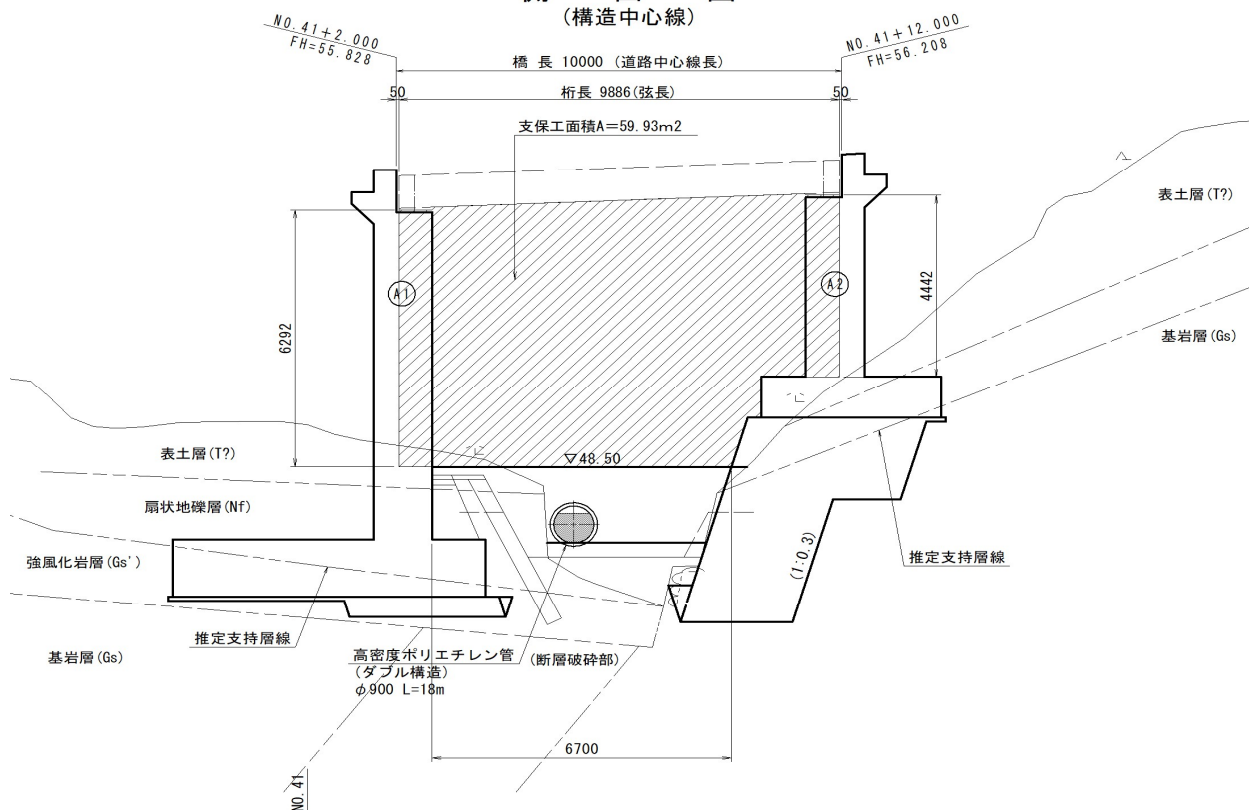

支保工平均高

$$H = 59.93 / 9.886 = 6.1 \text{ m}$$
$$6.0\text{m} < H \leq 8.4\text{m}$$

支保工体積

$$V = 59.93 \times (10.500 + 1.200 \times 2) - (6.292 + 4.442) \times 0.750 \times 10.500$$
$$= 688.6 \text{ m}^3$$

(3) 載荷荷重の計算

コンクリート体積

$$V = 84.42 + 2.47 = 86.89 \text{ m}^3$$

平均コンクリート厚

$$d = 86.89 \times \frac{1}{10.500 \times 9.886} = 0.837\text{m}$$

支保耐力

$$P = (2.81 \times 0.837 + 0.40) \times \frac{10.500}{10.500} \times 9.80665 = 27.0 \text{ kN/m}^2$$

$$19.6\text{kN/m}^2 \leq P < 29.4\text{kN/m}^2$$

1. 数量総括表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
護岸工	ブロック積	控え35cm	m ²	57.78	
	胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	12.71	
	裏込砕石	RC-40	m ³	21.27	
	埋戻コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	3.01	
	目地材	エラストイト t=10mm	m ²	1.23	
	単管傾斜足場		掛m ²	59.61	
	天端コンクリート		m	16.50	
			m ³	1.19	
	張コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.46	t=100mm
	基礎砕石	RC-40	m ²	5.08	t=150mm
護床工	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	10.96	
	型 枠		m ²	35.78	
	吸出し防止用マット		m ²	30.96	
作業土工	掘 削	土砂	m ³	33.3	
		軟岩	m ³	9.3	
	盛 土	土砂	m ³	6.3	
	埋 戻	土砂 最大埋戻幅 1m以上4m未満	m ³	7.0	
	残土処理	土砂	m ³	25.5	
		軟岩	m ³	9.3	

2. 護岸工

2-1. 護岸工

(1) ブロック積 (控え35cm)

$$A = 57.78 = 57.78 \text{ m}^2$$

(2) 胴込コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V = 57.78 \times 0.22 \text{ m}^3/\text{m}^2 = 12.71 \text{ m}^3$$

(3) 裏込砕石 (RC-40)

$$V = 21.27 = 21.27 \text{ m}^3$$

(4) 埋戻コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V = 3.01 = 3.01 \text{ m}^3$$

(5) 目地材 (エラストイト t=10mm)

$$A = 57.78 \times 0.35 / 16.5 = 1.23 \text{ m}^2$$

(5) 足場工 (単管傾斜足場)

$$A = 59.61 = 59.61 \text{ 掛m}^2$$

寸法表

高さ(H) (mm)	斜長(L1) (mm)	斜長(L2) (m ²)	裏込碎石 (m ²)	埋戻コンクリート (m ²)
2400	2683	2571	0.70	0.15
2507	2803	2691	1.12	0.15
2501	2796	2684	1.12	0.15
2500	2795	2683	1.12	0.15
3500	3913	3801	1.51	0.18
3800	4248	4137	1.41	0.20
3800	4248	4137	1.41	0.20
4400	4919	4807	1.73	0.32

$$L1=H \times 1.118 \quad L2=(H-100) \times 1.118$$

裏込碎石及び埋戻コンクリートは図面参照

数量表

測 点	距 離	ブロック積			裏込碎石		
		断面	平均	積	断面	平均	積
	m	m	m	m ²	m ²	m ²	m ³
1-1		2.571			0.70		
	3.70	2.691	2.6310	9.73	1.12	0.910	3.37
	0.10	0.000	1.3455	0.13	0.00	0.560	0.06
		0.000			0.00		
	0.10	2.684	1.3420	0.13	1.12	0.560	0.06
L5.0	0.70	2.683	2.6835	1.88	1.12	1.120	0.78
CL	3.50	3.801	3.2420	11.35	1.51	1.315	4.60
R3.5	5.00	4.137	3.9690	19.85	1.41	1.460	7.30
	1.50	4.137	4.1370	6.21	1.41	1.410	2.12
2-2	1.90	4.807	4.4720	8.50	1.73	1.570	2.98
合 計				57.78			21.27

測 点	距 離	埋戻コンクリート			単管傾斜足場		
		断面	平均	積	断面	平均	積
	m	m ²	m ²	m ³	m	m	m ²
1-1		0.15			2.683		
	3.70	0.15	0.150	0.56	2.803	2.7430	10.15
	0.10	0.00	0.075	0.01	0.000	1.4015	0.14
		0.00			0.000		
	0.10	0.15	0.075	0.01	2.796	1.3980	0.14
L5.0	0.70	0.15	0.150	0.11	2.795	2.7955	1.96
CL	3.50	0.18	0.165	0.58	3.913	3.3540	11.74
R3.5	5.00	0.20	0.190	0.95	4.248	4.0805	20.40
	1.50	0.20	0.200	0.30	4.248	4.2480	6.37
2-2	1.90	0.32	0.260	0.49	4.919	4.5835	8.71
合 計				3.01			59.61

2-2. 天端コンクリート

$$L = 3.80 + 10.80 + 1.90 = 16.50 \text{ m}$$

(1) コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V = 0.72 / 10 \times 16.50 = 1.19 \text{ m}^3$$

(2) 型枠 (小型構造物)

$$A = 2.20 / 10 \times 16.50 = 3.63 \text{ m}^2$$

(3) 目地材 (エラストイト $t=10\text{mm}$)

$$A = 0.07 / 10 \times 16.50 = 0.12 \text{ m}^2$$

2-3. 張コンクリート


(1) コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V = (0.433 + 0.473) / 2 \times 0.10 \times 10.10 = 0.46 \text{ m}^3$$


(2) 基礎砕石 (RC-40)

$$V = (0.473 + 0.533) / 2 \times \quad \times 10.10 = 5.08 \text{ m}^2$$


(第 号表)

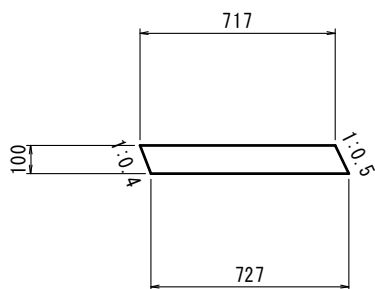[illegible]


平 面 図

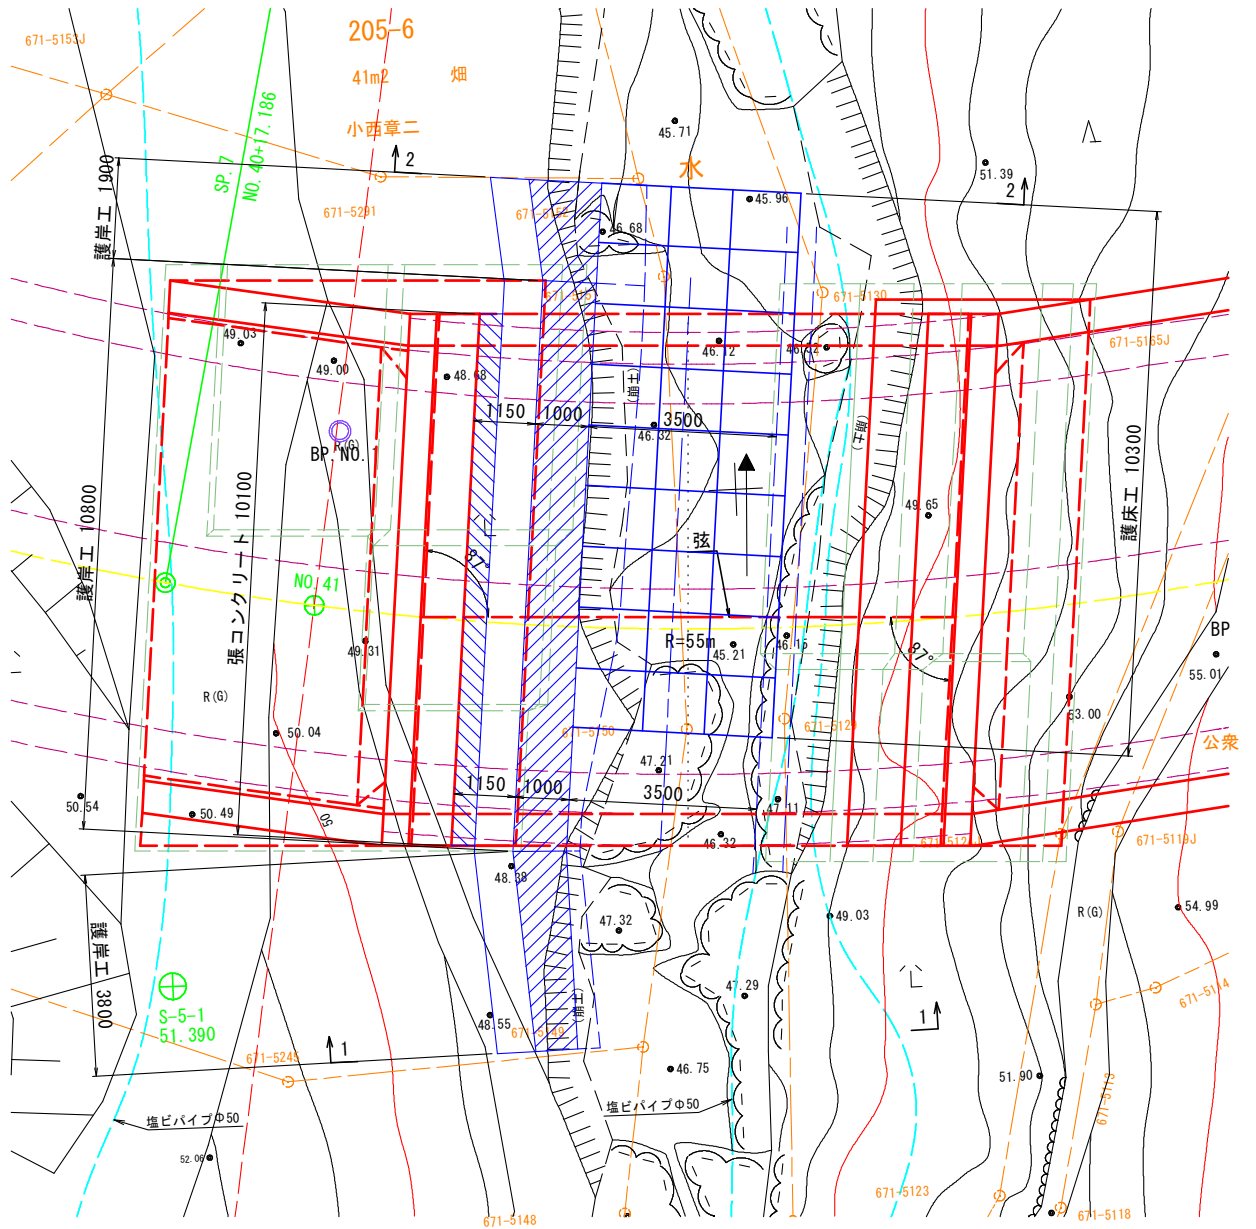


天 端 コ ン ク リ ー ト

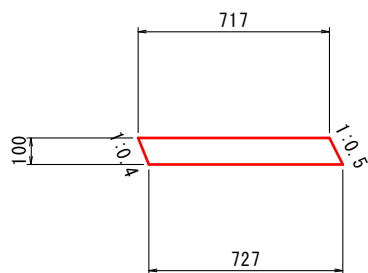


張 コ ン ク リ ー ト

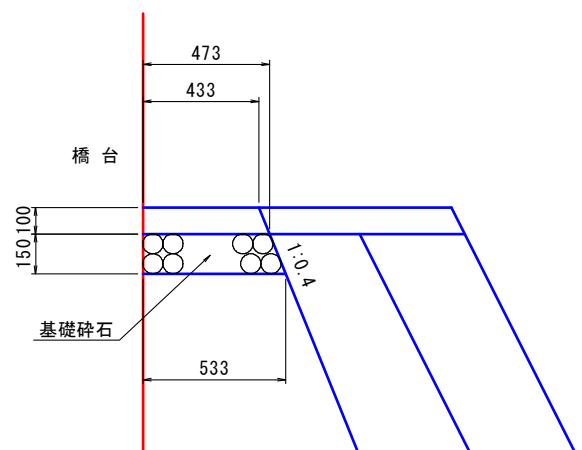


ブロック積断面図

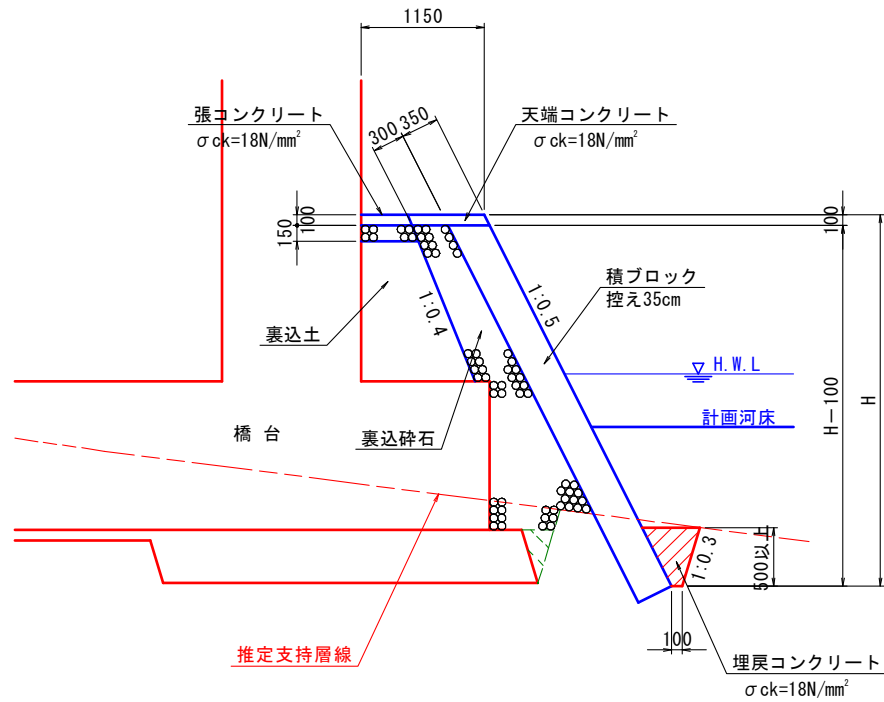


ブロック積正面図

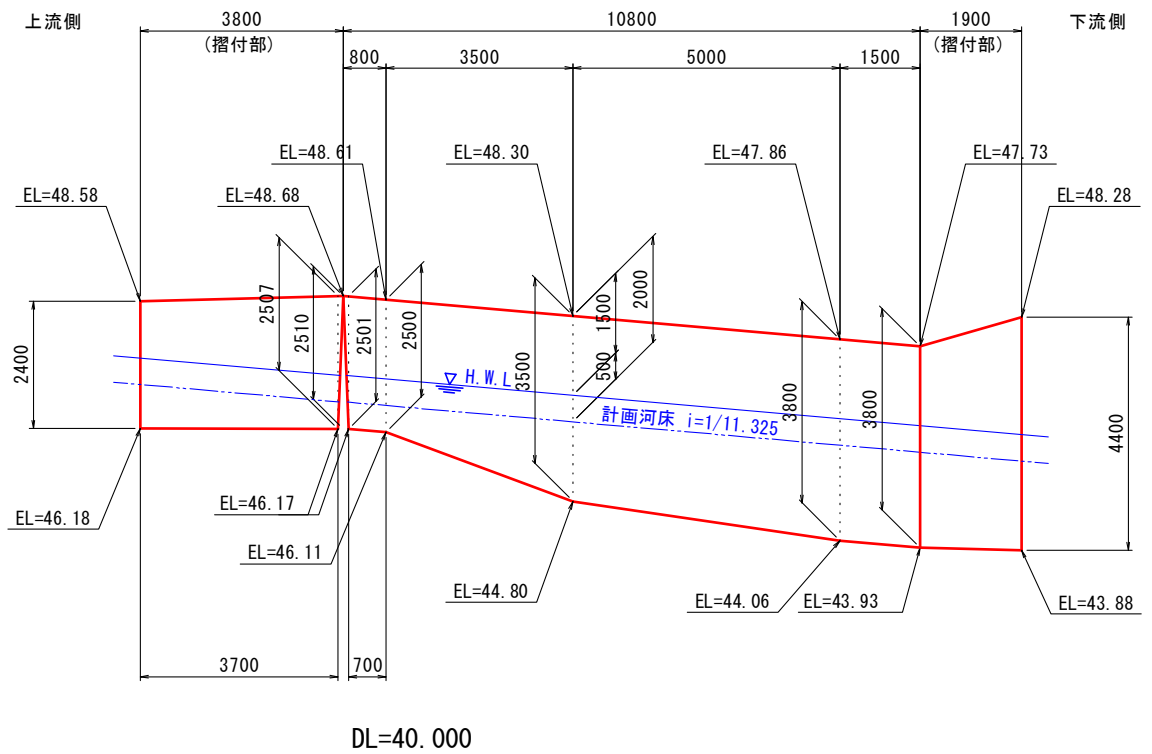


側 面 図 (道路中心線)

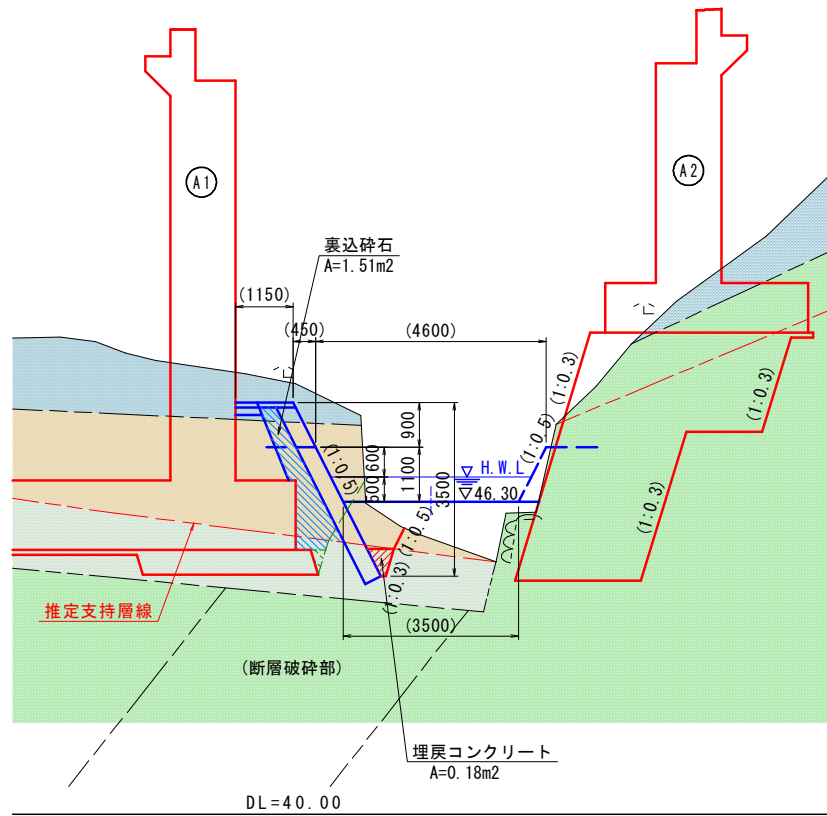


左側側面図 (道路中心線から左へ5.0mの位置)

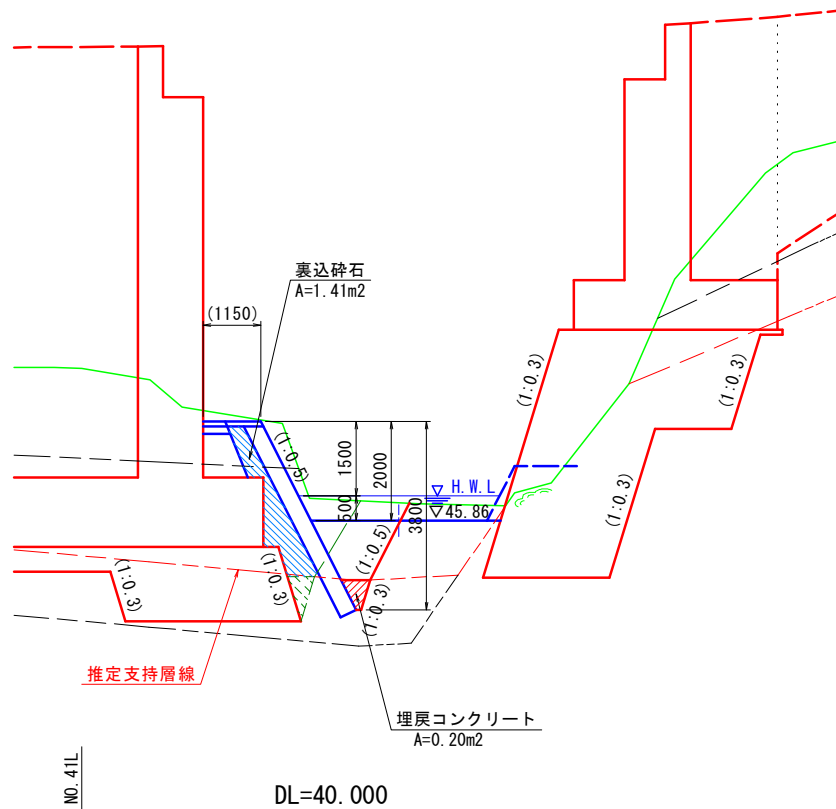


右側側面図 (道路中心線から右へ3.5mの位置)

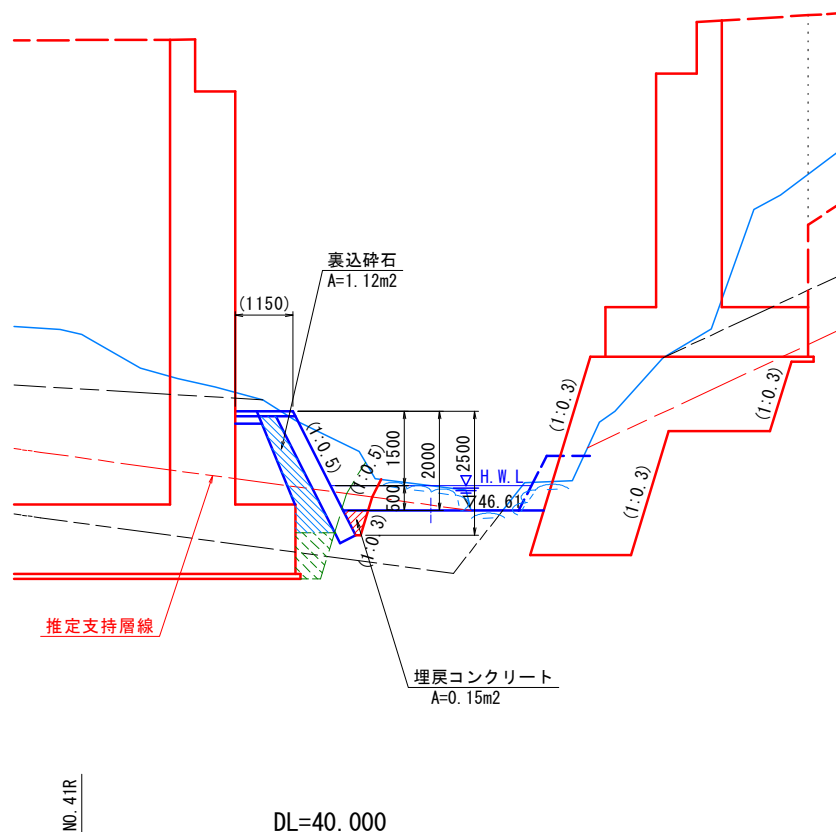

断面 1 - 1

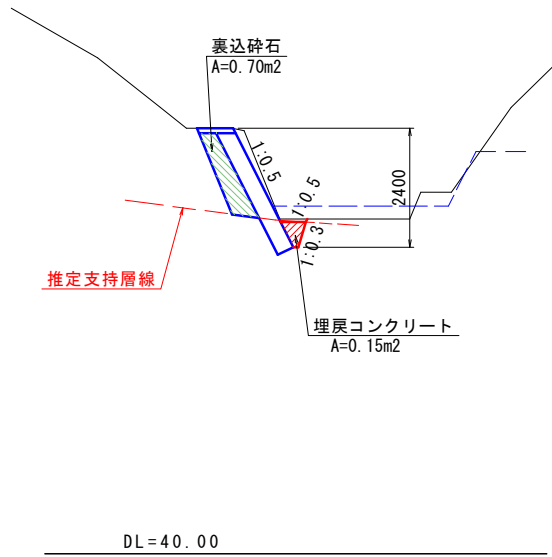

断面 2 - 2

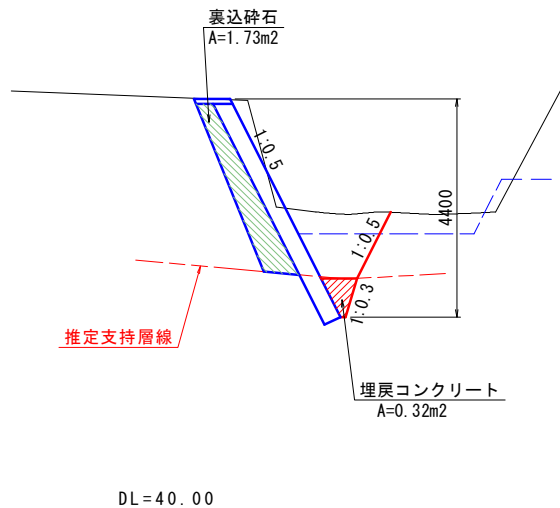

3. 護床工

3-1. 護床工

(1) コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V = 1.218 \times 9 = 10.96 \text{ m}^3$$


(2) 型 枠

$$A = 3.976 \times 9 = 35.78 \text{ m}^2$$

(3) 吸出し防止用マット

$$A = 3.440 \times 9 = 30.96 \text{ m}^2$$

(第 号表)

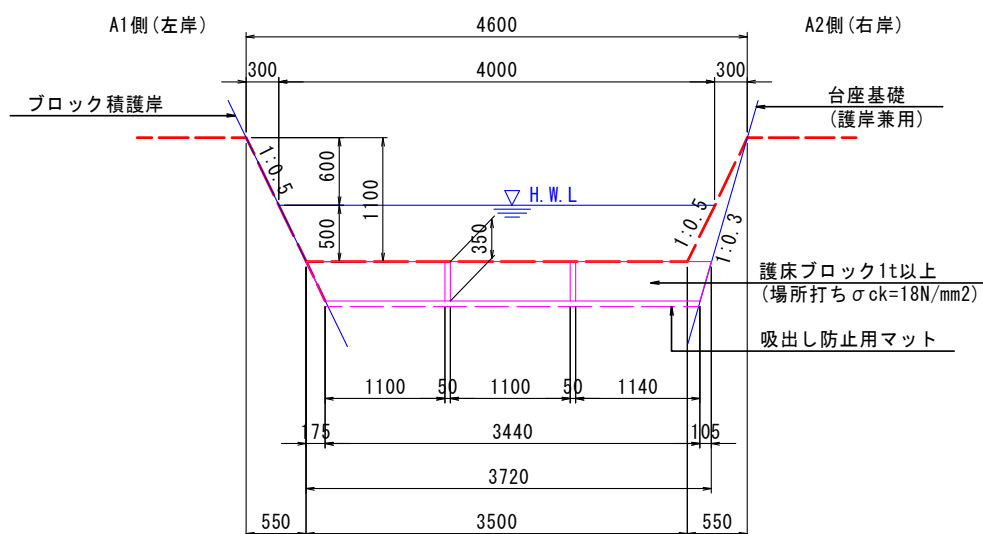[illegible]

4. 作業土工

(1) 掘削 (土砂) (片切)

$$V = 33.3 = 33.3 \text{ m}^3$$

(2) 掘削 (軟岩) (片切)

$$V = 9.3 = 9.3 \text{ m}^3$$

(3) 盛土 (土砂)

$$V = 6.3 = 6.3 \text{ m}^3$$

(4) 埋戻 (最大埋戻幅1m以上4m未満)

$$V = 7.0 = 7.0 \text{ m}^3$$

(5) 残土処理 (土砂)

$$V = 33.3 - 7.0 / 0.9 = 25.5 \text{ m}^3$$

(6) 残土処理 (軟岩)


$$V = 9.3 = 9.3 \text{ m}^3$$

数量表


測点	距離	掘削(土砂)			掘削(軟岩)		
		断面	平均	積	断面	平均	積
	m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³
1-1		1.7			0.4		
L5.0	4.60	2.4	2.05	9.4	0.5	0.45	2.1
CL	3.50	0.9	1.65	5.8	0.5	0.50	1.8
R3.5	5.00	1.0	0.95	4.8	0.7	0.60	3.0
2-2	3.40	6.8	3.90	13.3	0.7	0.70	2.4
合計				33.3			9.3

測点	距離	盛土			埋戻		
		断面	平均	積	断面	平均	積
	m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³
1-1		0.7			0.1		
L5.0	4.60	0.0	0.35	1.6	0.9	0.50	2.3
CL	3.50	1.1	0.55	1.9	0.5	0.70	2.5
R3.5	5.00	0.0	0.55	2.8	0.0	0.25	1.3
2-2	3.40	0.0	0.00	0.0	0.5	0.25	0.9
合計				6.3			7.0


側 面 図
(道路中心線)

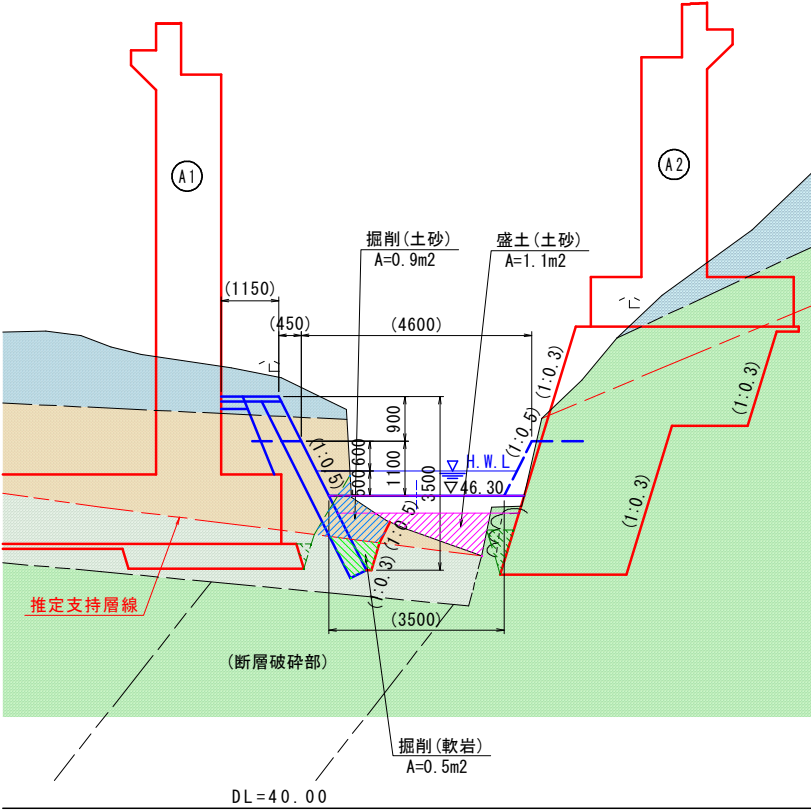


左側側面図
(道路中心線から左へ5.0mの位置)

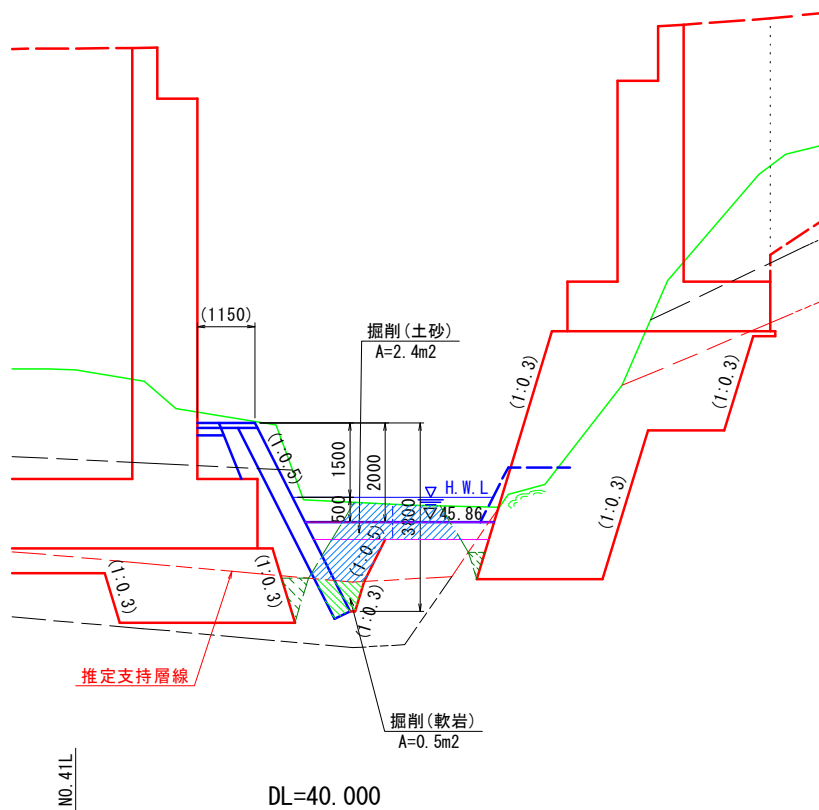


右側側面図
(道路中心線から右へ3.5mの位置)

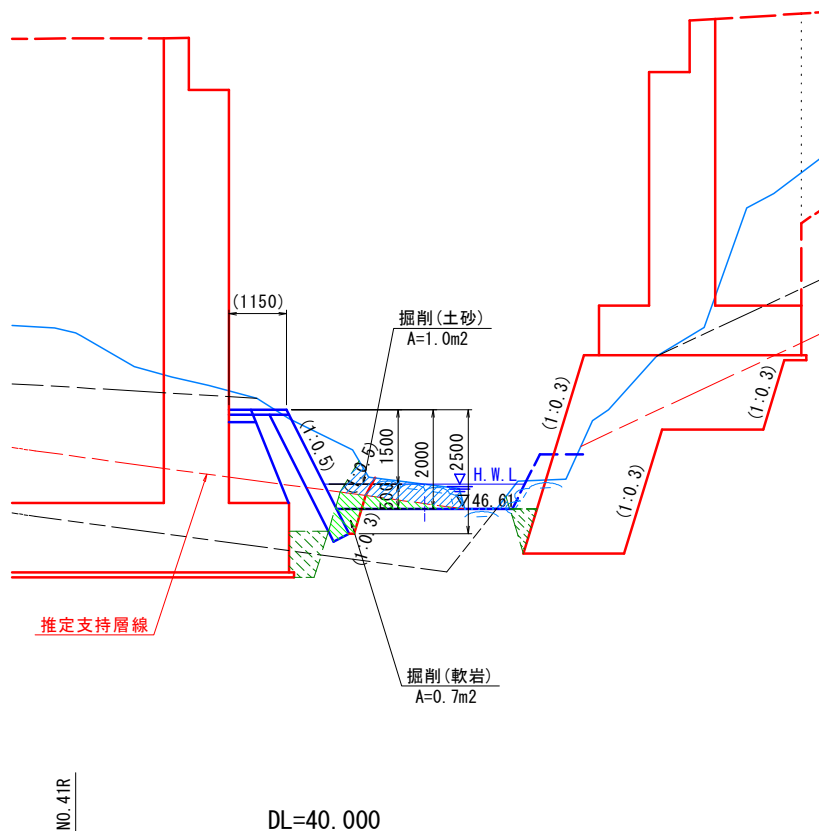


断面 1 - 1

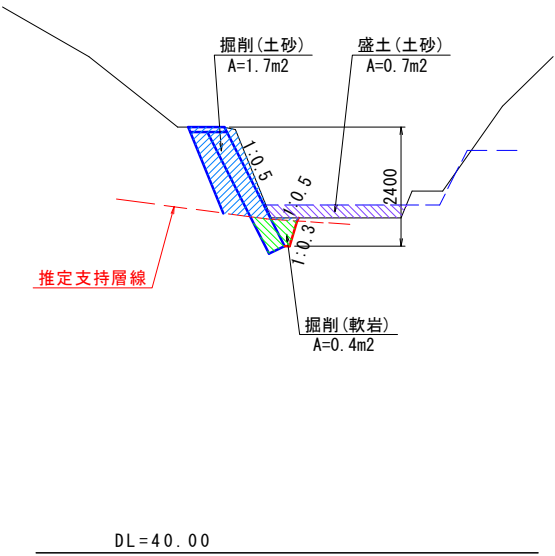


断面 2 - 2

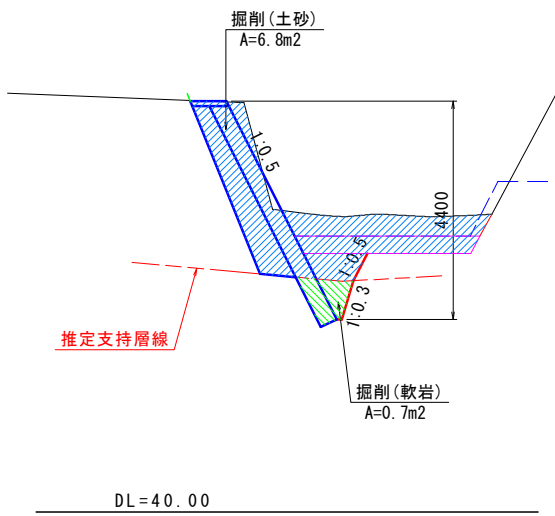


(道路中心線)

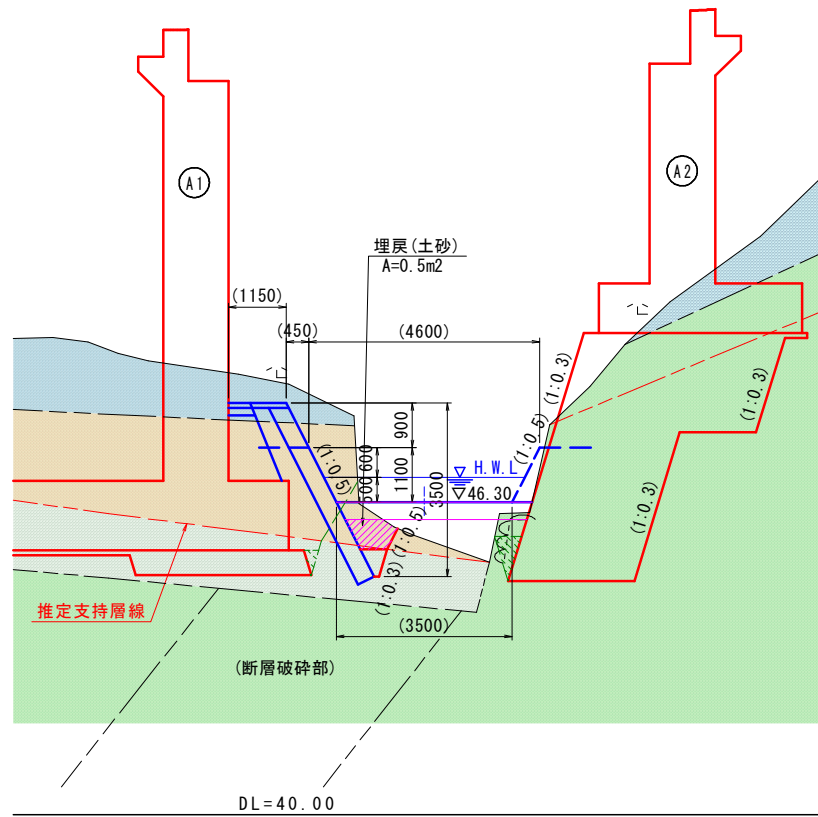


左側側面図 (道路中心線から左へ5.0mの位置)

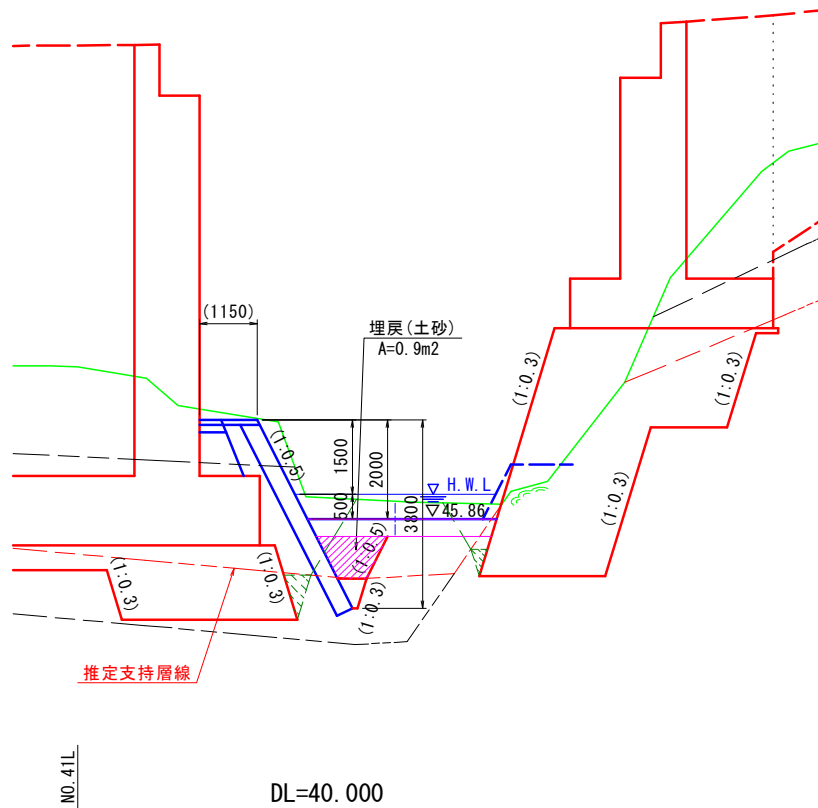


右側側面図 (道路中心線から右へ3.5mの位置)

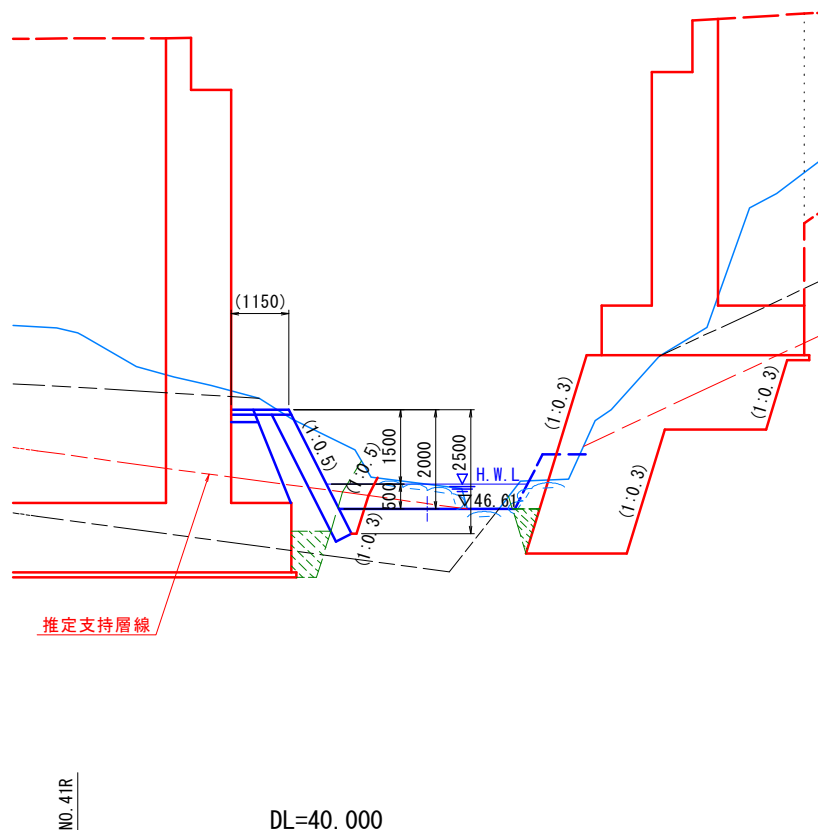

断面 1 - 1

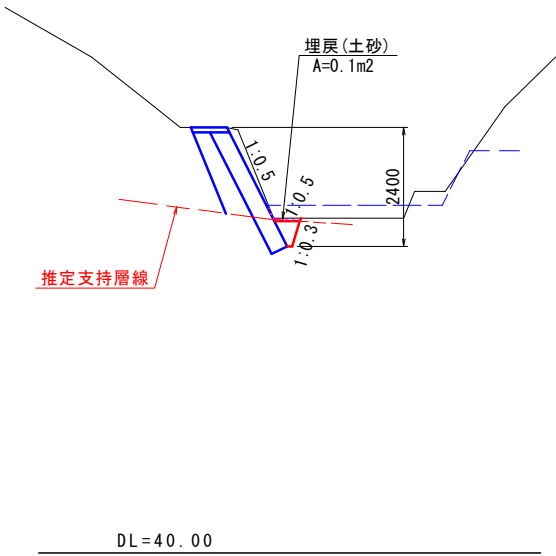


断面 2 - 2

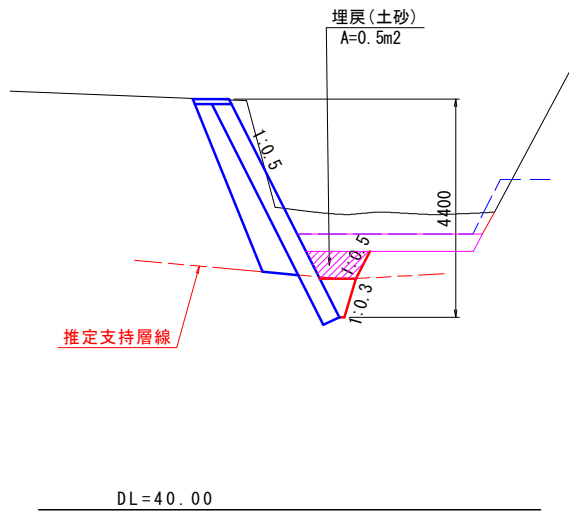


1. 数量総括表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
作業土工	仮盛土	土砂	m ³	161.5	
	仮盛土撤去・処分	土砂	m ³	179.4	盛土量/0.9
仮設工	高密度 ポリエチレン管	ダブル構造 φ 900	m	18.0	
	敷鉄板	t=22mm	m ²	87.4	
	大型土のう	設置・撤去	袋	19.0	


側 面 図
(道路中心線)

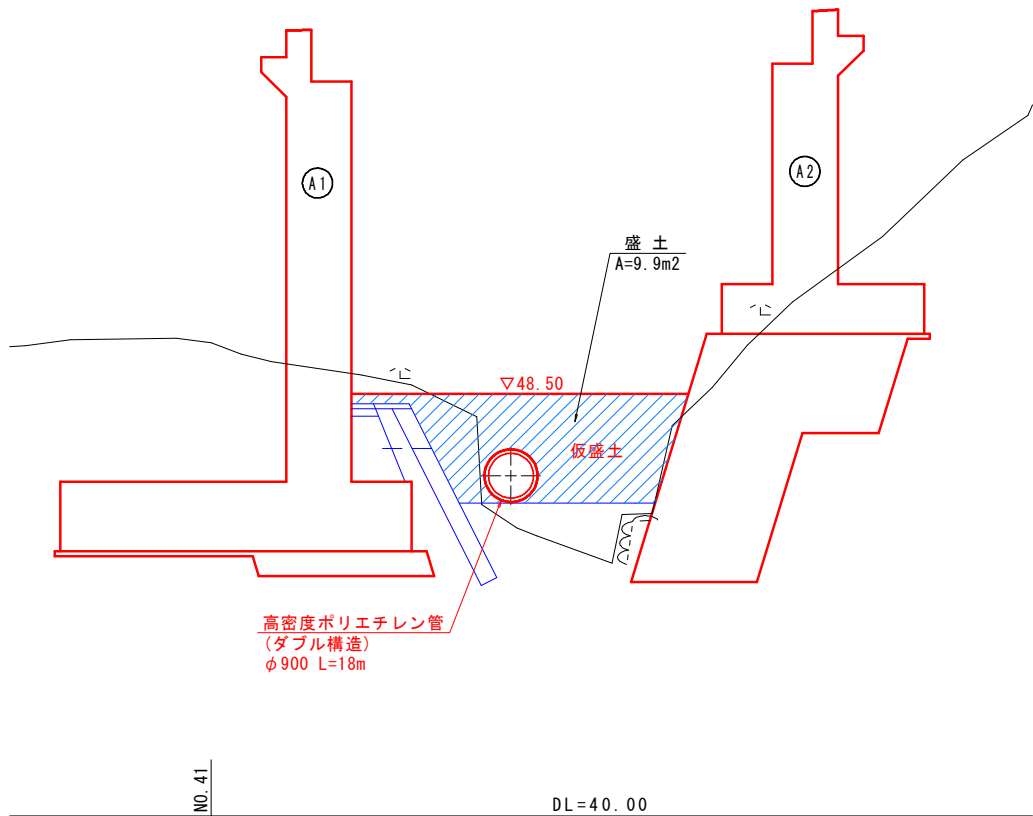

左 側 側 面 図
(道路中心線から左へ5.0mの位置)

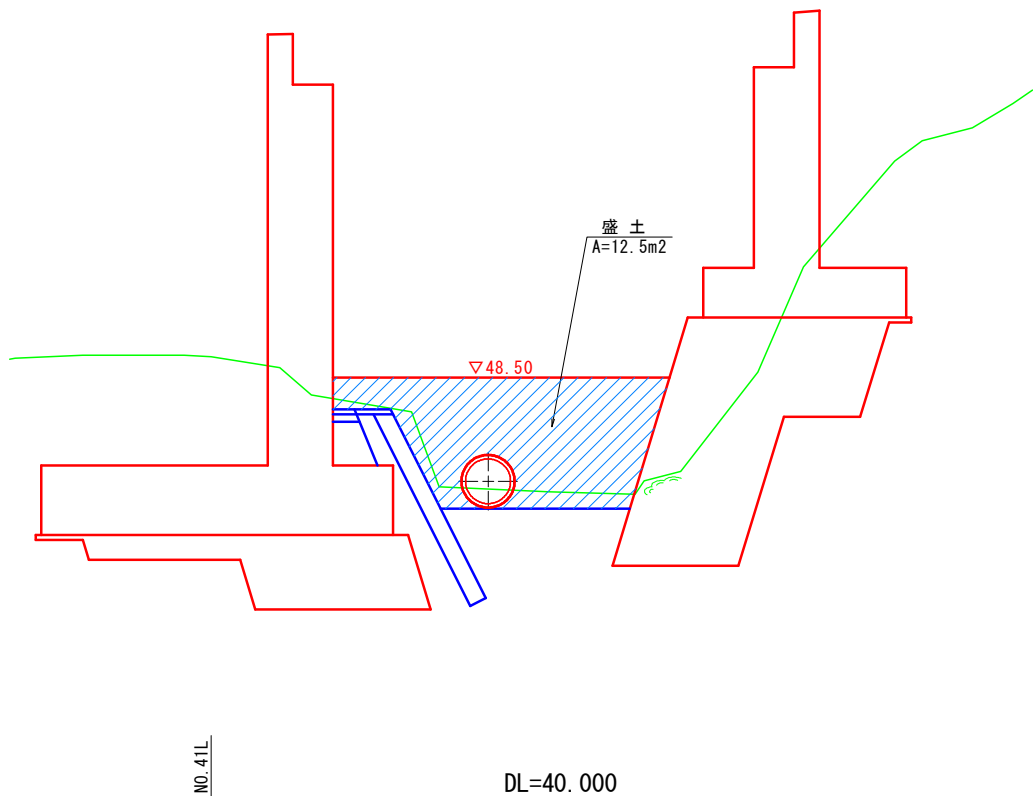

右側側面図
(道路中心線から右へ3.5mの位置)

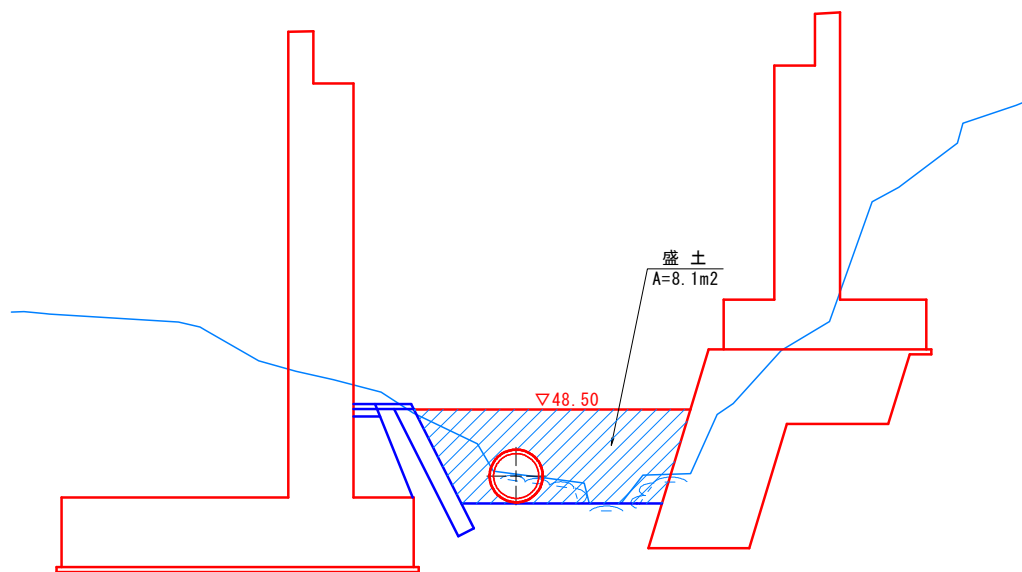

NO. 41R


DL=40.000

3. 数量計算

(1) 敷鉄板 $t=22\text{mm}$

$A = 13.00 \times 6.72 = 87.4 \text{ m}^2$

断面 1-1

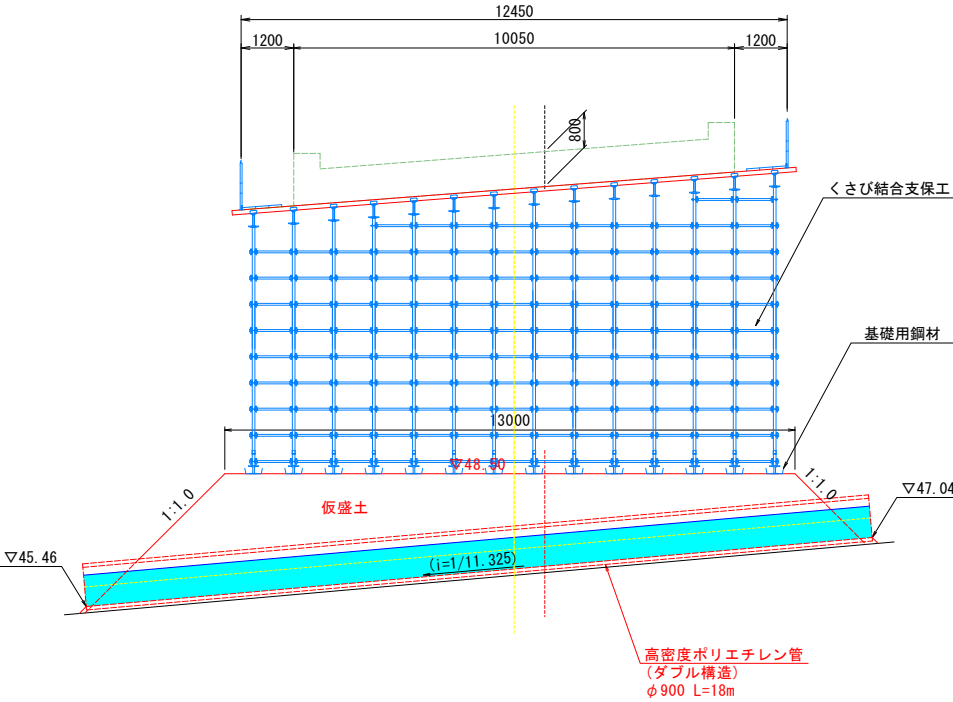

側面図
(道路中心線)

